



SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

PIANO OPERATIVO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2009-2011

Consuntivo al 31.12.2009





INDICE

1. PREMESSA.....	4
2. GLI INVESTIMENTI REALIZZATI NELL'ANNO 2009	6
2.1. Interventi di carattere generale	9
2.2. Interventi per manutenzioni straordinarie, messa a norma e telecontrollo di reti ed impianti	12
2.3. Interventi specifici	12
3. LA RIPARTIZIONE DEGLI INVESTIMENTI NEL TERRITORIO.....	13
4. LA RIPARTIZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO	14
5. GLI SCOSTAMENTI TRA INVESTIMENTI PIANIFICATI ED INVESTIMENTI REALIZZATI NELL'ANNO 2009	15
6. GLI INVESTIMENTI REALIZZATI NEL PRIMO TRIENNIO DI GESTIONE 2007-2009	19

ALLEGATI

Dettaglio degli investimenti realizzati al 31.12.2009

1. PREMESSA


Il presente documento analizza gli investimenti che Acque Veronesi s.c. a r.l. ha realizzato nel corso dell'esercizio 2009.

Gli obiettivi prefissati per l'anno 2009 sono stati definiti nel Piano Operativo Triennale 2009-2011 approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione n.50 del 15.12.2008 (da AATO Veronese con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n.16 del 22.12.2008) e successivamente modificato ed approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazioni del 05.06.2008 e del 03.07.2008 (da AATO Veronese con deliberazione n.5 del 10.07.2009).

Gli investimenti previsti nel Piano Operativo Triennale 2009-2011 possono essere riassunti come segue:

INVESTIMENTI	POT 2009-2011 approvato da AATO anno 2009
Generali	€ 8.938.800
di cui allacciamenti	€ 3.000.000
Manutenzioni	€ 6.422.000
Specifici	€ 29.216.891
SOMMANO	€ 44.577.691

Il territorio interessato dagli investimenti di cui sopra è costituito dai 70 Comuni in cui Acque Veronesi ha gestito il servizio idrico integrato nel corso del 2009, come mostrato nella figura sottostante:

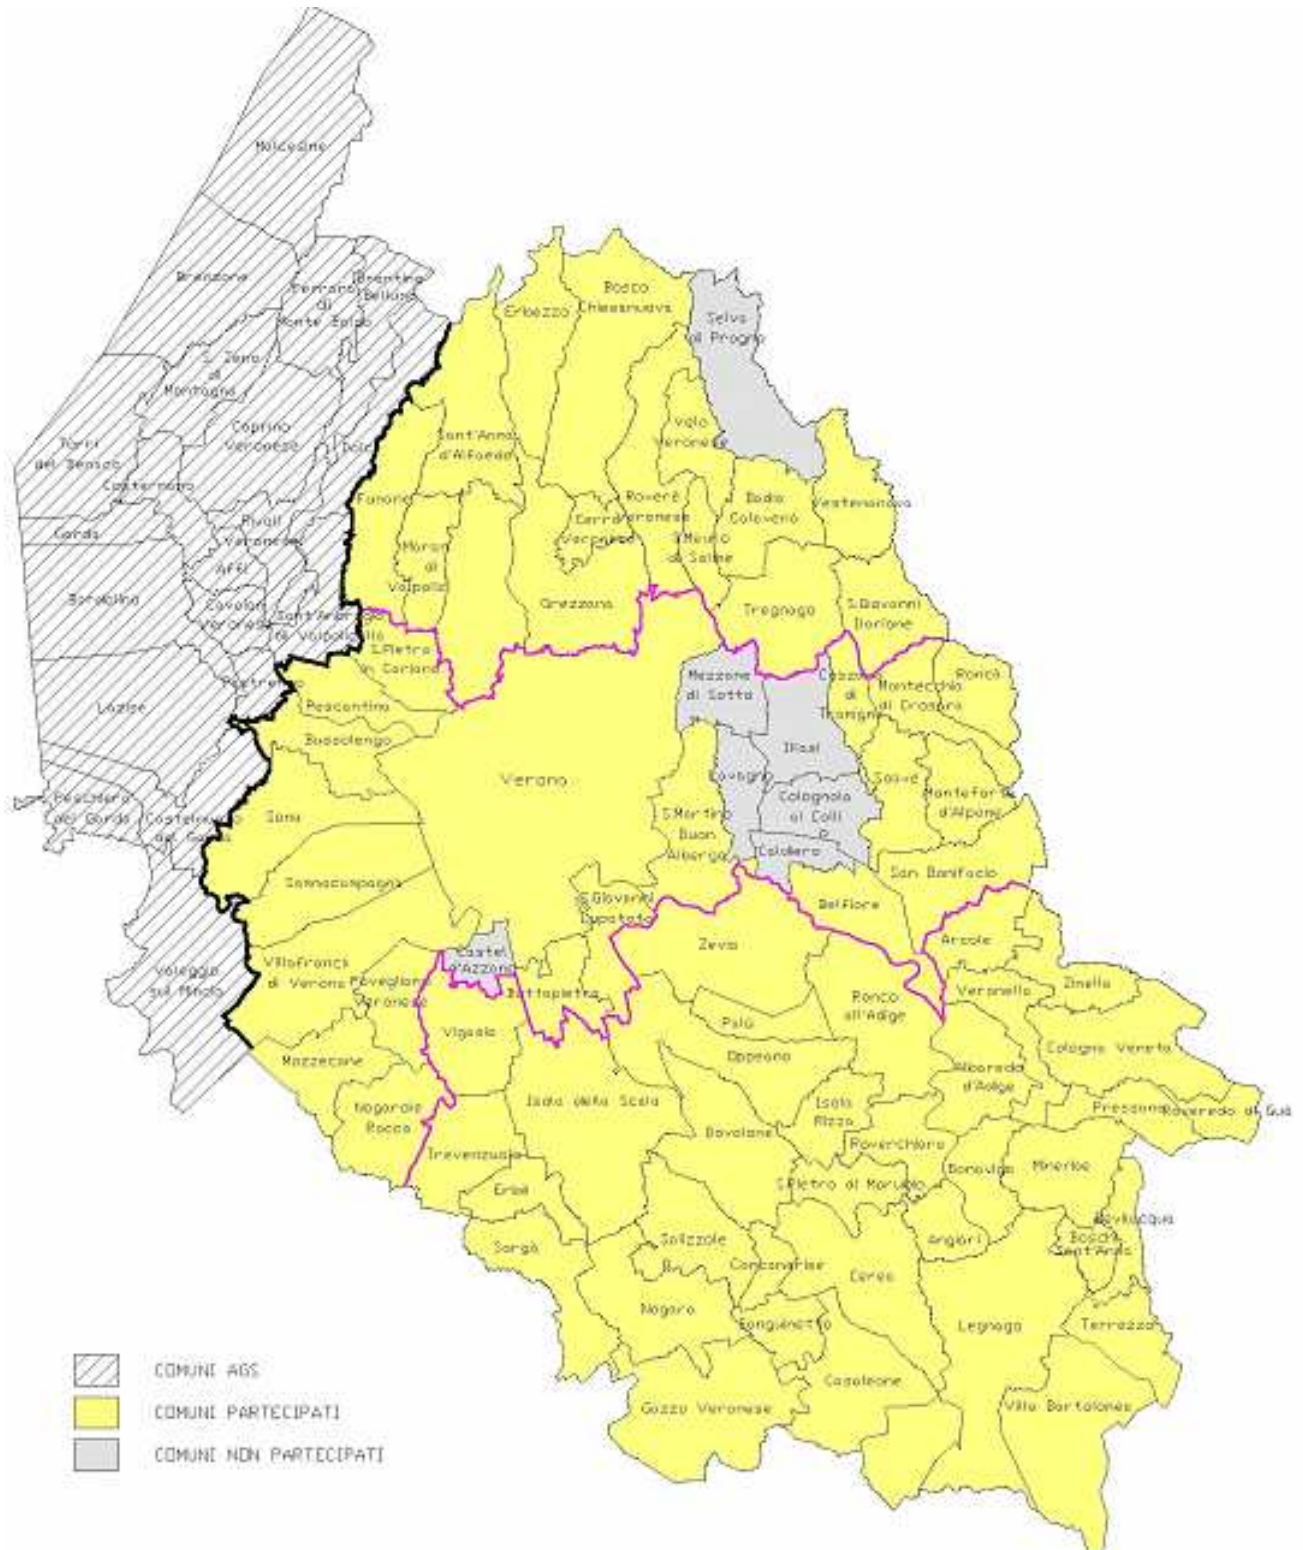

2. GLI INVESTIMENTI REALIZZATI NELL'ANNO 2009

Nel corso del 2009 Acque Veronesi ha realizzato investimenti per circa 30,4 milioni di Euro, tutti previsti nel Piano Operativo Triennale 2009-2010 e riconducibili alle seguenti tre macro-categorie:

Interventi di carattere generale :

hanno riguardato sostanzialmente:

- gli interventi strutturali e gestionali indispensabili per un efficace ed efficiente funzionamento della Società, quali la realizzazione della cartografia informatizzata, l'attività di ricerca perdite, l'implementazione dei sistemi informativi, etc... Per la maggior parte hanno costituito il proseguimento di interventi già avviati negli anni precedenti;
- gli allacciamenti di nuovi utenti al servizio idrico integrato.

Interventi per manutenzioni straordinarie, messa a norma e telecontrollo di reti ed impianti:

sono stati necessari principalmente per:


- far fronte alle urgenze causate da guasti e rotture delle reti e degli impianti gestiti;
- adeguare le infrastrutture alle normative per la sicurezza e per l'ambiente;
- realizzare un sistema di telecontrollo degli impianti gestiti.

Interventi specifici:

hanno riguardato la progettazione e la realizzazione di opere necessarie per l'estensione del servizio a zone non servite e per l'adeguamento ed il potenziamento di reti ed impianti di acquedotto, fognatura e depurazione.


Gli investimenti realizzati nel corso del 2009 possono essere riassunti come segue:

INVESTIMENTI	n° interventi	REALIZZATO dal 01/01/2009 al 31/12/2009
Generali	\	6.219.872
Manutenzioni	\	6.424.799
Specifici	116	17.744.718
SOMMANO	116	30.389.389

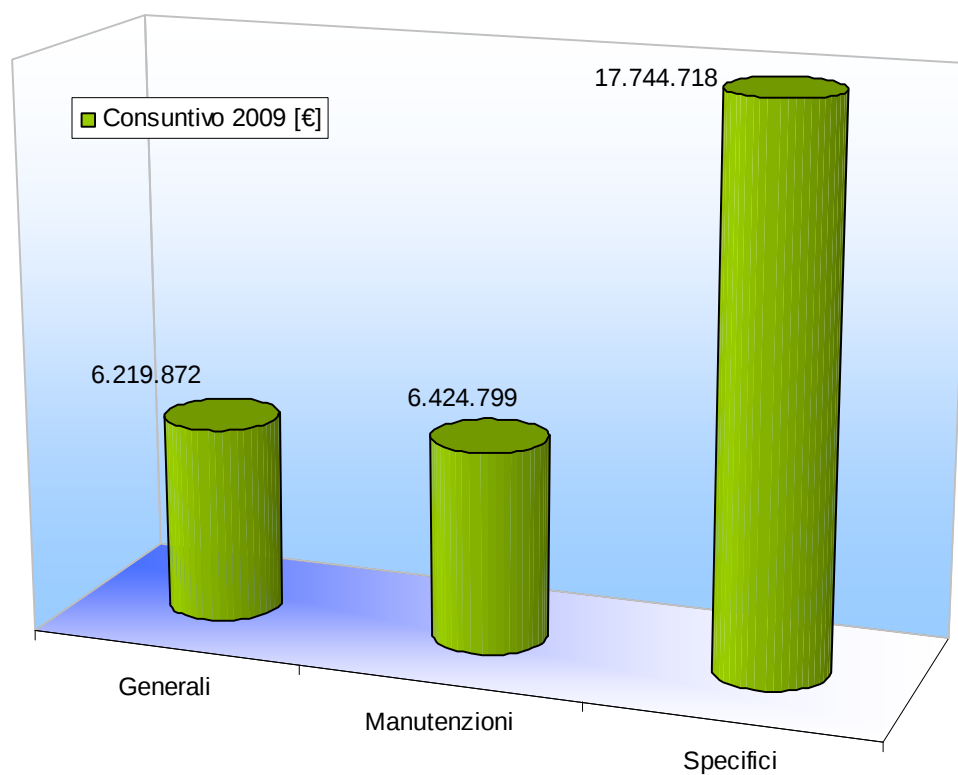

Gli investimenti realizzati nel corso del 2009, al netto dei contributi per allacciamento e dei contributi della Regione Veneto, possono essere riassunti come segue:

INVESTIMENTI	REALIZZATO dal 01/01/2009 al 31/12/2009
Generali	6.219.872
<i>di cui allacciamenti</i>	<i>3.104.434</i>
Manutenzioni	6.424.799
Specifici	17.744.718
<i>di cui contributi Regione Veneto</i>	<i>1.000.000</i>
Investimenti realizzati al netto di contributi Regionali ed Allacciamenti	26.284.955

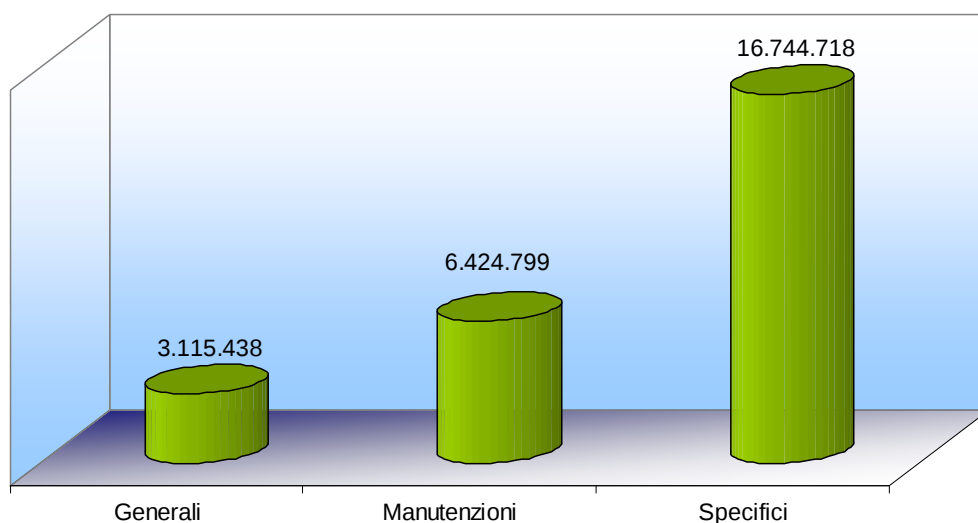

Nei paragrafi successivi si riporta una breve descrizione degli interventi realizzati.

2.1. Interventi di carattere generale

In riferimento alle necessità relative ad efficacia ed efficienza di funzionamento della società di gestione, sono stati realizzati investimenti per circa 6,2 milioni di euro, destinati a:

Situazione di potenziale pericolo per la salute pubblica e danno all'ambiente (0.9 mln €)

Nel corso del 2009 si è reso necessario intervenire con urgenza su alcune infrastrutture del servizio idrico per eliminare situazioni di potenziale pericolo per la salute pubblica e/o danno all'ambiente causati da problemi contingenti quali la comparsa di inquinanti nelle acque potabili e/o di acque reflue nel sottosuolo, malfunzionamenti di reti ed impianti causati da eventi imprevisti ed accidentali. A titolo esemplificativo si possono citare i seguenti interventi:

- acquisto di 2 impianti di potabilizzazione trasportabili per l'abbattimento degli inquinanti derivanti da pesticidi / fertilizzanti ed installazione / messa in esercizio nel Comune di Vigasio (circa 200.000 €);
- ripristino del funzionamento della centrale di potabilizzazione di Bovolone a seguito di un grave danneggiamento provocato da un evento atmosferico (circa 300.000 €);
- realizzazione di un impianto di potabilizzazione in località Costeggiola nel comune di Soave al fine di abbattere i nitrati rilevati in quantità eccedenti i limiti normativi (circa 90.000 €).

Qualità Ambiente e Sicurezza (0,1 mln €)

Sono stati acquistati apparecchi e strumentazioni necessari per la sicurezza dei lavoratori (cartellonistica di sicurezza, armadi antincendio e strumentazioni varie), e si è proceduto con l'analisi dei rischi per la sicurezza negli impianti gestiti.

Rilevamento in campo e costruzione Sistema Informativo Territoriale (0,5 mln €)

Nel corso del 2009 si è proseguito con l'implementazione del Sistema Informativo Territoriale aziendale (rilievo reti esistenti ed inserimento nell'applicativo ESRI) finalizzato alla creazione di un database delle reti e degli impianti che permette di consultare, aggiornare, rappresentare, analizzare, elaborare tutti i dati e le informazioni necessarie per una corretta erogazione del servizio nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il Sistema Informativo Territoriale è anche la base fondamentale per la realizzazione di modelli di simulazione del funzionamento delle reti e degli impianti, attività che si vuole implementare nel 2010.

Nello specifico, gli investimenti realizzati nel corso del 2009 hanno riguardato rilievi delle reti fognarie nei seguenti comuni: Bosco Chiesanuova - Cerro Veronese - Marano di Valpolicella - Oppeano e Isola della Scala.

Sistemi di automazione e telecontrollo – centrale operativa di controllo (0,3 mln €)

Sono state acquistate apparecchiature e strumentazioni per l'implementazione del sistema di telecontrollo aziendale, che consente ora, a partire da una centrale operativa di controllo, il monitoraggio, la gestione del funzionamento nonché la trasmissione/ricezione dei dati tra i principali impianti di acquedotto, fognatura e depurazione. E' stata avviata inoltre la predisposizione di una serie di collegamenti wireless tra le principali sedi ed i principali impianti gestiti da Acque Veronesi.

Ricerca Perdite (0,2 mln €)

Sono stati attivati sistemi di monitoraggio delle reti idriche e delle reti di raccolta fognaria (posa misuratori di portata...), finalizzati alla riduzione delle perdite idriche e delle infiltrazioni fognarie che costituiscono uno dei problemi di maggiore interesse nel campo della gestione dei sistemi idrici.

Investimenti immateriali (0,05 mln €)

Nella prima parte del 2009 sono state concluse alcune analisi precedentemente avviate allo scopo di migliorare l'organizzazione generale della società.

Sistemi Informativi Gestionali: (0,3 mln €)

Nel corso del 2009 è stato dato avvio all'implementazione di un sistema di gestione documentale atto a supportare molti processi quali ad esempio il protocollo informatico, i flussi documentali, le pratiche in ingresso da Enti, le pratiche di autorizzazione allo scarico in rete fognaria per utenze industriali ed assimilate... Sono stati avviati inoltre gli studi necessari per ottimizzare il sistema informativo aziendale della Società in relazione alle aree non ancora perfettamente coperte quali ad esempio quella della "Gestione Impianti".

Sono stati acquistati naturalmente software ed hardware necessari per garantire alla Società gli strumenti necessari per la normale operatività.

Nuovo edificio Uffici

L'investimento previsto per la nuova sede aziendale non è stato realizzato a seguito del provvedimento n. 53 del 01.10.2009 del Consiglio di Amministrazione dell'AATO Veronese.

Implementazione e sostituzione strumentazione laboratorio analisi per controllo qualità del prodotto (0,1 mln €)

Gli investimenti dell'anno 2009 hanno permesso la sostituzione di alcune apparecchiature obsolete

e poco affidabili (cromatografo ionico, apparecchiature per la conservazione dei campioni), e l'acquisto di strumentazione e apparecchiature per il miglioramento di alcuni metodi analitici attualmente in uso, soprattutto nella parte preparativa dei campioni (sistema di preconcentrazione on-line, evaporazione controllata dei campioni, preparatore di campioni).

Adeguamento Strutture e Arredi per le sedi attuali (0,3 mln €)

Nel corso del 2009, mediante la ristrutturazione di un'unità immobiliare esistente, è stata realizzata la sede operativa del distretto Montano presso la centrale di Montorio; sono state compiute inoltre piccole sistemazioni nella sede centrale di Verona per esigenze organizzative.

Nel corso dell'esercizio 2009 le sedi di Legnago, Bovolone, Villafranca e l'Ufficio Relazioni con il Pubblico in Verona, hanno visto la modifica del layout degli spazi adibiti a "Contatto con la Clientela". I principi a cui ci si è ispirati sono stati: la funzionalità, la privacy, l'innovazione tecnologica, il miglioramento dell'ambiente di lavoro e l'estetica.

Sono stati apportati dei miglioramenti anche agli ambienti di altre sedi operative .

Sono stati installati strumenti volti al monitoraggio puntuale delle attività di sportello per mezzo di gestori delle code, di apparecchiature telefoniche ed informatiche di nuova generazione.

Estensioni e Potenzamenti di reti concomitanti a interventi per nuove lottizzazioni e/o ad interventi di altri enti (0,2 mln €)

Sono stati realizzati piccoli rifacimenti/estensioni delle reti acquedottistiche e fognarie resi opportuni e convenienti dalla loro concomitanza con la realizzazione di opere a servizio di nuovi insediamenti e/o ad interventi programmati da altri enti .

Allacciamenti (3,1 mln €)

Sono stati realizzati ex novo / adeguati allacciamenti al servizio idrico integrato (acquedotto/fognatura) a fronte di contributo da parte degli utenti richiedenti; tali investimenti ovviamente non sono di iniziativa del gestore ma dipendono dalle richieste degli utenti.

Approfondimenti tecnici ed economici per rifacimenti / ristrutturazioni / estensioni di reti ed impianti acquedotto / fognatura (0,15 mln €)

Nel corso dell'anno 2009 sono stati eseguiti studi mirati ad individuare gli interventi necessari per adeguare ed ottimizzare impianti e reti alla situazione attuale ed agli sviluppi prevedibili del territorio (accorpamento campi pozzi, realizzazione dorsali di adduzione acque potabile, centralizzazione impianti di depurazione, estensione del servizio, etc...)

2.2. Interventi per manutenzioni straordinarie, messa a norma e telecontrollo di reti ed impianti

Sono stati eseguiti interventi per un totale di circa 6,4 milioni di euro riepilogabili come segue:

- manutenzione straordinaria di reti ed impianti di acquedotto, fognatura e depurazione volta al ripristino del servizio in caso di guasti e malfunzionamenti (4,6 mln €);
- rinnovo e adeguamento normativo degli impianti al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori ottemperando alle normative in materia, avviando nel contempo il processo di implementazione di un sistema di gestione della sicurezza per l'ottenimento della certificazione OHSAS 18001 (1,2 mln €);
- acquisto di materiali e strumenti per le squadre operative (0,1 mln di €);
- acquisto ed installazione di apparecchiature e strumentazioni per implementare il sistema di telecontrollo e telecomando degli impianti gestiti (0,5 mln €).

2.3. Interventi specifici

Nel corso del 2009 sono state realizzate progettazioni e/o realizzazioni di lavori per un totale di circa 17,7 milioni di euro ripartiti su 116 interventi; sono state così concluse e messe in esercizio le opere relative a 18 degli interventi previsti nel Piano Operativo (per un importo complessivo pari a circa 8,3 mln € dei quali 6,9 mln € spesi nel 2009) a cui si aggiungono 4 stralci di interventi pure previsti nel Piano (per un importo pari a circa 1,9 mln € dei quali 1,8 mln € spesi nel 2009).

Per quanto concerne le progettazioni, sono stati redatti:

- 10 Analisi di Fattibilità
- 30 Progetti Preliminari
- 5 Progetti Preliminari / Definitivi
- 17 Progetti Definitivi
- 13 Progetti Definitivi / Esecutivi.
- 25 Progetti Esecutivi

Sono stati infine aperti 40 nuovi cantieri che si aggiungono ai 16 iniziati nell'anno precedente.

3. LA RIPARTIZIONE DEGLI INVESTIMENTI NEL TERRITORIO

Al fine di ottimizzare l'organizzazione della società, Acque Veronesi ha suddiviso la gestione del servizio sul territorio sulla base delle caratteristiche geomorfologiche dello stesso, creando tre distretti operativi denominati rispettivamente montano, pedemontano e pianura.

La distribuzione sul territorio degli investimenti realizzati nel corso del 2009 da Acque Veronesi si può riepilogare dunque nelle seguenti suddivisioni:

- "montano", "pedemontano" e "pianura" sono gli investimenti riconducibili direttamente ad infrastrutture dei Comuni di ciascun distretto operativo;
- "più distretti" sono gli investimenti su infrastrutture a servizio dei Comuni appartenenti a più distretti quali, ad esempio, la realizzazione di depuratori consortili, di condotte acquedottistiche e di collettori fognari;
- "struttura" sono gli investimenti non direttamente riconducibili ai singoli Comuni in quanto necessari al funzionamento della Società di gestione, quali l'implementazione di sistemi informativi e gestionali, l'implementazione del sistema di telecontrollo, la ricerca di perdite, la realizzazione del sistema cartografico digitale...;
- "allacciamenti" sono gli investimenti relativi alla realizzazione di allacciamenti delle utenze alle reti pubbliche di acquedotto e fognatura.

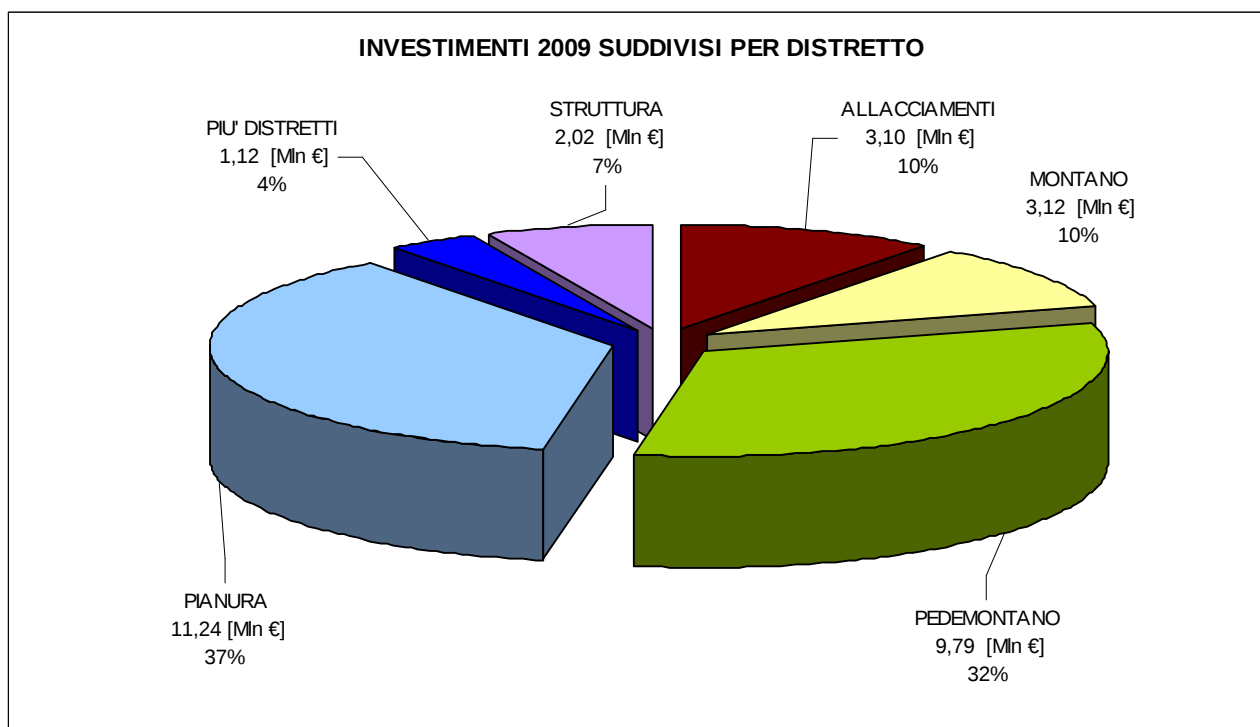


Figura 1 - ripartizione degli investimenti 2009 per distretto

4. LA RIPARTIZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO

Gli investimenti realizzati da Acque Veronesi nel corso del 2009 sono stati suddivisi anche sulla base delle seguenti tipologie di servizio:

- "acquedotto" : interventi per il rifacimento o la realizzazione di reti ed impianti per il trasporto e la distribuzione di acqua potabile nei Comuni gestiti;
- "fognatura" : interventi per il rifacimento o la realizzazione di reti ed impianti per il collettamento dei reflui urbani dei Comuni gestiti;
- "depurazione" : interventi inerenti l'adeguamento, l'ampliamento o la costruzione di impianti di depurazione;
- "più servizi" : interventi per rifacimento, adeguamento, ampliamento o realizzazione di infrastrutture per il servizio idrico integrato non riconducibili ad un singolo servizio tra quelli sopracitati;
- "servizi per la gestione": interventi non direttamente riconducibili alla tipologia di servizio in quanto necessari per il funzionamento della Società, quali l'implementazione di sistemi informativi e gestionali, studi e consulenze, acquisto strumentazioni e apparecchiature per centrale di controllo, laboratorio...
- "allacciamenti" : relativi alle richieste di allacciamento alle reti pubbliche di acquedotto e fognatura da parte delle utenze attualmente non servite

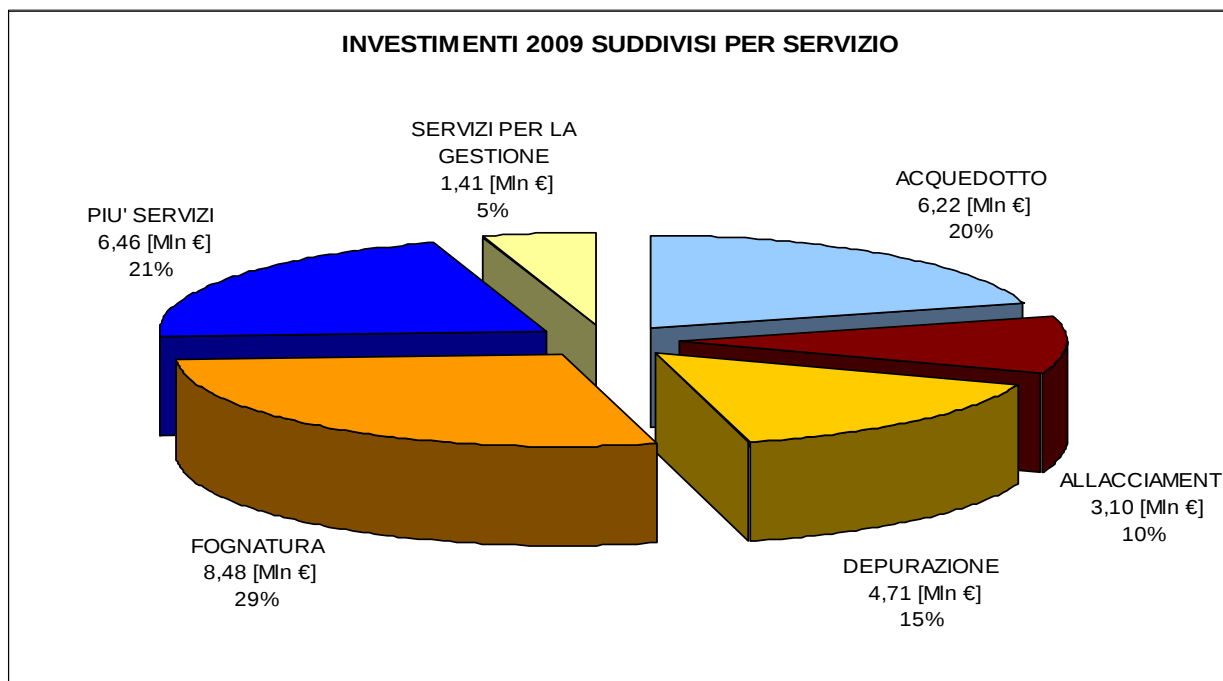



Figura 2 - ripartizione degli investimenti 2009 per servizio

5. GLI SCOSTAMENTI TRA INVESTIMENTI PIANIFICATI ED INVESTIMENTI REALIZZATI NELL'ANNO 2009

Il riepilogo della situazione degli investimenti di Acque Veronesi, riportato nella tabella sottostante, evidenzia la quota degli investimenti realizzati nel 2009 a confronto con il budget dell'anno 2009.

INVESTIMENTI	POT 09-11 - ANNO 2009 approvato da AATO	REALIZZATO dal 01/01/2009 al 31/12/2009	Scostamento [€]	Investimenti realizzati rispetto POT anno 2009%
Generali	8.938.800	6.219.872	- 2.718.928	70%
<i>di cui allacciamenti</i>	<i>3.000.000</i>	<i>3.104.434</i>	<i>104.434</i>	<i>103%</i>
Manutenzioni	6.422.000	6.424.799	2.799	100%
Specifici	29.216.891	17.744.718	- 11.472.173	61%
SOMMANO	44.577.691	30.389.389	- 14.188.302	68%

CONFRONTO: BUDGET 2009 / CONSUNTIVO 2009

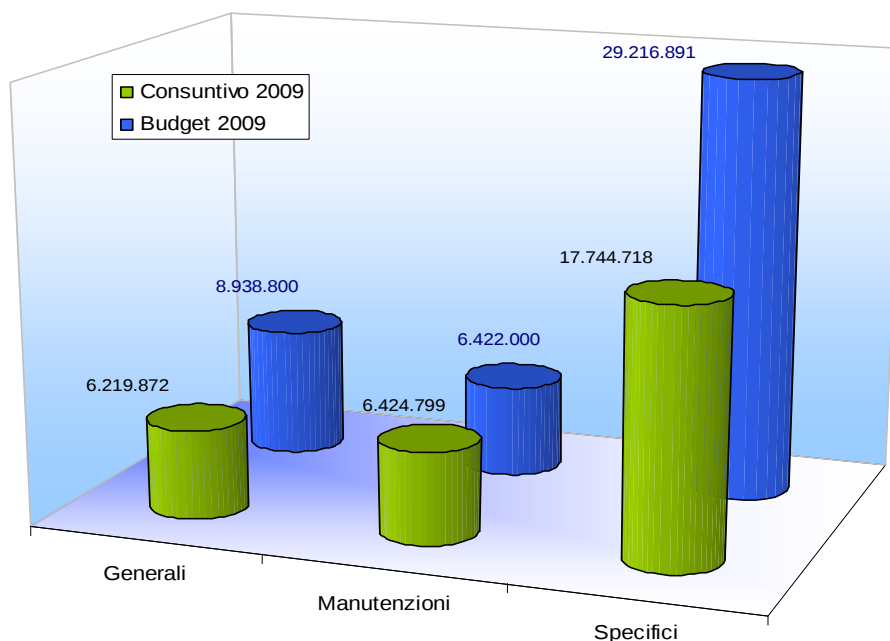

Le cause dello scostamento tra gli investimenti previsti nel Piano Operativo e quelli realizzati nel 2009 sono brevemente descritte di seguito, e maggiormente dettagliate per ciascun intervento nelle tabelle allegate alla presente relazione.

Investimenti di carattere generale

A fronte degli 8,9 mln di Euro previsti sono stati consuntivati 6,2 mln euro con uno scostamento pari a circa 2,7 mln di Euro che è il risultato di minori spese su alcuni interventi e maggiori spese su altri; in sintesi:

- Minori spese per:
 - ritardi nella realizzazione di attività relative a rilievi in campo necessari per la costruzione del Sistema Informativo Territoriale, a lavori per la ricerca perdite, ad opere concomitanti ad interventi di altri enti (dovuti principalmente a condizioni meteorologiche avverse); le attività in ritardo verranno realizzate nel corso dell'anno 2010;
 - ritardi nella realizzazione del progetto per l'implementazione dei nuovi sistemi informativi e gestionali e del progetto di finanza per il reperimento dei fondi necessari per gli investimenti; le attività in ritardo verranno realizzate nel corso dei prossimi anni;
 - altro:
 - sospensione dell'investimento per la realizzazione di una nuova sede aziendale a seguito del provvedimento n. 53 del 01.10.2009 del Consiglio di Amministrazione dell'AATO Veronese;
 - non completo utilizzo delle somme riservate ad eventuali situazioni di potenziale pericolo per la salute pubblica e danno all'ambiente, risparmi di spesa rispetto le previsioni (in particolare per l'acquisto strumentazioni di laboratorio e per la ricerca perdite);
- Maggiori spese per:
 - maggiori allacciamenti rispetto le previsioni;
 - anticipo di alcuni interventi previsti per l'anno successivo per la centrale operativa di controllo e per la standardizzazione lay-out degli sportelli Acque Veronesi;

Investimenti per messa a norma, manutenzioni straordinarie, adeguamenti normativi e telecontrollo

Acque Veronesi ha realizzato il 100% degli investimenti previsti per questa tipologia di interventi. Nel rispetto della spesa complessiva prevista pari a 6,4 mln di euro, vi sono stati comunque alcuni scostamenti tra pianificato e realizzato per ciascuna singola categoria di intervento; in particolare

vi sono state:

- Maggiori spese per:
 - interventi straordinari per emergenze, quali l'adeguamento delle reti e degli impianti gestiti al fine di far fronte a problematiche quali guasti e malfunzionamenti
- Minori spese per:
 - ritardo nella realizzazione delle altre categorie di interventi; le attività in ritardo verranno realizzate nel corso dell'anno 2010.

Investimenti Specifici

A fronte dei 29,2 mln di Euro previsti sono stati consuntivati circa 17,7 mln euro con uno scostamento pari a circa 11,5 mln di Euro che è il risultato di minori spese su alcuni interventi e maggiori spese su altri; in sintesi:

Minori spese per:

- ritardo nella realizzazione di alcuni interventi a causa di rallentamento della progettazione e/o della produzione di cantiere (variazioni e/o integrazioni progettuali, condizioni meteorologiche avverse nei luoghi di cantiere...); le attività in ritardo verranno realizzate nel corso dei prossimi anni;
- ritardo nella realizzazione di alcuni interventi a causa di mancate autorizzazioni (complessità procedurali per ottenere pareri, concessioni, autorizzazioni, approvazioni da enti terzi, allungamento dei tempi delle procedure espropriative...); le attività in ritardo verranno realizzate nel corso dei prossimi anni;
- altro: risparmi parziali rispetto le spese previste per progettazione e lavori nell'anno 2009, ribassi d'asta, spese per imprevisti non ancora utilizzate...; tali risparmi potranno essere confermati solo dopo la chiusura dei lavori.


- Maggiori spese per:
 - anticipo di alcuni interventi previsti per l'anno successivo grazie ad accelerazione della progettazione e/o della produzione in cantiere.

Gli scostamenti riscontrati tra gli importi 2009 previsti da Piano e quelli effettivamente realizzati possono esser così ripartiti:

INVESTIMENTI	maggiori spese	minori spese
Generali	€ 253.000	€ 2.971.928
di cui allacciamenti	€ 104.434	
Manutenzioni	€ 347.200	€ 344.401
Specifici	€ 516.824	€ 11.988.997
SOMMANO	€ 1.117.023	€ 15.305.325


Sulla base di quanto sopra specificato, le cause di maggiori spese rispetto quanto previsto per gli investimenti 2009 possono essere raggruppate come segue:

- anticipi di realizzazione
- interventi straordinari per emergenze

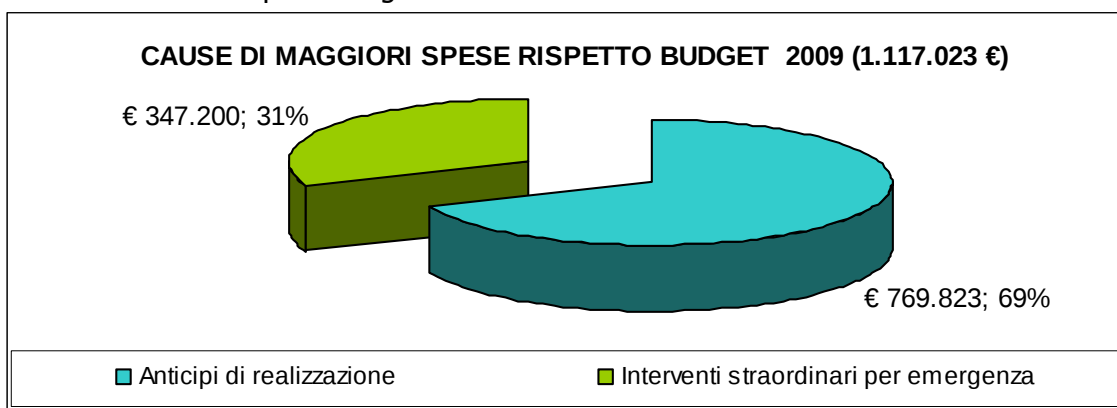


Le cause invece di minori spese rispetto quanto previsto per gli investimenti 2009 possono essere raggruppate come segue:

- ritardi di realizzazione
- mancate autorizzazioni
- altro

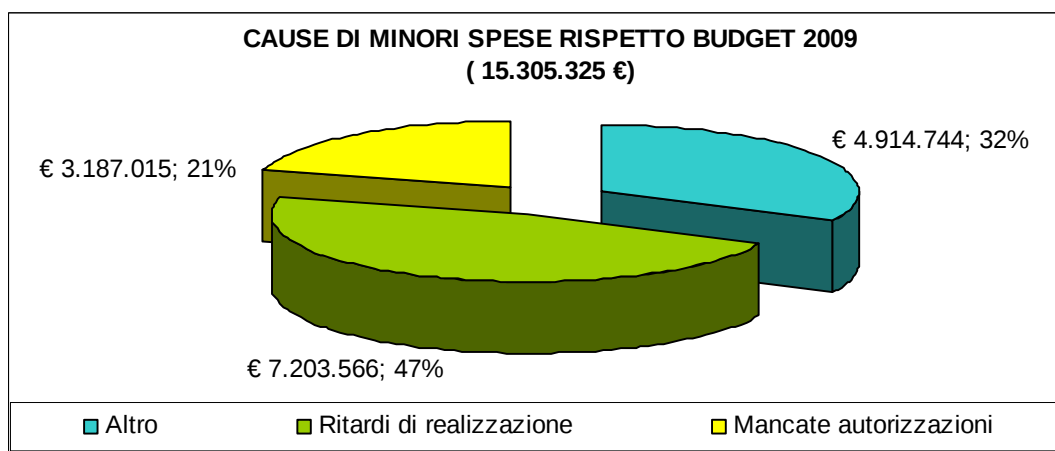


6. GLI INVESTIMENTI REALIZZATI NEL PRIMO TRIENNIO DI GESTIONE 2007-2009

Acque Veronesi ha realizzato nel primo triennio di gestione 2009-2011 investimenti per un totale di circa 50,6 mln di Euro, come riepilogato di seguito:

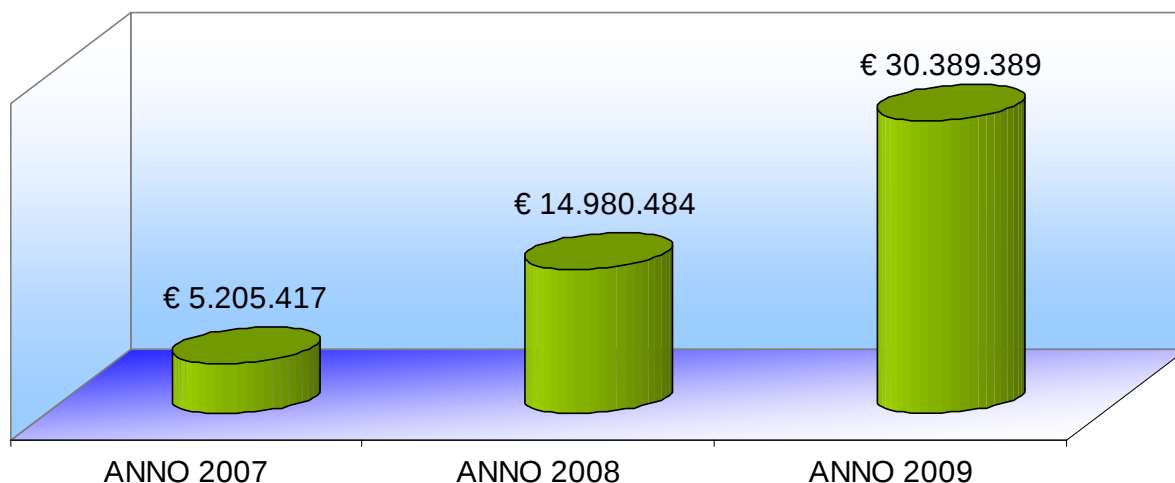

Gli investimenti di cui sopra, al netto dei contributi degli utenti per l'allacciamento al servizio idrico e dei contributi della Regione Veneto portano ad un totale di circa 42.6 mln di Euro, come riepilogato di seguito:

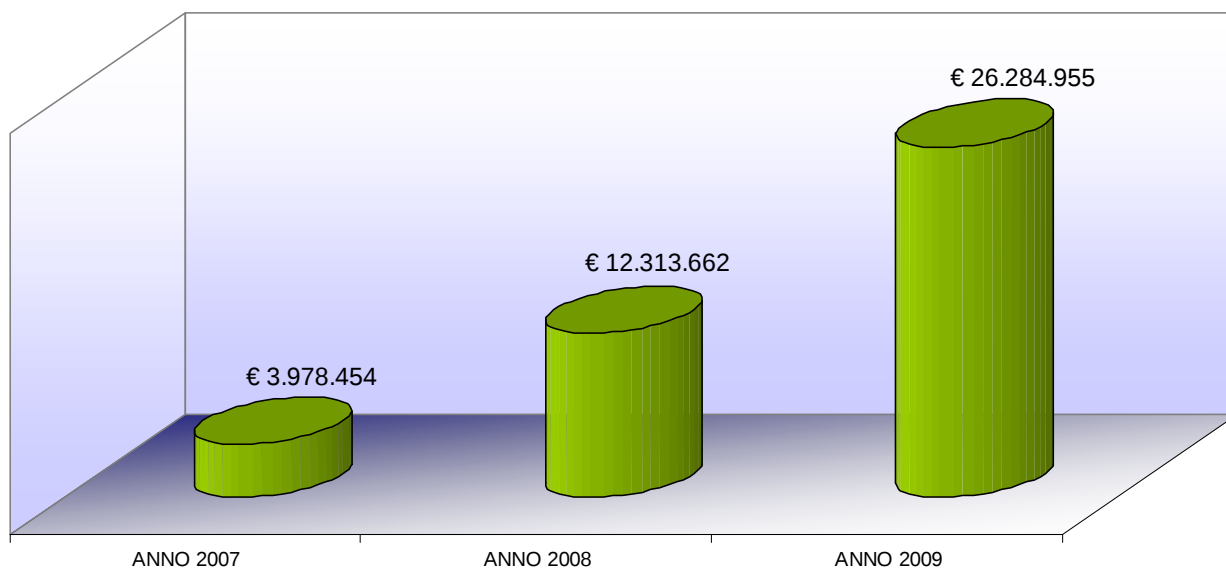



SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

PIANO OPERATIVO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2009-2011

Consuntivo al 31.12.2009

ALLEGATO

Dettaglio degli investimenti realizzati al 31.12.2009

Tab.1 – Interventi di carattere Generale

Tab.2 – Interventi relativi a manutenzioni, messa a norma, telecontrollo

Tab.3 – Interventi specifici

RIEPILOGO INVESTIMENTI REALIZZATI NELL'ESERCIZIO 2009

INVESTIMENTI	REALIZZATO dal 01/01/2009 al 31/12/2009
Generali	€ 6.219.872
Manutenzioni	€ 6.424.799
Specifici	€ 17.744.718
Investimenti complessivi realizzati	€ 30.389.389

<i>di cui allacciamenti</i>	€ 3.104.434
<i>di cui contributi Regione Veneto</i>	€ 1.000.000
<i>Investimenti realizzati al netto di contributi Regionali ed Allacciamenti</i>	€ 26.284.955

Tab.1 - Interventi di carattere generale

N°PROGRESSIVO INTERVENTO	COMUNE	MACROAREA DI PIANO D'AMBITO	CODICE AATO	TITOLO INTERVENTO	ANNO 2009 BUDGET APPROVATO DA AATO	INVESTIMENTI REALIZZATI ANNO 2009	DIFFERENZA CONSUNTIVO - BUDGET 2009	CAUSE MANCATA REALIZZAZIONE / ANTICIPO REALIZZAZIONE
1	PIU' COMUNI	\	MTZ.1 - MTZ.2	Situazioni di potenziale pericolo per la salute pubblica e danno all'ambiente	1.000.000	899.911	-100.089	Altro
2	PIU' COMUNI	\	\	Qualità Ambiente e Sicurezza	195.000	109.157	-85.843	Altro
3	PIU' COMUNI	\	E.1-C-01 + F.1-C-01	Rilevamento in campo e costruzione SIT infrastrutture acquedottistiche e fognarie	600.000	543.849	-56.151	Ritardi di realizzazione
4	STRUTTURA	\	E.2-C-01 + F.2-C-01	Sistemi di automazione e telecontrollo - centrale operativa di controllo	250.000	272.431	22.431	Anticipi di realizzazione
5	PIU' COMUNI	\	D.2-C-23 + C.4-C-02 + C.4-C-03 + C.4-C-04 + C.4-C-05 + C.4-C-06	Attività di ricerca perdite e riabilitazione reti ed impianti	180.000	167.754	-12.246	Ritardi di realizzazione
6	STRUTTURA	\	\	Investimenti immateriali	450.000	52.420	-397.580	Ritardi di realizzazione
7	STRUTTURA	\	\	Sistemi informativi e gestionali sede centrale e sedi periferiche	680.900	297.021	-383.879	Ritardi di realizzazione
8	STRUTTURA	\	\	Nuovo edificio uffici	1.798.400	12.240	-1.786.160	Altro
9	STRUTTURA	\	\	Implementazione e sostituzione strumentazione laboratorio analisi per controllo qualità del prodotto	170.000	119.341	-50.659	Altro
10	STRUTTURA	\	\	Adeguamento strutture e arredi sedi periferiche	150.000	276.135	126.135	Anticipi di realizzazione
11	PIU' COMUNI	\	\	Interventi di pianificazione territoriale: estensioni e potenziamenti concomitanti a interventi per nuove lottizzazioni e/o in concomitanza ad interventi di altri enti	250.000	198.472	-51.528	Ritardi di realizzazione
12	PIU' COMUNI	\	\	Allacciamenti	3.000.000	3.104.434	104.434	Anticipi di realizzazione
13	PIU' COMUNI	\	B.4-C-10 + B.4-C-11 + C.4-C-02 + C.4-C-03	Approfondimenti tecnici ed economici per rifacimenti / ristrutturazioni / estensioni di reti ed impianti acquedotto / fognatura nel distretto montano	214.500	166.708	-47.792	Ritardi di realizzazione
14	PIU' COMUNI	\	B.4-C-10 + B.4-C-11 + B.4-C-12 + C.4-C-02 + C.4-C-03 + C.4-C-04	Approfondimenti tecnici ed economici per rifacimenti / ristrutturazioni / estensioni di reti ed impianti acquedotto / fognatura nel distretto pedemontano				
15	PIU' COMUNI	\	B.4-C-12 + B.4-C-13 + B.4-C-14 + C.4-C-04 + C.4-C-05 + C.5-C-06	Approfondimenti tecnici ed economici per rifacimenti / ristrutturazioni / estensioni di reti ed impianti acquedotto / fognatura nel distretto pianura				
TOTALE INTERVENTI ALLEGATO 1.A					8.938.800	6.219.872	-2.718.928	

Tab.2 – Interventi relativi a manutenzioni, messa a norma, telecontrollo

N°PROGRESSIVO INTERVENTO	COMUNE	MACROAREA DI PIANO D'AMBITO	CODICE AATO	TITOLO INTERVENTO	ANNO 2009 BUDGET APPROVATO DA AATO	INVESTIMENTI REALIZZATI ANNO 2009	DIFFERENZA CONSUNTIVO - BUDGET 2009	CAUSE MANCATA REALIZZAZIONE / ANTICIPO REALIZZAZIONE
1	PIU' COMUNI	\	MTZ.1	ADEGUAMENTI A LIVELLO DI ESERCIZIO MINIMO E OTTIMIZZAZIONE RETI E IMPIANTI	4.300.000	4.647.200	347.200	Interventi straordinari per emergenza
2	PIU' COMUNI	\	MTZ.1 - MTZ.2	MESSA A NORMA INERENTI LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO E FOGNATURA	1.500.000	1.198.553	-301.447	Ritardi di realizzazione
3	PIU' COMUNI	\	\	APPARECCHIATURE E STRUMENTAZIONE PER SEDI PERIFERICHE	122.000	107.632	-14.368	Ritardi di realizzazione
4	PIU' COMUNI	\	E.2-C-01 e F.2-C-01	SISTEMI DI TELECONTROLLO SU IMPIANTI ACQUEDOTTO E FOGNATURA	500.000	471.414	-28.586	Ritardi di realizzazione
TOTALE INTERVENTI ALLEGATO 1.B					6.422.000	6.424.799	2.799	

Tab.3 – Interventi specifici

N°PROGRESSIVO INTERVENTO	COMUNE	MACROAREA DI PIANO D'AMBITO	CODICE AATO	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO [€]	IMPORTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO [€]	ANNO 2009 BUDGET APPROVATO DA AATO	INVESTIMENTI REALIZZATI ANNO 2009	DIFFERENZA CONSUNTIVO - BUDGET 2009	CAUSE MANCATA REALIZZAZIONE / ANTICIPO REALIZZAZIONE
1	BADIA CALAVENA	VR/3	B.1-B-45	Realizzazione condotte fognarie al servizio del capoluogo	1.851.000	0	0	0	0	
2	BOSCO CHIESANUOVA	VR/2	A.2-A-02 Stralcio	Allacciamento all'acquedotto delle contrade Brutti, Rolli, Merli, Tecle e Squaranton	303.000	0	100.000	28.777	-71.223	Altro
3	BOSCO CHIESANUOVA	VR/2	A.2-A-02 Stralcio	Ristrutturazione impianto Villa Ponti (acquedotto della lessinia) e potenziamento del sistema di distribuzione di acqua potabile del Comune di Bosco	502.000	0	491.158	454.857	-36.301	Ritardi di realizzazione
4	BOSCO CHIESANUOVA	VR/2	B.1-A-73 Stralcio	Allacciamento contrada Grobbe al collettore della Lessinia	269.000	0	25.000	10.587	-14.413	Ritardi di realizzazione
5	BOSCO CHIESANUOVA	VR/2	B.1-A-73 Stralcio	Progetto per adeguamento rete fognaria del capoluogo e primi interventi urgenti	100.000	0	100.000	51.842	-48.158	Altro
6	CERRO VERONESE	VR/2	B.1-C-62	* Estensione e rifacimento della rete fognaria: 1a fase (progetto e primi interventi urgenti sulla rete del capoluogo)	250.000	0	100.000	85.597	-14.403	Altro
7	ERBEZZO	VR/2	A.2-A-02	Potenziamento e ristrutturazione impianto sistema di adduzione acqua potabile a Cappella Fasani (Comune di Erbezzo)	200.000	0	32.000	10.838	-21.162	Altro
8	ERBEZZO	VR/2	B.2-A-35 Stralcio	Adegamenti urgenti rete esistente e progetto di completamento della rete fognaria del Comune di Erbezzo	140.000	0	80.000	16.164	-63.836	Altro
9	FUMANE	VR/2	A.1-A-03	Estensione rete acquedotto in località Uri a Mazzurega	80.000	0	80.000	73.582	-6.418	Ritardi di realizzazione
10	GREZZANA	VR/2	A.3-A-11 + A.3-A-08	Interventi di potabilizzazione Grezzana - Nesente: 2°e 3°stralcio (pozzi e sistemazione centrale Nesente; condotta Nesente - Grezzana)	1.356.000	628.505	300.000	47.492	-252.508	Ritardi di realizzazione
11	GREZZANA	VR/2	B.1-A-71	Completamento rete fognaria nelle frazioni di Rosaro, Busoni e Corso	900.000	900.000	200.000	349.975	149.975	Anticipi di realizzazione
12	GREZZANA	VR/2	B.1-A-25 + B.1-A-80	* Fognatura Frazione di Azzago: 2°Stralcio	1.340.000	0	300.000	0	-300.000	Ritardi di realizzazione (mancate autorizzazioni/approvazioni)
13	GREZZANA	VR/2	B.1-A-79 + B.4-C-10 Stralcio	* Fognatura Frazione di Orsara	200.000	0	190.000	0	-190.000	Ritardi di realizzazione (mancate autorizzazioni/approvazioni)
14	GREZZANA	VR/2	B.4-C-10d	* Fognatura Frazione di Alcenago - loc. Coda, Vigo, Rupiano	2.500.000	0	100.000	0	-100.000	Ritardi di realizzazione (mancate autorizzazioni/approvazioni)
15	GREZZANA	VR/2	A.2-A-02 Stralcio	Realizzazione nuovo impianto di rilancio acquedotto in Via Asiago Comune di Grezzana	200.000	0	200.000	170.852	-29.148	Ritardi di realizzazione
16	VARI (BOSCO CHIESANUOVA, CERRO VERONESE, ERBEZZO, GREZZANA, SANT'ANNA D'ALFAEDO)	VR/2	D.2-A-08	* Rifacimento del collettore fognario Valpantena	14.000.000	4.030.000	1.060.000	614.737	-445.263	Altro
17	MARANO DI VALPOLICELLA	VR/2	D.2-A-22 + B.4-C-10 Stralcio	Separazione rete fognatura capoluogo e allacciamenti acquedotto nella frazione di Purano	280.000	0	280.000	19.380	-260.620	Ritardi di realizzazione
18	NEGRAR	VR/2	B.1-A-19 + B.1-A-20 + B.4-C-10 Stralcio	*Realizzazione rete fognaria nelle frazioni di Fane e Mazzano e loro collettamento alla rete di Negrar	3.375.000	0	50.000	17.070	-32.930	Altro
19	NEGRAR	VR/2	A.1-A-06 + A.2-A-02	Estensione rete idrica S. Peretto - 2°e 3°Stralci o	472.000	0	280.000	0	-280.000	Altro
20	NEGRAR	VR/2	B.4-C-10 Stralcio	Realizzazione rete fognaria nelle frazioni di Montecchio e Spigamonte e loro collettamento alla rete di Negrar	2.055.750	0	50.000	13.260	-36.740	Altro
21	NEGRAR	VR/2	B.1-C-126	Realizzazione rete fognaria in Via Volpare	95.000	0	95.000	79.733	-15.267	Altro
22	ROVERE' V.SE	VR/2	B.1-C-100	Completamento rete fognaria a servizio del capoluogo e nella frazione di San Rocco di Piegara e San Francesco	300.000	0	40.000	8.700	-31.300	Ritardi di realizzazione
23	SAN GIOVANNI ILARIONE	VR/3	C.2-B-18	Interventi urgenti potabilizzazione acquedotto	150.000	0	0	0	0	
24	SANT'ANNA D'ALFAEDO	VR/2	C.3-A-06	Rifacimento e potenziamento della condotta per l'alimentazione di acqua potabile al paese di S. Anna	975.000	0	140.000	65.076	-74.924	Ritardi di realizzazione (mancate autorizzazioni/approvazioni)
25	SANT'ANNA D'ALFAEDO	VR/2	B.2-C-40 Stralcio	Realizzazione impianto di depurazione e relativa rete a servizio della frazione di Vaggimal	400.000	0	305.500	280.905	-24.595	Altro
26	SANT'ANNA D'ALFAEDO	VR/2	B.2-C-37 + B.1-A-85 + B.1-A-84 Stralcio	Realizzazione rete fognaria nel comune di Sant'Anna d'Alfaedo e zone limitrofe (frazioni Fosse, Ronconi e Vaona)	627.000	627.000	627.000	344.927	-282.073	Ritardi di realizzazione
27	VESTENANOVA	VR/3	A.1-B-24 Stralcio + B.1-B-47 Stralcio	Completamento acquedotto ed adeguamento fognatura in località del capoluogo sprovviste di rete	200.000	0	55.000	9.098	-45.902	Ritardi di realizzazione
28	BELFIORE	VR/3	A.1-C-18 + A.2-C-30 Stralcio	Opere acquedottistiche a tutela quali-quantitativa della falda	2.850.000	1.000.000	150.000	81.300	-68.700	Ritardi di realizzazione

Tab.3 – Interventi specifici

N°PROGRESSIVO INTERVENTO	COMUNE	MACROAREA DI PIANO D'AMBITO	CODICE AATO	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO [€]	IMPORTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO [€]	ANNO 2009 BUDGET APPROVATO DA AATO	INVESTIMENTI REALIZZATI ANNO 2009	DIFFERENZA CONSUNTIVO - BUDGET 2009	CAUSE MANCATA REALIZZAZIONE / ANTICIPO REALIZZAZIONE
29	BELFIORE	VR/3	B.1-C-71	Estensione rete fognaria a zone non servite e collettamento al depuratore di Belfiore	168.000	106.127	50.000	0	-50.000	Altro
30	BUSSOLENGO	VR/2	D.2-A-14	* Rifacimento fognatura in alcune vie del capoluogo	104.841	0	104.841	0	-104.841	Altro
31	BUTTAPIETRA	VR/4	B.4-C-12 Stralcio	* Ristrutturazione delle condotte principali della rete fognaria comunale di Buttapietra	1.500.000	0	81.000	0	-81.000	Ritardi di realizzazione (mancate autorizzazioni/approvazioni)
32	BUTTAPIETRA	VR/4	B.1-C-80a	* Estensione rete fognaria nel comune di Buttapietra - Via Isola della Scala e Via dell'Artigianato	540.437	0	100.000	70.847	-29.153	Ritardi di realizzazione (mancate autorizzazioni/approvazioni)
33	CAZZANO DI TRAMIGNA	VR/3	A.1-B-18 + C.4-C-03	Potenziamento dell'acquedotto del capoluogo ed allacciamento delle contrade Monti, Campiano e Caltrani	400.000	0	380.000	72.750	-307.250	Ritardi di realizzazione
34	MONTECCHIA DI CROSARA	VR/3	B.1-B-75 Stralcio	* Progetto per completamento fognatura consortile 4°lotto E - Vasca di laminazione Montecchia di Crosara_3.900 abitanti attuali (9.600 futuri) (EX LE VALLI)	500.000	0	200.000	71.556	-128.444	Ritardi di realizzazione
35	MONTEFORTE D'ALPONE	VR/3	B.1-B-75 Stralcio	* Progetto per completamento fognatura consortile 4°lotto F - Vasca di laminazione Monteforte d'Alpone_2.900 abitanti attuali (3.200 futuri) (EX LE VALLI)	500.000	0	200.000	71.056	-128.944	Ritardi di realizzazione
36	RONCA'	VR/3	B.1-B-78	* Progetto per completamento fognatura consortile 4°lotto D - Collettore fognario allacciamento Roncà e vasca_2.300 abitanti attuali (2.900 futuri) (EX LE VALLI)	803.700	0	303.700	498.807	-143.593	Ritardi di realizzazione
37	RONCA'	VR/3	B.1-B-77	* Progetto per completamento fognatura consortile 4°lotto C - Collettore fognario allacciamento frazione Terrossa e vasca_1.000 abitanti attuali (2.700 futuri) (EX LE VALLI)	838.700	0	338.700			
38	SAN BONIFACIO	VR/3	D.2-C-35a	* Opere di affinamento e disinfezione scarico al depuratore di S. Bonifacio (EX LE VALLI)	1.500.000	0	400.000	213.369	-186.631	Ritardi di realizzazione
39	MEZZANE DI SOTTO	VR/2		Connessione della rete di Castagnè con la rete di Postuman + nuovi apparati a garanzie delle acque delle sorgenti La Valle e Postuman	400.000		0	0	0	
40	MONTECCHIA DI CROSARA	VR/3	B.1-C-73 + C.4-C-03	Rifacimento Piazza Frutti	210.000	0	210.000	127.551	-82.449	Ritardi di realizzazione
41	MOZZECANE	VR/4	MTZ.2	* Adeguamento del depuratore comunale ai nuovi carichi provenienti dalla rete fognaria di Grezzano e zone limitrofe	850.000	0	230.000	108.564	-121.436	Ritardi di realizzazione
23	MOZZECANE	VR/4	B.1-C-48 Stralcio	* Lavori di realizzazione rete fognaria nella frazione S. Zeno di Mozzecane	150.000	0	150.000	8.683	-141.317	Ritardi di realizzazione
43	NOGAROLE ROCCA	VR/4	B.2-C-17 Stralcio	* Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a Nogarole Rocca e collettori di collegamento reti esistenti	2.620.000	0	500.000	54.656	-445.344	Ritardi di realizzazione (mancate autorizzazioni/approvazioni)
44	PESCANTINA	VR/2	MTZ.2	Interventi urgenti per adeguamento depuratori Tremolè e Settimo	117.000	0	11.116	11.000	-116	Altro
45	PESCANTINA	VR/2	B.1-A-62	* Estensione rete fognaria Ospedaletto e Santa Lucia	1.500.000	0	600.000	722.836	122.836	Anticipi di realizzazione
46	POVEGLIANO	VR/4	D.2-C-13	* Rifacimento fognatura Via Cavour	201.100	0	151.000	136.131	-14.869	Ritardi di realizzazione
47	SAN BONIFACIO	VR/3	B.1-B-76 B.4-C-11 Stralcio	Collettore fognario zona est di alleggerimento della rete di San Bonifacio	2.820.000	1.824.313	100.000	22.717	-77.283	Ritardi di realizzazione (mancate autorizzazioni/approvazioni)
48	SAN BONIFACIO	VR/3	B.4-C-11 Stralcio	* Collettore fognario zona sud, frazioni di Locara, Lobia e Prova	2.100.000	0	100.000	19.565	-80.435	Ritardi di realizzazione (mancate autorizzazioni/approvazioni)
49	SAN BONIFACIO	VR/3	B.4-C-11 Stralcio	* Riqualificazione sistema fognario frazione di Prova	500.000	0	50.000	0	-50.000	Ritardi di realizzazione (mancate autorizzazioni/approvazioni)
50	SAN BONIFACIO	VR/3	B.5-C-03 NC	* Fognature in Corso Venezia - 4°stralcio	310.000	0	291.400	13.260	-278.140	Ritardi di realizzazione (mancate autorizzazioni/approvazioni)
51	SAN BONIFACIO	VR/3	B.5-C-04	* Fognatura Via Colombo - Via Pigafetta	250.000	0	235.000	85.927	-149.073	Ritardi di realizzazione (mancate autorizzazioni/approvazioni)
52	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR/2	A.1-A-11 + B.4-C-10	Realizzazione delle reti acquedotto e fognatura in alcune strade del capoluogo attualmente non servite	1.095.000	0	100.000	44.410	-55.590	Ritardi di realizzazione
53	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR/2	B.1-A-42 + B.1-A-43	* Completamento della rete fognaria nelle Vie: Pacinotti, Apollo XI, Garofoli, Pace Paquara, Porto, Speranza	1.510.000	0	1.010.000	981.607	-28.393	Altro
54	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR/2	D.1-A-02	Ottimizzazione ed ampliamento impianto di depurazione da 24.000 a 50.000 AE	4.950.000	0	280.000	0	-280.000	Ritardi di realizzazione
54b	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR/3	D.1-A-02	* Rifacimento comparto disidratazione fanghi dell'impianto di depurazione	115.960	0	115.960	101.116	-14.844	Altro
55	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR/2	B.1-A-65 B.4-C-10 Stralcio	Realizzazione rete fognaria nella frazione di Mambrotta	770.000	0	77.000	19.981	-57.019	Ritardi di realizzazione (mancate autorizzazioni/approvazioni)

Tab.3 – Interventi specifici

N°PROGRESSIVO INTERVENTO	COMUNE	MACROAREA DI PIANO D'AMBITO	CODICE AATO	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO [€]	IMPORTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO [€]	ANNO 2009 BUDGET APPROVATO DA AATO	INVESTIMENTI REALIZZATI ANNO 2009	DIFFERENZA CONSUNTIVO - BUDGET 2009	CAUSE MANCATA REALIZZAZIONE / ANTICIPO REALIZZAZIONE
56	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR/2	A.1-A-20	Realizzazione acquedotto in località Pignatte	150.000	0	148.365	114.358	-34.007	Altro
57	SAN PIETRO IN CARIANO	VR/2	B.5-C-02	Interventi di miglioramento della rete fognaria comunale 2° stralcio - 2° lotto	315.000	0	50.000	0	-50.000	Altro
58	SAN PIETRO IN CARIANO	VR/2	B.5-C-06 Stralcio	Interventi di miglioramento della rete fognaria comunale: nuovo sfioratore in località Paladon	132.000	0	55.000	5.129	-49.871	Altro
59	SOAVE	VR/3	B.1-B-35 B.4-C-11 Stralcio	Ristrutturazione urgente reti fognatura ed acquedotto di Borgo Covregnino e Borgo San Lorenzo	550.000	0	250.000	128.185	-121.815	Ritardi di realizzazione
60	SOAVE	VR/3	B.1-B-82	* Rifacimento e completamento delle reti di fognatura e acquedotto di C.so Vittorio Emanuele, Via Cangrande e vicoli adiacenti (in concomitanza a intervento su rete gas)	909.728	0	792.664	547.728	-244.936	Ritardi di realizzazione
61	SOMMACAMPAGNA	VR/2	B.4-C-10c	* Lavori all'impianto di depurazione (completamento per lo scarico al suolo)	500.000	0	375.833	352.281	-23.552	Ritardi di realizzazione
62	SOMMACAMPAGNA	VR/2	B.1-C-106	* Realizzazione by-pass del collettore fognario di Sona	620.800	0	300.000	72.033	-227.967	Altro
63	SOMMACAMPAGNA	VR/2	A.1-A-18	Ottimizzazione impianto rilancio acquedotto Sommacampagna e serbatoio Custoza	452.000	0	452.000	96.892	-355.108	Ritardi di realizzazione
64	SONA	VR/2	B.1-C-69b	Opere per adeguamento rete fognaria comunale 2° stralcio	1.330.000	0	30.000	17.291	-12.709	Altro
65	VERONA	VR/2	B.1-A-06a	* Fognatura Via del Pestrino, fraz. Copella e tratti minori in Verona e Comuni limitrofi	1.100.000	0	565.000	281.384	-283.616	Ritardi di realizzazione
66	VERONA	VR/2	D.2-A-13	Interventi urgenti per l'adeguamento del sistema fognario di Veronetta (collettore 8M): 1° stralcio	1.900.000	0	85.000	59.840	-25.160	Altro
67	VERONA	VR/2	B.2-A-20	Studio per potenziamento depuratore Città di Verona e per conversione impianto Phostrip + primi interventi conseguenti	200.000	0	170.000	157.800	-12.200	Altro
68	VERONA	VR/2	B.4-C-15	Adeguamento della rete fognaria di Montorio: 1a fase (intervento urgente per adeguamento sfioratore)	200.000	0	200.000	88.573	-111.427	Ritardi di realizzazione (mancate autorizzazioni/approvazioni)
112	VERONA	VR/2	C.5-A-11	Intervento per risolvere il problema dei depositi di sabbia all'utenza nelle zone di Poiano e S. Michele. (Rete acquedotto Verona)	120.000	0	120.000	116.972	-3.028	Altro
69	VILLAFRANCA DI VERONA	VR/2	D.2-C-33	* Riqualficazione via Quadrato - per fognatura - (considerare solo quota per lav. di fognatura)	579.916	0	154.116	95.580	-58.536	Ritardi di realizzazione
70	VILLAFRANCA DI VERONA	VR/2	B.1-C-115	* Realizzazione rete fognaria in loc. Pozzomoretto	700.000	0	630.000	579.864	-50.136	Ritardi di realizzazione
71	ALBAREDO, ARCOLE, BEVILACQUA, BONAIGO, BOSCHI S.A., COLOGNA V., LEGNAGO, MINERBE, PRESSANA, ROVEREDO, VERONELLA, ZIMELLA	VR/6	A.1-B-06 + A.1-B-05 + A.1-B-04 + A.1-B-27 + A.1-C-48 + A.1-B-08	Interventi per rifacimento rete idrica in Albaredo, Arcole, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S.A., Cologna V., Legnago, Minerbe, Pressana, Roveredo, Veronella, Zimella - 1° Stralcio	1.558.000	1.145.000	1.286.039	1.046.158	-239.881	Altro
72	ALBAREDO, ARCOLE, BONAIGO, BOSCHI S.A., COLOGNA V., LEGNAGO, MINERBE, PRESSANA, ROVEREDO, TERRAZZO, VERONELLA, ZIMELLA	VR/6	A.1-B-06 + A.1-B-05 + A.1-B-27 + A.1-C-48 + A.1-B-08 + A.1-B-03	Interventi per estensione rete idrica in Albaredo, Arcole, Bonavigo, Boschi S.A., Cologna V., Legnago, Minerbe, Pressana, Roveredo, Terrazzo, Veronella, Zimella - 1° Stralcio	1.200.000	0	612.350	746.012	133.662	Anticipi di realizzazione
73	ALBAREDO D'ADIGE	VR/6	A.1-B-06 + B.1-B-08	Realizzazione rete idrica e fognaria in zone sprovviste all'interno del capoluogo	346.500	0	100.000	14.790	-85.210	Ritardi di realizzazione
74	ARCOLE, BEVILACQUA, BONAIGO, BOSCHI S.A., MINERBE, TERRAZZO	VR/6	B.1-B-16 Stralcio	Completamento seconda fase schema fognario consortile (4° lotto)	700.000	700.000	680.668	312.705	-367.963	Ritardi di realizzazione
113	BONAIGO	VR/6	B.1-B-14 Stralcio	Estensione rete fognaria in zone attualmente non servite	150.000	0	150.000	0	-150.000	Altro
114	BOSCHI SANT'ANNA	VR/6	B.4-C-14 Stralcio	Estensione rete fognaria in zone attualmente non servite	300.000	100.000	100.000	0	-100.000	Altro
75	BOVOLONE	VR/5	MTZ.2	Interventi urgenti per adeguamento depuratore	520.000	0	340.981	301.301	-39.680	Ritardi di realizzazione
76	BOVOLONE	VR/5	A.1-C-37	Estensione rete acquedotto a zone non servite e collegamento con la rete di Oppeano - 1° stralcio	350.000	0	13.770	13.770	0	
77	BOVOLONE	VR/5	B.1-C-87	* Estensione e adeguamento rete fognaria nel Comune di Bovolone	1.110.000	0	100.000	0	-100.000	Ritardi di realizzazione (mancate autorizzazioni/approvazioni)
78	CASALEONE	VR/5	B.1-C-49a + B.1-C-88a	* Estensione della rete fognaria	975.000	0	50.000	50.000	0	

Tab.3 – Interventi specifici

N°PROGRESSIVO INTERVENTO	COMUNE	MACROAREA DI PIANO D'AMBITO	CODICE AATO	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO [€]	IMPORTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO [€]	ANNO 2009 BUDGET APPROVATO DA AATO	INVESTIMENTI REALIZZATI ANNO 2009	DIFFERENZA CONSUNTIVO - BUDGET 2009	CAUSE MANCATA REALIZZAZIONE / ANTICIPO REALIZZAZIONE
79	CEREA	VR/5	B.3-C-10	Adeguamento collettore fognatura consortile della linea di Cerea	600.000	0	60.000	1.530	-58.470	Altro
115	CEREA	VR/5	A.1-C-39 + B.1-C-112 Stralcio	Estensione rete idrica e fognaria in zone attualmente prive della rete di distribuzione e per risolvere il problema dell'arsenico nell'acqua	360.000	0	160.000	10.906	-149.094	Ritardi di realizzazione (mancate autorizzazioni/approvazioni)
80	COLOGNA VENETA	VR/6	B.1-B-15b	* Realizzazione fognatura nelle vie Ronchi, Sabbion, Matteotti; Crearo, S. Giustina a Cologna	400.000	0	277.680	351.316	73.636	Anticipi di realizzazione
81	COLOGNA VENETA	VR/6	B.1-B-15	Completamento delle reti di fognatura nelle frazioni di S.Andrea, Spessa e S.Sebastiano di Cologna Veneta e relativi impianti di trattamento	2.000.000	0	90.000	69.400	-20.600	Ritardi di realizzazione
82	COLOGNA VENETA	VR/6	B.1-C-51 Stralcio	Collettamenti fognari al depuratore per il disinquinamento dell'area Fratta-Gorzone	1.170.000					
83	COLOGNA VENETA	VR/6	B.2-B-01 B.2-B-10 Stralcio	Potenziamento ed adeguamento del depuratore di Cologna Veneta per il trattamento dei carichi industriali dell'area Fratta Gorzone	3.057.000	3.000.000	240.000	42.840	-197.160	Ritardi di realizzazione
84	ERBE'	VR/4	MTZ.2	Interventi urgenti per adeguamento depuratore	91.000	0	70.000	13.500	-56.500	Altro
85	GAZZO VERONESE	VR/4	B.1-C-23	* Completamento rete fognaria comunale Via Boschi	320.000					
86	GAZZO VERONESE	VR/4	B.1-C-22	* Completamento rete fognaria comunale Via Porto	325.000	0	390.000	24.480	-365.520	Altro
87	GAZZO VERONESE	VR/4	B.1-C-26	* Completamento rete fognaria comunale Via Buche Levà di sotto	408.000					
88	ISOLA DELLA SCALA	VR/4	MTZ.2	Interventi urgenti per adeguamento depuratore	130.000	0	0	0	0	
89	ISOLA DELLA SCALA	VR/4	B.2-C-05 MTZ.2	Interventi per adeguamento ed ottimizzazione impianto di depurazione	1.100.000	0	200.000	38.556	-161.444	Ritardi di realizzazione
116	ISOLA DELLA SCALA	VR/4	A.1-C-32 Stralcio + B.1-C-82 Stralcio	Realizzazione rete fognaria e acquedottistica in concomitanza alla realizzazione di opere pubbliche	117.000	0	117.000	3.729	-113.271	Ritardi di realizzazione
90	ISOLA RIZZA	VR/4	B.1-C-50a	* Fognature capoluogo	130.000	0	130.000	116.973	-13.027	Ritardi di realizzazione
91	LEGNAGO	VR/6	B.1-B-03a	* Interventi di adeguamento e completamento della rete fognaria in destra Adige - Porto e località Casette	400.000	0	150.000	1.696	-148.304	Ritardi di realizzazione (mancate autorizzazioni/approvazioni)
92	LEGNAGO	VR/6	A.1-B-08	Interventi per risolvere il problema arsenico nell'acqua potabile: completamento rete di distribuzione idrica nel comune di Legnago	4.450.000	0	290.000	73.461	-216.539	Ritardi di realizzazione (mancate autorizzazioni/approvazioni)
93	MINERBE	VR/6	B.1-B-06b	* Fognatura nera area Ovest 2°lotto	725.000	0	500.000	519.840	19.840	Anticipi di realizzazione
94	MINERBE	VR/6	B.1-B-06 Stralcio	Estensione rete fognaria Comune di Minerbe Via Trento, Crosarona e Trieste	400.000	400.000	294.265	284.570	-9.695	Altro
95	NOGARA	VR/4	MTZ.2	Interventi urgenti per adeguamento depuratore	65.000	0	35.000	24.672	-10.328	Altro
96	NOGARA + GAZZO	VR/4	A.1-C-20 Stralcio	Lavori di ripristino della funzionalità degli acquedotti dei comuni di Nogara e Gazzo: 3° Stralcio (CISI)	1.150.000	575.000	1.898.607	1.897.094	-1.513	Altro
97	NOGARA + GAZZO	VR/4	A.1-C-20 Stralcio	Lavori di ripristino della funzionalità degli acquedotti dei comuni di Nogara e Gazzo: 2° Stralcio (CISI)	850.000	425.000				
98	OPPEANO	VR/5	A.1-C-42 + A.2-C-42 Stralcio	Realizzazione nuovi tratti rete acquedotto in zone attualmente sprovviste	1.920.000	0	255.000	271.875	16.875	Anticipi di realizzazione
99	OPPEANO	VR/5	D.1-C-03 Stralcio	Potenziamento depuratore di Feniletto nel comune di Oppeano (Potenziamento del sistema di depurazione nelle zone Feniletto e limitrofe nel Comune di Oppeano)	3.000.000	0	127.000	99.583	-27.417	Altro
100	OPPEANO	VR/5	B.4-C-13a	* Adeguamento e ottimizzazione della stazione di sollevamento fognario di Via Feniletto e degli sfioratori fognari di Via Parini, Corta Rossa e Calzedonia - Cà degli Oppi e Vallese	350.000	0	350.000	284.554	-65.446	Altro
101	SAN PIETRO DI MORUBIO	VR/5	A.1-C-46 Stralcio	Realizzazione rete acquedotto in zona non servita nella frazione di Bonavicina	30.000	0	30.000	17.000	-13.000	Altro
102	SANGUINETTO	VR/5	B.4-C-14a	* 1°INTERVENTO: Ristrutturazione della rete fognari a del Comune di Sanguinetto - Rifacimento del collettore consortile Boschetti. 2°INTERVENTO: Ristrutturazione rete fognaria - realizzazione di una vasca volano nel Comune di Sanguinetto al servizio del co	1.800.000	930.000	1.707.278	1.034.095	-673.183	Ritardi di realizzazione
103	SORGA'	VR/4	B.2-C-20	* Realizzazione del sistema depurativo del capoluogo e delle frazioni di Sorgà	3.926.680	0	370.000	58.485	-311.515	Ritardi di realizzazione
104	TREVENZUOLO	VR/4	B.1-C-121 Stralcio	Interventi per l'adeguamento del depuratore in località Fagnano	300.000	0	0	0	0	
105	VIGASIO	VR/4	B.2-C-07a	* Adeguamento funzionale del depuratore comunale del capoluogo	515.000	0	105.000	104.402	-598	Altro

Tab.3 – Interventi specifici

N°PROGRESSIVO INTERVENTO	COMUNE	MACROAREA DI PIANO D'AMBITO	CODICE AATO	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO [€]	IMPORTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO [€]	ANNO 2009 BUDGET APPROVATO DA AATO	INVESTIMENTI REALIZZATI ANNO 2009	DIFFERENZA CONSUNTIVO - BUDGET 2009	CAUSE MANCATA REALIZZAZIONE / ANTICIPO REALIZZAZIONE
106	VIGASIO	VR/4	B.1-C-86	* Rifacimento linea fognaria Via Villafranca	180.000	0	180.000	8.670	-171.330	Ritardi di realizzazione
107	VILLA BARTOLOMEA	VR/6	B.1-C-94a	* Completamento fognature nel capoluogo - 2° stralcio	385.000	0	331.900	22.020	-309.880	Ritardi di realizzazione (mancate autorizzazioni/approvazioni)
108	VILLA BARTOLOMEA	VR/6	A.1-C-17 Stralcio	Collegamento idrico Legnago-Villa Bartolomea (capoluogo)	1.500.000	800.000	300.000	60.600	-239.400	Ritardi di realizzazione (mancate autorizzazioni/approvazioni)
109	ZEVIO	VR/5	B.2-A-17 Stralcio	Interventi per l'adeguamento del depuratore in località Tre Corone	300.000	0	200.000	198.200	-1.800	Altro
110	ZEVIO	VR/5	B.1-A-05	Ristrutturazione della rete di fognatura comunale - 1° stralcio	483.000	0	483.000	397.540	-85.460	Altro
111	ZEVIO	VR/5	B.1-A-05	Ristrutturazione della rete di fognatura comunale - 4° stralcio	263.000	0	263.000	223.348	-39.652	Altro
TOTALE INTERVENTI ALLEGATO 1.C					113.465.111	17.190.945	29.216.891	17.744.718	-11.472.173	



SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA:
LUNGADIGE GALTAROSSA, 8 - 37133 VERONA
