



2012 Piano Operativo Triennale degli investimenti 2012-2013
Consuntivo al 31.12.2012



INDICE

PREMESSA	2
SEZIONE 1: INVESTIMENTI REALIZZATI NELL'ANNO 2012.....	3
INTERVENTI SULLE INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	4
INTERVENTI DI STRUTTURA	6
SEZIONE 2: RIPARTIZIONE DEGLI INVESTIMENTI NEL TERRITORIO	7
SEZIONE 3: RIPARTIZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO	8
SEZIONE 4: SCOSTAMENTI TRA INVESTIMENTI PIANIFICATI ED INVESTIMENTI REALIZZATI NELL'ANNO 2012	9
INTRODUZIONE	9
ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI.....	10
SEZIONE 5: ULTERIORE CONFRONTO A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEGLI INVESTIMENTI 2012	11
INTRODUZIONE	11
ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI.....	12
SEZIONE 6: FOCUS INTERVENTI SOGGETTI A CONTRIBUTO.....	13
CONTRIBUTI REGIONALI	13
PIANI STRALCIO.....	13
SEZIONE 7: INVESTIMENTI REALIZZATI NEGLI ANNI DI GESTIONE 2007-2012	17
 ALLEGATI	
ALLEGATO 1: DETTAGLIO INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2012 – Confronto con gli investimenti 2012 approvati dall'AATO Veronese in data 20.12.2011	18
ALLEGATO 2: DETTAGLIO INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2012 – Confronto con gli investimenti 2012 approvati dal CdA di Acque Veronesi in data 21.03.2012	35
ALLEGATO 3: SINTESI DEGLI INTERVENTI CONCLUSI NELL'ANNO 2012.....	52

PREMESSA

Il presente documento analizza gli investimenti che Acque Veronesi s.c. a r.l. ha realizzato nel corso dell'esercizio 2012.

Gli obiettivi prefissati per l'anno 2012 sono stati definiti nel Piano Operativo Triennale 2012-2014, approvato con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito dell'AATO Veronese n. 8 del 20 dicembre 2011, e riassunti come segue:


INVESTIMENTI 2012	POT 2012-2014 Approvazione AATO 20.12.2011
MACROCATEGORIE	[€]
Interventi sulle infrastrutture del servizio idrico integrato	21.736.675
Interventi di struttura	409.330
SOMMANO	22.146.005
Di cui	
<i>Contributi Regione Veneto</i>	<i>3.578.127</i>
<i>Contributi "Piano della Montagna"</i>	<i>685.702</i>
<i>di cui allacciamenti + contatori</i>	<i>2.317.623</i>
Investimenti al netto di contributi, allacciamenti e contatori	15.564.553

Per l'anno 2012 sono stati confermati gli interventi già proposti nel precedente Piano 2011-2013 con il relativo investimento annuale già previsto, al quale:

- sono stati sommati gli eventuali slittamenti di quanto programmato e non realizzato nel 2011 (sulla base della stima a finire 2011);
- sono stati sommati alcuni anticipi di quanto già programmato negli anni successivi al 2012 per interventi di fognatura e depurazione strategici al fine del rispetto della Direttiva Comunitaria 91/271/CEE e per interventi che godono di sostegni economici da parte di enti pubblici;
- sono state sottratte le eventuali spese non compatibili con la fattibilità amministrativa e/o tecnica (che tra l'altro rende necessario richiedere la

proroga della scadenza dei contributi regionali previsti per alcuni interventi).

Il territorio interessato dagli investimenti di cui sopra è costituito dai 73 Comuni in cui Acque Veronesi ha gestito il servizio idrico integrato, come rappresenta la seguente figura:

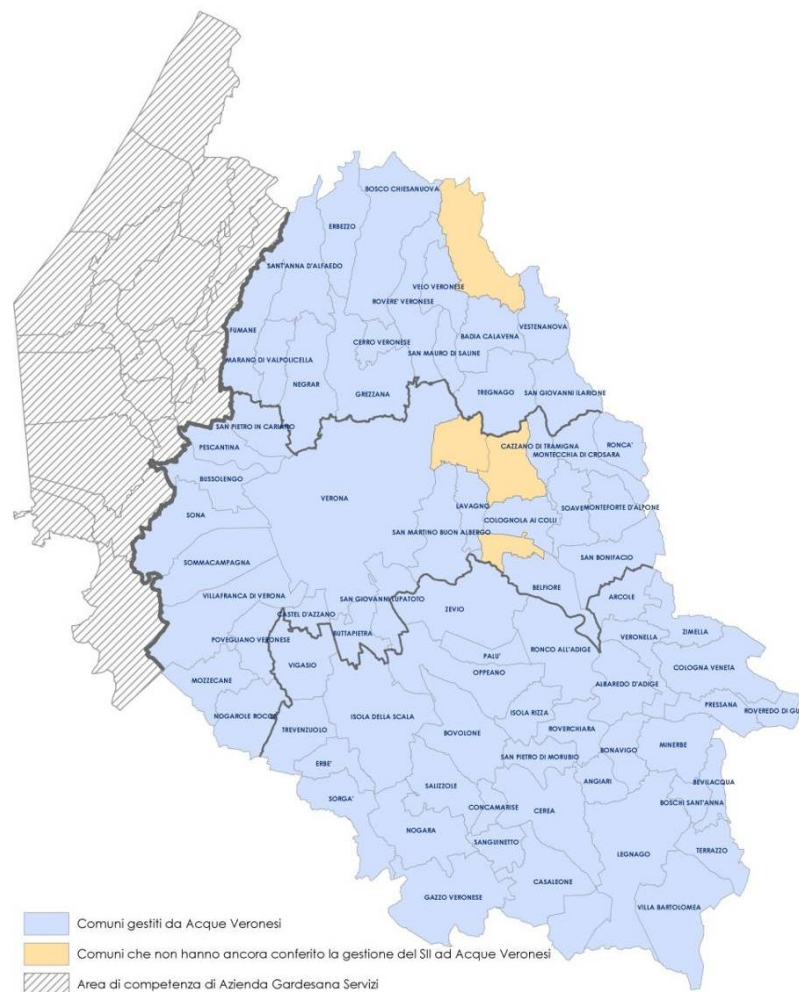

SEZIONE 1: INVESTIMENTI REALIZZATI NELL'ANNO 2012


Nel corso del 2012, Acque Veronesi ha realizzato investimenti per circa 11,7¹ milioni di Euro che possono essere ricondotti a due macro categorie:

Interventi sulle infrastrutture del servizio idrico integrato: sono prevalentemente interventi afferenti ai singoli Comuni gestiti dalla società, necessari per la realizzazione/ristrutturazione di nuovi acquedotti e/o sistemi di fognatura e depurazione. Questa categoria include altresì una serie di opere che contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza, efficacia, efficienza ed economicità del servizio idrico integrato (adeguamenti e manutenzioni straordinarie, telecontrollo, etc...). Gli investimenti sulle infrastrutture gestite sono accorpabili sulla base della tipologia di servizio cui si riferiscono e delle criticità indicate nel Piano d'Ambito.

Interventi di struttura: hanno riguardato principalmente interventi strutturali e gestionali per la realizzazione della cartografia, l'attività di ricerca perdite, l'implementazione di sistemi informativi. Per la maggior parte hanno costituito il proseguimento di quelli già inseriti nel Piano Operativo Triennale (POT) 2011-2013, e risultano indispensabili per un efficace ed efficiente funzionamento della Società.

INVESTIMENTI 2012	CONSUNTIVO AL 31.12.2012
MACROCATEGORIE	[€]
Interventi sulle infrastrutture del S.I.I.	11.240.620
Interventi di struttura	474.696
SOMMANO	11.715.316
Di cui	
<i>Contributi Regione Veneto</i>	<i>3.078.127</i>
<i>Contributi "Piano della Montagna"</i>	<i>472.587</i>
<i>di cui allacciamenti + contatori</i>	<i>1.807.228</i>
Investimenti al netto di contributi, allacciamenti e contatori	6.357.373

L'aerogramma seguente evidenzia il rapporto tra gli investimenti sulle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato rispetto a quelli stanziati per far fronte alle esigenze di struttura; allo stesso tempo viene messa in luce la predominanza, all'interno degli investimenti sulle infrastrutture, degli interventi dedicati al servizio di fognatura e depurazione rispetto a quelli di acquedotto (in conformità agli indirizzi programmatici dell'AATO Veronese):



¹ Includono 76.290€ stornati a commesse da rifattare, gli investimenti complessivi netti ammontano quindi a €11,6 milioni.

Figura 1 - Ripartizione investimenti realizzati nell'anno 2012

INTERVENTI SULLE INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Sono stati eseguiti interventi per un totale di circa 11,2 milioni di Euro riepilogabili, sulla base delle categorie di criticità descritte nel Piano d'Ambito dell'AATO Veronese approvato con Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 6 del 20 dicembre 2011, come segue:

A. Investimenti per garantire l'efficacia servizio acquedotto:

- l'estensione delle reti di acquedotto;
- il potenziamento dei sistemi di adduzione e l'interconnessione tra acquedotti locali e fonti;
- la ricerca e l'attivazione di nuove fonti di approvvigionamento.

B. Investimenti per garantire l'efficacia del servizio fognatura e depurazione e prevenire danni all'ambiente:

- l'estensione delle reti fognarie;
- l'aumento della potenzialità del servizio depurazione per agglomerati con carico inquinante superiore a 2.000 AE;
- l'aumento della potenzialità del servizio depurazione per agglomerati con carico inquinante inferiore a 2.000 AE;
- la razionalizzazione dei sistemi di sfioro;
- la riabilitazione dei collettori e delle reti di raccolta ammalorate.

C. Investimenti per garantire l'efficienza del servizio acquedotto:

- il potenziamento dei serbatoi;
- l'attivazione di nuove fonti di captazione e/o l'interconnessione tra acquedotti limitrofi;
- la realizzazione di nuove condotte di adduzione ed il potenziamento delle reti di distribuzione;
- la riabilitazione delle reti di distribuzione ammalorate.

D. Investimenti per garantire l'efficienza del servizio fognatura depurazione:

- la centralizzazione dei trattamenti depurativi;

- la manutenzione straordinaria delle reti (e/o degli impianti di depurazione e/o degli impianti di sollevamento).

E. Investimenti per il recupero di efficienza nel servizio acquedotto:

- la realizzazione di sistemi di telecontrollo;
- l'attivazione di sistemi di monitoraggio, controllo e modellazione delle reti acquedottistiche.

F. Investimenti per il recupero di efficienza nei servizi di fognatura e depurazione:

- Il rilevamento in campo delle infrastrutture acquedottistiche, l'implementazione e l'aggiornamento del sistema informativo territoriale per l'analisi funzionale delle opere;
- la realizzazione dei sistemi di telecontrollo degli impianti di sollevamento;
- la realizzazione dei sistemi di telecontrollo degli impianti di depurazione;
- l'attivazione di sistemi di monitoraggio, controllo e modellazione dei sistemi fognari.

Nello specifico, sono stati realizzati 60 progetti di cui:

16 Analisi di Fattibilità

10 Progetti Preliminari

4 Progetti Preliminari/Definitivi

4 Progetti Definitivi

14 Progetti Definitivo-Esecutivo

12 Progetti Esecutivi

Sono, inoltre, proseguiti i lavori già avviati e/o già contrattualizzati per un totale di 66 cantieri di cui 43 conclusi nel corso del 2012.

A questi sottogruppi vanno ad aggiungersi i lavori connessi e/o accessori al servizio idrico integrato per i quali non è prevista copertura tariffaria, ovvero:

- allacciamenti indenticati dal “**GRUPPO T.1**” che riguardano l’acquisto di contatori e la loro installazione in caso di allacciamento delle nuove utenze ai servizi di distribuzione dell’acqua potabile e collettamento dei reflui (investimenti coperti dal contributo degli utenti);
- interventi relativi ad opere non ricomprese nel servizio idrico integrato, indenticati dal “**GRUPPO T.2**” che consistono nella realizzazione di lavori relativi a servizi non compresi nel Servizio Idrico Integrato ma connessi e/o accessori, per i quali non è prevista copertura tariffaria.

CATEGORIE	INVESTIMENTI 2012 [€]
ACQUEDOTTO	1.692.495
<i>A. Investimenti per garantire l'efficacia servizio acquedotto</i>	432.584
<i>C. Investimenti per garantire l'efficienza del servizio acquedotto</i>	1.197.053
<i>E. Investimenti per il recupero di efficienza nel servizio acquedotto</i>	62.858
FOGNATURA / DEPURAZIONE	7.740.897
<i>B. Investimenti per garantire l'efficacia del servizio fognatura e depurazione e prevenire danni all'ambiente</i>	4.966.604
<i>D. Investimenti per garantire l'efficienza del servizio fognatura depurazione</i>	2.705.104
<i>F. Investimenti per il recupero di efficienza nei servizi di fognatura e depurazione</i>	69.188
NON TARIFFATI	1.807.228
SOMMANO	11.240.620

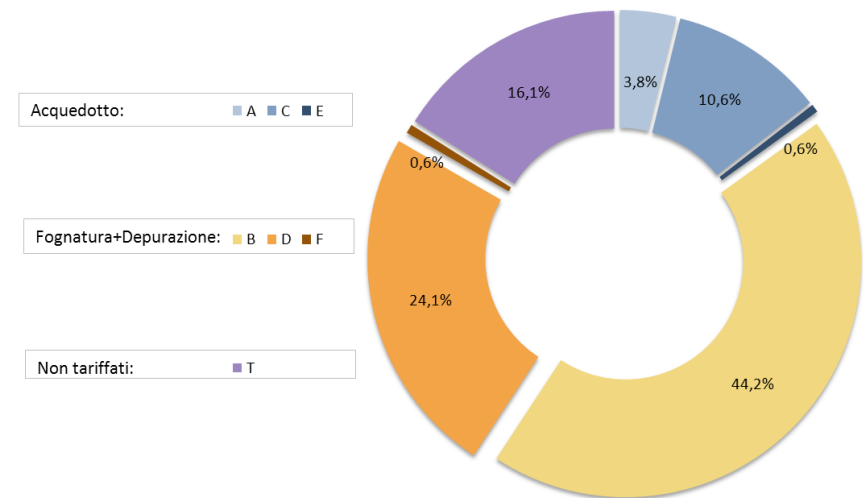


Figura 2 - Investimenti realizzati nel 2012 sulle infrastrutture del S.I.I

INTERVENTI DI STRUTTURA

In riferimento alle necessità relative ad efficacia ed efficienza di funzionamento della società, sono stati realizzati investimenti per circa 0,5 milioni di Euro destinati a:

- Qualità Ambiente e Sicurezza;
- Studi dei sistemi acquedottistici, fognari e depurativi connessi all'ottimizzazione degli investimenti, all'ottimizzazione della gestione del servizio, ed ai rischi igienico-sanitari e ambientali;
- Sistemi informativi;
- Implementazione e sostituzione strumentazione laboratorio analisi per controllo qualità del prodotto;
- Adeguamento Strutture e Arredi per sede centrale e sedi periferiche;
- Acquisto attrezzature per le squadre operative.

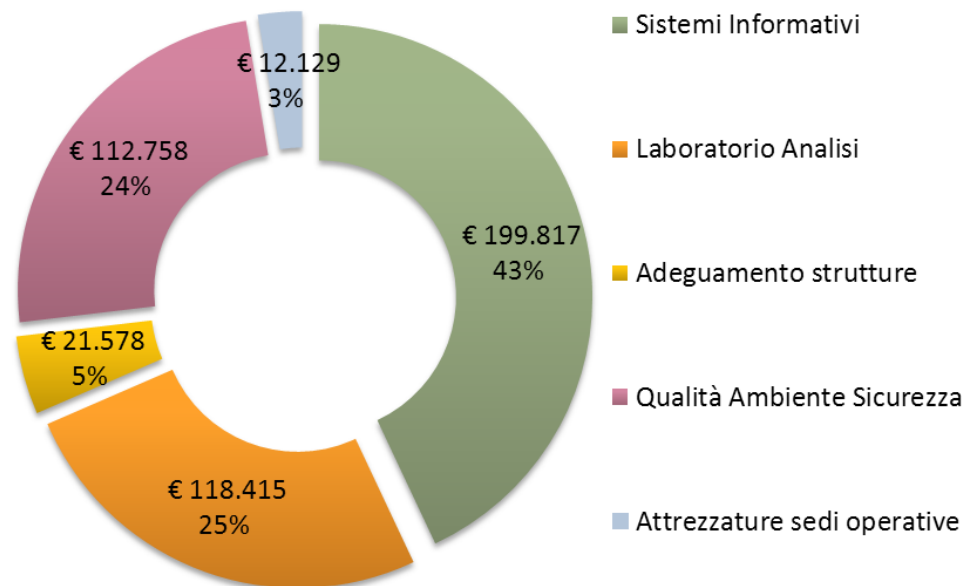


Figura 3 - Investimenti di struttura realizzati nel 2012

SEZIONE 2: RIPARTIZIONE DEGLI INVESTIMENTI NEL TERRITORIO

La distribuzione sul territorio delle opere realizzate da Acque Veronesi si può riferire ai tre distretti operativi Montano, Pedemontano e Pianura, cui afferiscono i 73 comuni gestiti.

Oltre agli interventi riconducibili direttamente ai tre distretti, gli investimenti 2012 di Acque Veronesi hanno interessato anche:

“più distretti” ovvero i lavori su infrastrutture a servizio dei Comuni appartenenti a più distretti quali, ad esempio, la realizzazione di depuratori consortili, di condotte acquedottistiche e di collettori fognari;

“struttura” ovvero gli investimenti non direttamente riconducibili ai singoli Comuni in quanto necessari al funzionamento della società, quali l’implementazione di sistemi informativi e gestionali, la messa a punto del sistema di telecontrollo, la ricerca di perdite e la realizzazione del sistema cartografico digitale;

“allacciamenti” sono gli investimenti riconducibili alla realizzazione di allacciamenti delle utenze alle reti pubbliche di acquedotto e fognatura.

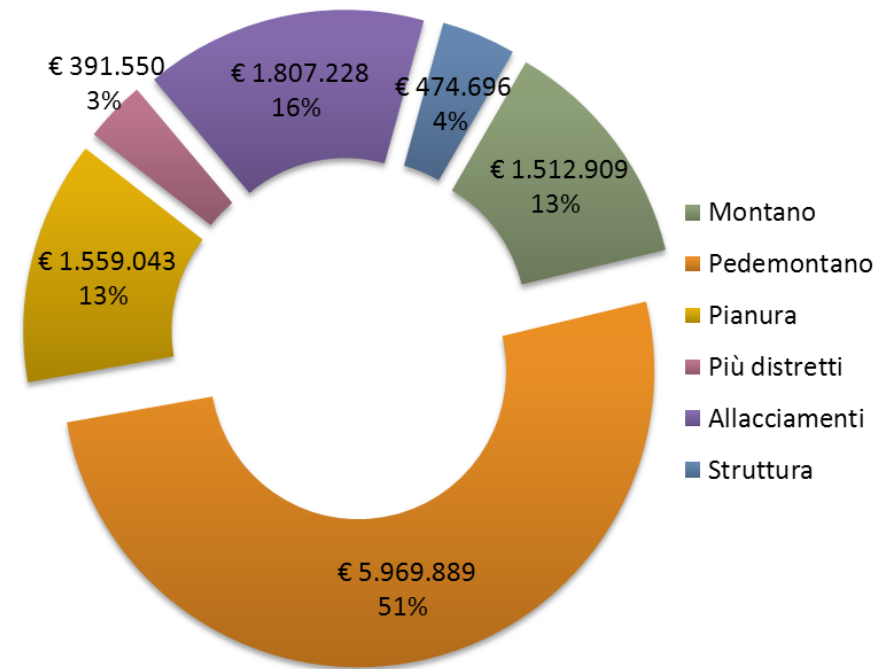


Figura 4 - Investimenti realizzati nel 2012 suddivisi per distretto

SEZIONE 3: RIPARTIZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO

Gli investimenti 2012 di Acque Veronesi possono esser ricondotti alle seguenti tipologie di servizio:

“acquedotto”: interventi per il rifacimento e/o la realizzazione di reti ed impianti per il trasporto e la distribuzione di acqua potabile nei Comuni gestiti;

“fognatura”: interventi per il rifacimento e/o la realizzazione di reti ed impianti per il collettamento dei reflui urbani dei Comuni gestiti;

“depurazione”: interventi inerenti adeguamento, ampliamento o costruzione di impianti di depurazione;

“più servizi”: interventi per rifacimento, adeguamento, ampliamento o realizzazione di infrastrutture per il Servizio Idrico Integrato riconducibili a più di uno dei servizi sopracitati;

“servizi per la gestione”: interventi necessari per il funzionamento della Società, quali l’implementazione di sistemi informativi e gestionali, studi e consulenze, acquisto strumentazioni e apparecchiature per centrale di controllo e laboratorio;

“allacciamenti”: relativi alle richieste di allacciamento alle reti pubbliche di acquedotto e fognatura da parte delle utenze attualmente non servite.

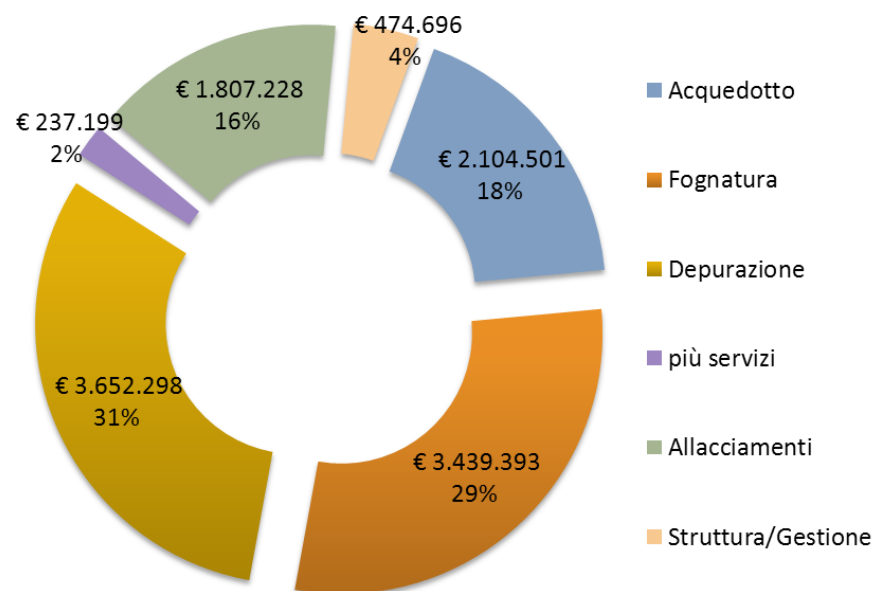



Figura 5 - Investimenti realizzati nel 2012 suddivisi per servizio

SEZIONE 4: SCOSTAMENTI TRA INVESTIMENTI PIANIFICATI ED INVESTIMENTI REALIZZATI NELL'ANNO 2012

INTRODUZIONE

Il riepilogo della situazione degli investimenti di Acque Veronesi, riportato nella tabella sottostante, evidenzia la quota degli investimenti realizzati nel 2012 a confronto con il relativo budget approvato dall'AATO Veronese.

INVESTIMENTI 2012	Approvazione AATO n.8 del 20.12.2011 [€]	Investimenti realizzati al 31.12.2012 [€]	SCOSTAMENTO [€] / [%]	
Interventi sulle infrastrutture acquedotto/fognatura/depurazione	21.736.675	11.240.620	- 10.496.055	-48%
Interventi di struttura	409.330	474.696	65.366	16%
	22.146.005	11.715.316	- 10.430.689	-47%
<i>DI CUI:</i>				
Contributi Regione Veneto	3.578.127	3.078.127	-500.000	-14%
Interventi relativi al "Piano della Montagna"	685.702	472.587	-213.115	-31%
Interventi relativi ad allacciamenti	2.317.623	1.807.228	-510.395	-22%
	6.581.452	5.357.942	-1.223.510	-19%
TOTALE INVESTIMENTI TARIFFATI	15.564.553	6.357.373	-9.207.180	-59%

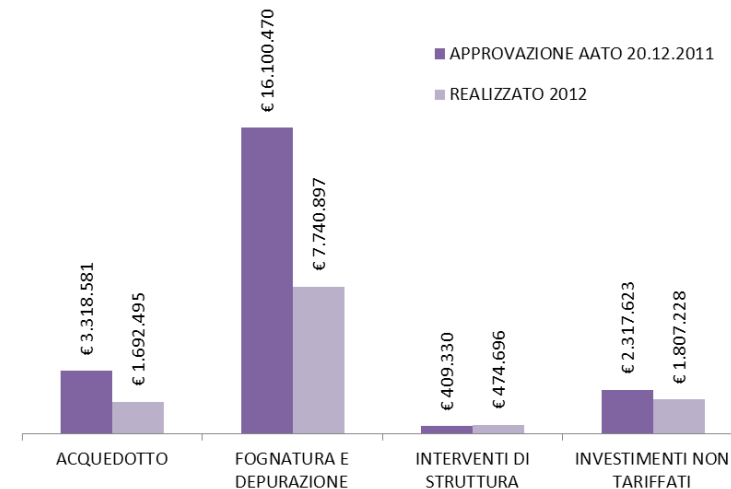


Le cause dello scostamento tra gli investimenti previsti nel Piano Operativo approvato dall'AATO Veronese e quelli effettivamente realizzati sono brevemente descritte nel paragrafo seguente e maggiormente dettagliate, per ciascun intervento, nell'allegato 1 alla presente relazione.

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

SERVIZIO	SCOSTAMENTI COMPLESSIVI		MAGGIORI SPESE	MINORI SPESE
	[€]	[%]	[€]	[€]
ACQUEDOTTO	-1.687.871	-51%	489.223	-2.177.094
FOGNATURA E DEPURAZIONE	-8.297.789	-52%	1.222.367	-9.520.157
INTERVENTI DI STRUTTURA	65.366	16%	170.060	-104.694
INVESTIMENTI NON TARIFFATI	-510.395	-22%	-	-510.395
	-10.430.689	-47%	1.881.650	-12.312.339


Le cause di maggiori spese possono essere raggruppate nelle seguenti categorie:

- anticipi su cronoprogramma di realizzazione;
- interventi straordinari per emergenze;
- variazione del budget annuale (nel rispetto della pianificazione triennale approvata dall'AATO);
- adeguamento post consuntivo 2011.

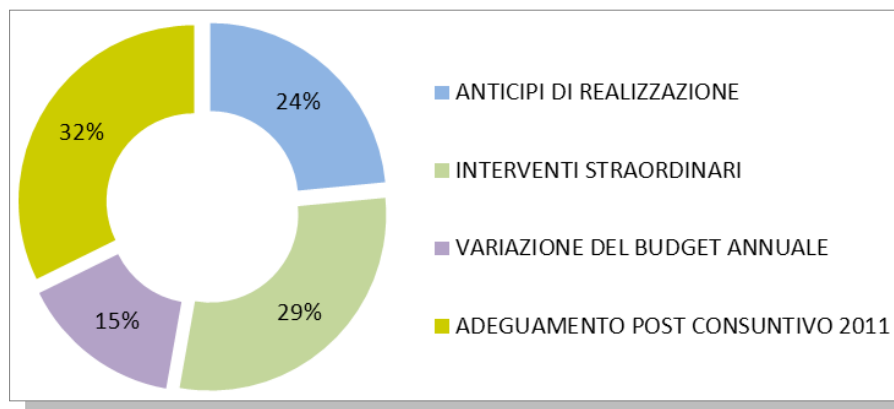

Le cause invece di minori spese rispetto gli investimenti previsti per l'anno 2012 includono:

- ritardi su cronoprogramma di realizzazione (condizioni metereologiche avverse nei luoghi di cantiere, etc...);
- mancate approvazioni/autorizzazioni (complessità procedurali per ottenere pareri, concessioni, autorizzazioni, approvazioni da enti terzi, allungamento dei tempi delle procedure espropriative...);
- risparmi (certi o da confermare in caso di lavori non conclusi);
- sospensione dell'investimento (in attesa della concessione dei finanziamenti da parte degli istituti di credito);
- adeguamento post consuntivo 2011.

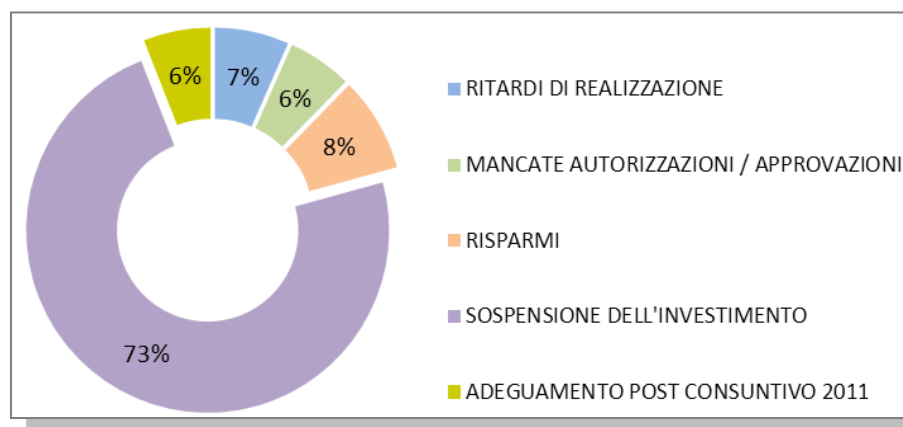




SEZIONE 5: ULTERIORE CONFRONTO A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DEGLI INVESTIMENTI 2012

INTRODUZIONE

A conclusione del primo trimestre 2012, in attesa della concessione dei finanziamenti da parte degli istituti di credito, gli interventi programmati sono stati sospesi a meno di quelli aventi impegni contrattualizzati verso fornitori esterni e di quelli aventi carattere di urgenza; in data 21.03.2012 il CdA di Acque Veronesi ha autorizzato l'avvio dei seguenti investimenti:

INVESTIMENTI 2012	Revisione CdA 21.03.2012 [€]	Investimenti realizzati al 31.12.2012 [€]	SCOSTAMENTO [€] / [%]	
Interventi sulle infrastrutture acquedotto/fognatura/depurazione	11.809.965	11.240.620	-569.345	-5%
Interventi di struttura	455.035	474.696	19.661	4%
	12.265.000	11.715.316	-549.684	-4%
<i>DI CUI:</i>				
Contributi Regione Veneto	3.578.127	3.078.127	-500.000	-14%
Interventi relativi al "Piano della Montagna"	515.014	472.587	-42.427	-8%
Interventi relativi ad allacciamenti	2.317.623	1.807.228	-510.395	-22%
	6.410.764	5.357.942	-1.052.822	-16%
TOTALE INVESTIMENTI TARIFFATI	5.854.236	6.357.373	503.138	9%

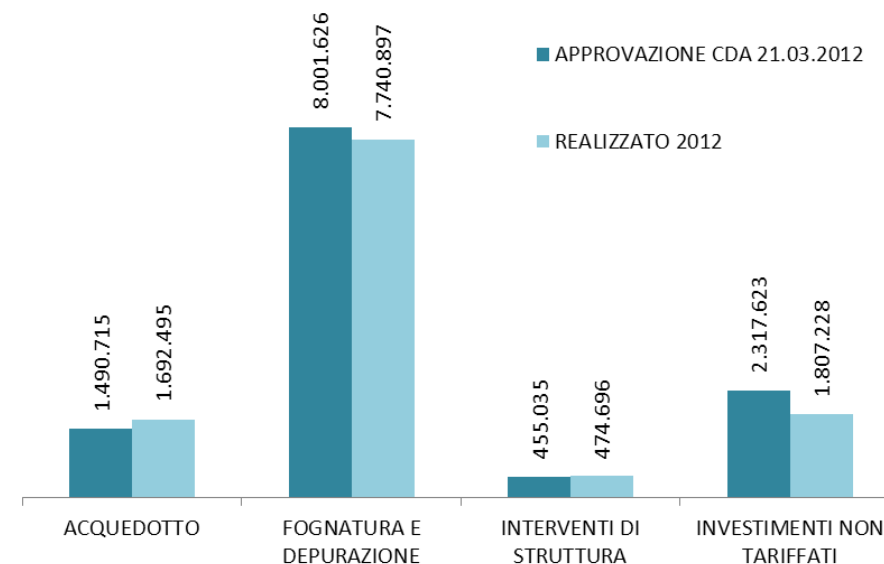

Le cause dello scostamento tra gli investimenti previsti nel Piano Operativo approvato dall'AATO Veronese e quelli effettivamente realizzati sono brevemente descritte nel paragrafo seguente e maggiormente dettagliate, per ciascun intervento, nell'allegato 2 alla presente relazione.


ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

La comparazione tra gli investimenti realizzati e quelli previsti nel Piano Operativo per l'anno 2012 revisionato in data 21.03.2012 evidenzia complessivamente la seguente situazione:

SERVIZIO	SCOSTAMENTI COMPLESSIVI		MAGGIORI SPESE	MINORI SPESE
	[€]	[%]	[€]	[€]
ACQUEDOTTO	270.005	18%	933.327	-663.322
FOGNATURA E DEPURAZIONE	-328.955	-4%	1.603.433	-1.932.387
INTERVENTI DI STRUTTURA	19.661	4%	77.113	-57.452
INVESTIMENTI NON TARIFFATI	-510.395	-22%	-	-510.395
	-549.684	-4%	2.613.872	-3.163.556


Le maggiori spese possono essere raggruppate nelle seguenti categorie:

- anticipi su cronoprogramma di realizzazione;
- interventi straordinari per emergenze;
- variazione del budget annuale (nel rispetto della pianificazione triennale approvata dall'AATO);
- adeguamento post consuntivo 2011.

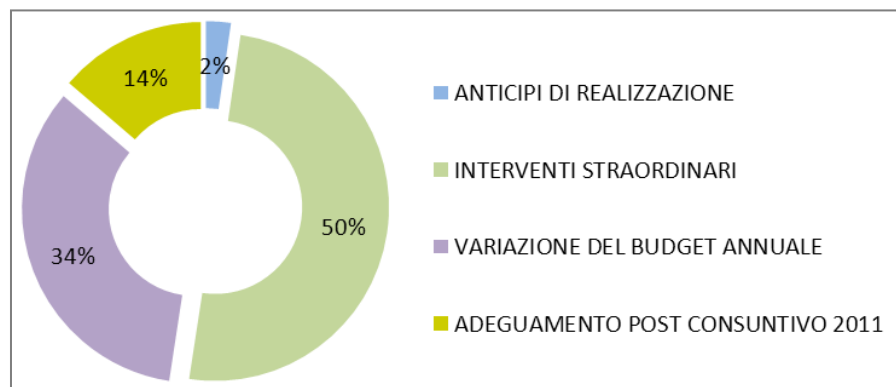

Le cause invece di minori spese rispetto gli investimenti previsti per l'anno 2012 includono:

- ritardi su cronoprogramma di realizzazione (condizioni metereologiche avverse nei luoghi di cantiere, etc...);
- mancate approvazioni/autorizzazioni (complessità procedurali per ottenere pareri, concessioni, autorizzazioni, approvazioni da enti terzi, allungamento dei tempi delle procedure espropriative...);
- risparmi (certi o da confermare in caso di lavori non conclusi);
- variazione del budget annuale (nel rispetto della pianificazione triennale approvata dall'AATO);
- adeguamento post consuntivo 2011.

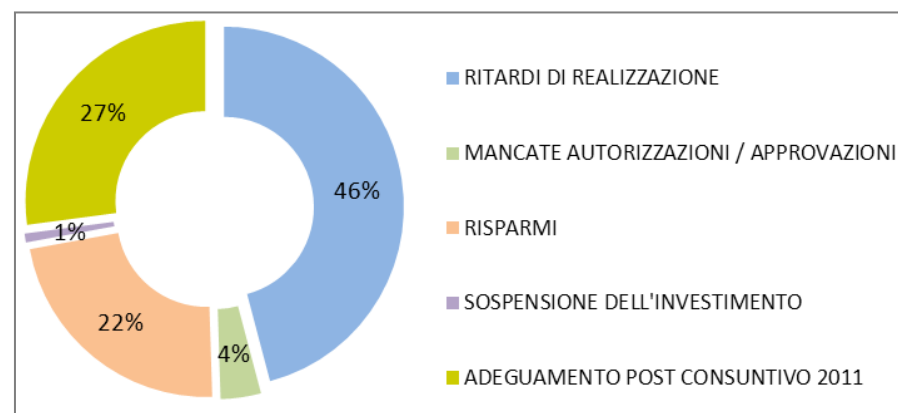



SEZIONE 6: FOCUS INTERVENTI SOGGETTI A CONTRIBUTO

CONTRIBUTI REGIONALI

Nel corso dell'anno, la Regione Veneto:

- ha stanziato, con DGR n.2879 del 28.12.2012, un contributo di € 33.000 a favore di Acque Veronesi per l'intervento di *"Completamento ed adeguamento rete fognaria in via Verdi nel comune di San Giovanni Ilarione"*;
- ha preso atto della conclusione dei lavori dei seguenti interventi soggetti a contributo regionale (riconoscendo nel contempo l'entità del contributo definitivo):
 - *"Realizzazione rete fognaria nel comune di Sant'Anna d'Alfaedo e zone limitrofe (frazioni Fosse, Ronconi e Vaona)"* - costo complessivo pari ad €624.655,38 - entità del contributo definitivo pari a €624.644,38 (Decreto n. 502 del 15.10.2012);
 - *"Estensione rete fognaria a zone non servite e collettamento al depuratore di Belfiore"* - costo complessivo pari ad €134.847,61 - entità del contributo definitivo pari a €106.127,00 (Decreto n. 129 del 31.07.2012);
 - *"Opere di rifacimento e razionalizzazione reti di distribuzione idrica comunali del territorio del basso Fratta Gorzone (Comuni ex CISIAG)"* - costo complessivo pari ad €1.819.734,23 - entità del contributo definitivo pari a €1.145.000,00 (Decreto n. 175 del 13.09.2012);
 - *"Lavori per la realizzazione delle strutture di fognatura e depurazione delle acque reflue nei comuni di Arcole, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Minerbe, Terrazzo – 4°lotto esecutivo"* - costo complessivo pari ad €670.608,39 - entità del contributo definitivo pari a €670.608,39 (Decreto n. 90 del 28.05.2012);

- *"Rifacimento rete fognaria nel territorio comunale di Sanguinetto"* - costo complessivo pari ad €613.600,88 - entità del contributo definitivo pari a €430.000,00 (Decreto n. 213 del 27.04.2011).

PIANI STRALCIO

Con riferimento alle opere inserite nella deliberazione dell'AATO Veronese n.7 del 17 febbraio 2011 (rideterminazione dei sostegni economici alla realizzazione degli interventi urgenti di fognatura e depurazione), si riporta l'elenco di riepilogo degli investimenti realizzati fino al 31.12.2012:



COMUNE	CODICE AATO	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO [€]	IMPORTO GIA' SPESO ANNI PRECEDENTI [€]	INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2012 [€]
BOVOLONE	B.2 - 29	* Estensione e adeguamento rete fognaria nel Comune di Bovolone	1.110.000	18.840	-
BUSSOLENGO	D.2 - 08	* Rifacimento fognatura in alcune vie del capoluogo	104.841	-	9.412
BUTTAPIETRA	D.2 - 44	* Ristrutturazione delle condotte principali della rete fognaria comunale di Buttapietra	1.500.000	69.870	-
BUTTAPIETRA	B.1 - 191	* Estensione rete fognaria nel comune di Buttapietra - Via Isola della Scala e Via dell'Artigianato	540.437	70.847	19.788
CASALEONE	B.1 - 175	* Estensione della rete fognaria	975.000	82.654	-
CERRO VERONESE	B.1 - 155	* Estensione e rifacimento della rete fognaria: 1a fase (progetto e primi interventi urgenti sulla rete del capoluogo)	250.000	226.721	-
COLOGNA VENETA	B.1 - 194	* Realizzazione fognatura nelle vie Ronchi, Sabbion, Matteotti; Crearo, S. Giustina a Cologna	400.000	389.454	-
GAZZO VERONESE	B.1 - 129 B.1 - 130 B.1 - 133	* Completamento rete fognaria comunale: - via Boschi (353.000€) - via Porto (300.000€) - via Buche Levà di sotto (400.000€)	1.053.000	68.630	-
GREZZANA	B.1 - 16	* Fognatura Frazione di Azzago: 2° Stralcio	1.340.000	59.479	-
GREZZANA	B.1 - 39	* Fognatura Frazione di Orsara	200.000	7.468	121.777
GREZZANA	B.1 - 238	* Fognatura Frazione di Alcenago - loc. Coda, Vigo, Rupiano	2.500.000	91.757	-
ISOLA RIZZA	B.1 - 145	* Fognature capoluogo	130.000	129.018	-
LEGNAGO	B.1 - 203	* Interventi di adeguamento e completamento della rete fognaria in destra Adige - Porto e località Casette	400.000	19.890	-
MINERBE	B.1 - 55	* Fognatura nera area Ovest 2° lotto	725.000	724.447	-
MONTECCHIA DI CROSARA	B.4 - 07	* Progetto per completamento fognatura consortile 4° lotto E - Vasca di laminazione Montecchia di Crosara_3.900 abitanti attuali (9.600 futuri)	500.000	445.825	20.685
MONTEFORTE D'ALPONE	B.5 - 17	* Progetto per completamento fognatura consortile 4° lotto F - Vasca di laminazione Monteforte d'Alpone_2.900 abitanti attuali (3.200 futuri)	500.000	446.446	32.467
MOZZECANE	B.2 - 44	* Adeguamento del depuratore comunale ai nuovi carichi provenienti dalla rete fognaria di Grezzano e zone limitrofe	850.000	194.063	6.422
MOZZECANE	B.1 - 143	* Lavori di realizzazione rete fognaria nella frazione S. Zeno di Mozzecane	150.000	144.742	-
NOGAROLE ROCCA	B.2 - 38	* Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a Nogarole Rocca e collettori di collegamento reti esistenti: impianto di depurazione	2.110.000	101.158	1.387.036
NOGAROLE ROCCA	B.2 - 38	* Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a Nogarole Rocca e collettori di collegamento reti esistenti: condotte di collegamento	510.000	341.350	121.206
OPPEANO	B.1 - 177	* Adeguamento e ottimizzazione della rete fognaria	350.000	325.496	-
PESCANTINA	B.1 - 177	* Estensione rete fognaria Ospedaletto e Santa Lucia	1.500.000	1.493.127	-



COMUNE	CODICE AATO	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO [€]	IMPORTO GIA' SPESO ANNI PRECEDENTI [€]	INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2012 [€]
POVEGLIANO	B.1 - 31	* Rifacimento fognatura Via Cavour	201.100	201.038	-
RONCA'	B.1 - 94 B.1 - 95	* Progetto per completamento fognatura consortile: 4°lotto C - Collettore fognario allacciamento frazione Terrossa e vasca_1.000 abitanti attuali (2.700 futuri - 803.700€) 4°lotto D - Collettore fognario allacciamento Roncà e vasca_2.300 abitanti attuali (2.900 futuri - 838.700€)	1.642.400	1.489.747	10.931
SAN BONIFACIO	B.5 - 24	* Opere di affinamento e disinfezione scarico al depuratore di S. Bonifacio: pretrattamenti + trattamenti terziari	1.500.000	493.054	492.738
SAN BONIFACIO	D.2 - 18	* Collettore fognario zona sud di alleggerimento della rete di San Bonifacio, frazioni di Locare, Lobia e Prova	2.100.000	19.565	-
SAN BONIFACIO	B.5 - 25	* Riquilificazione sistema fognario frazione di Prova	500.000	-	-
SAN BONIFACIO	B.5 - 12	* Fognature in Corso Venezia - 4° stralcio	245.000	124.603	-
SAN BONIFACIO	B.5 - 24	* Fognatura Via Colombo - Via Pigafetta	250.000	212.626	-
SAN GIOVANNI LUPATOTO	B.1 - 23 B.1 - 24 B.1 - 224	* Completamento della rete fognaria nelle Vie: Pacinotti, Apollo XI, Garofoli, Pace Paquara, Porto, Speranza	1.510.000	1.206.090	-
SAN GIOVANNI LUPATOTO	B.2 - 46	* Rifacimento comparto disidratazione fanghi dell'impianto di depurazione	260.000	237.819	-
SANGUINETTO	B.4 - 14	* 1°INTERVENTO: Ristrutturazione della rete fognaria del Comune di Sanguinetto - Rifacimento del collettore consortile Boschetti. 2°INTERVENTO: Ristrutturazione rete fognaria - realizzazione di una vasca volano nel Comune di Sanguinetto al servizio del collettore fognario consortile dei comuni ex CO.GE.FO	1.800.000	1.754.692	31
SOAVE	B.1 - 77	* Rifacimento e completamento delle reti di fognatura e acquedotto di C.so Vittorio Emanuele, Via Cangrande e vicoli adiacenti (in concomitanza a intervento su rete gas)	909.728	798.301	-
SOMMACAMPAGNA	B.2 - 23	* Lavori all'impianto di depurazione (completamento per lo scarico al suolo)	500.000	499.853	-
SOMMACAMPAGNA	B.1 - 43	* Realizzazione by-pass del collettore fognario di Sona	620.800	138.563	-
SORGA'	B.2 - 39 B.1 - 172	* Realizzazione impianto di depurazione di Sorgà e reti di collettamento	3.414.940	74.151	-
SORGA'	B.2 - 39	* Realizzazione impianto di depurazione di Bonferraro e reti di collettamento	1.638.000	-	-
VERONA	B.1 - 04	* Fognatura Via del Pestrino, fraz. Copella e tratti minori in Verona e Comuni limitrofi	1.100.000	759.993	3.786
VERONA	B.2 - 07	* Depuratore "Città di Verona": interventi urgenti per adeguamento	600.000	574.896	-
VIGASIO	D.2 - 35 D.2 - 42	* Adeguamento funzionale del depuratore comunale del capoluogo	515.000	170.518	-
VIGASIO	D.2 - 30	* Rifacimento linea fognaria Via Villafranca	180.000	143.698	-
VILLA BARTOLOMEA	B.1 - 181	* Completamento fognature nel capoluogo - 2° stralcio	385.000	22.020	-




COMUNE	CODICE AATO	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO [€]	IMPORTO GIA' SPESO ANNI PRECEDENTI [€]	INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2012 [€]
VILLAFRANCA DI VERONA	B.1 - 237	* Riqualificazione via Quadrato - per fognatura - (considerare solo quota per lav. di fognatura)	579.916	574.152	-
VILLAFRANCA DI VERONA	B.1 - 237	* Realizzazione rete fognaria in loc. Pozzomoreto	700.000	633.436	-
PIU' COMUNI ²	B.5 - 19	* Rifacimento del collettore fognario Valpantena	14.000.000	758.362	252.933
		SOMMANO	52.850.161	16.338.457	2.434.121

² BOSCO CHIESANUOVA, CERRO VERONESE, ERBEZZO, GREZZANA, SANT'ANNA D'ALFAEDO




SEZIONE 7: INVESTIMENTI REALIZZATI NEGLI ANNI DI GESTIONE 2007-2012

Acque Veronesi ha complessivamente realizzato 92,3 milioni di Euro di investimenti negli anni di gestione 2007-2012, come di seguito riepilogato:

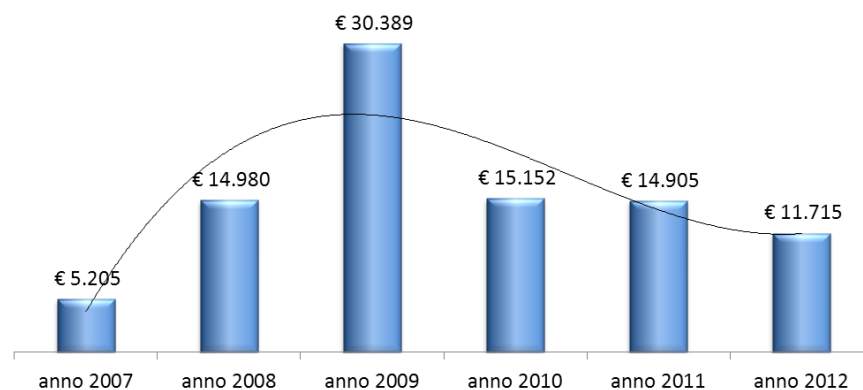

Valori espressi in migliaia di Euro

Gli investimenti realizzati, al netto dei contributi degli utenti per l'allacciamento al servizio, e di quelli della Regione Veneto e dell'AATO Veronese, portano a complessivi 72,7 milioni di Euro, come evidenzia il grafico sottostante:

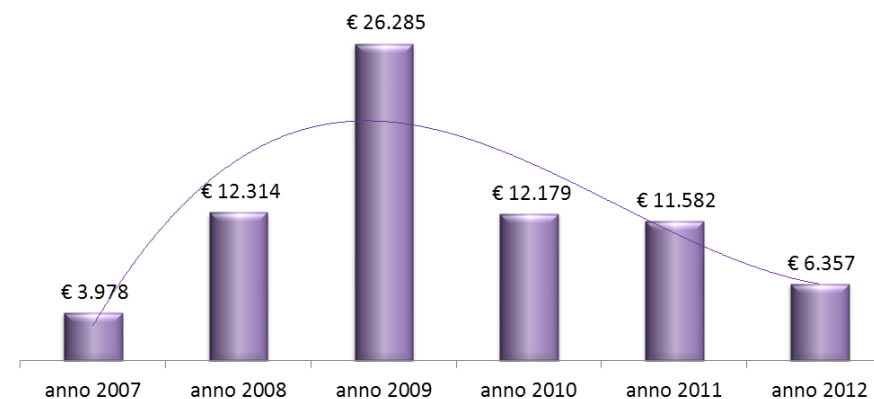

Valori espressi in migliaia di Euro

ALLEGATO 1: DETTAGLIO INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2012 – Confronto con gli investimenti 2012 approvati dall'AATO Veronese in data 20.12.2011

CODICE AATO	CODICE INTERVENTO	COMUNE	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO [€]	ANNO 2012 [€] (App. AATO del 20.12.2011)	INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2012 [€]	SCOSTAMENTO [€]	CAUSE DI SCOSTAMENTO
B.1 - 57	93302080	ALBAREDO D'ADIGE	Realizzazione rete idrica e fognaria in zone sprovviste all'interno del capoluogo: fognatura Viale Europa	125.000	12.500	0	-12.500	adeguamento post consuntivo 2011
B.1 - 57	93302080	ALBAREDO D'ADIGE	Realizzazione rete idrica e fognaria in zone sprovviste all'interno del capoluogo: completamento fognatura e acquedotto	221.500	206.710	11.326	-195.384	sospensione dell'investimento
B.1 - 142	93303100	ANGIARI	Realizzazione tratti fognatura in Via Santa Croce, Via Possessione, Via Cason	925.000	0	8.840	8.840	adeguamento post consuntivo 2011
A.1 - 31	93304110	ARCOLE	Interventi urgenti per adeguamento del sistema fognario e acquedottistico del Comune	200.000	160.000	45.548	-114.452	sospensione dell'investimento
B.1 - 78	93105080	BADIA CALAVENA	Realizzazione condotte fognarie al servizio del capoluogo	1.851.000	40.000	7.196	-32.804	sospensione dell'investimento
A.1 - 53	93207080	BELFIORE	Opere acquedottistiche a tutela quali-quantitativa della falda	2.850.000	100.000	0	-100.000	sospensione dell'investimento
B.1 - 161	93207090	BELFIORE	Estensione rete fognaria a zone non servite e collettamento al depuratore di Belfiore	168.000	0	117.097	117.097	adeguamento post consuntivo 2011
B.1 - 161	93207110	BELFIORE	Estensione rete fognaria a zone non servite e collettamento al depuratore di Belfiore - 2° stralcio Via Casoni	85.000	55.000	64.740	9.740	anticipi su cronoprogramma di realizzazione
B.1 - 56	93308100	BEVILACQUA	Adeguamento reti fognarie	320.000	0	0	0	---
B.1 - 63	93309090	BONAVIGO	Estensione rete fognaria in zone attualmente non servite	150.000	0	2.821	2.821	adeguamento post consuntivo 2011
B.1 - 62	93310090	BOSCHI SANT'ANNA	Estensione rete fognaria in zone attualmente non servite	300.000	269.520	201.834	-67.686	Risparmi
B.1 - 34	93111070	BOSCO CHIESANUOVA	Allacciamento contrada Grobbe al collettore della Lessinia	269.000	0	3.066	3.066	adeguamento post consuntivo 2011



CODICE AATO	CODICE INTERVENTO	COMUNE	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO [€]	ANNO 2012 [€] (App. AATO del 20.12.2011)	INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2012 [€]	SCOSTAMENTO [€]	CAUSE DI SCOSTAMENTO
A.1 - 112	93111080	BOSCO CHIESANUOVA	Allacciamento all'acquedotto delle contrade Brutti, Rolli, Merli, Tecle e Squaranton	303.000	0	0	0	---
A.1 - 112	93111081	BOSCO CHIESANUOVA	Ristrutturazione impianto Villa Ponti (acquedotto della lessinia) e potenziamento del sistema di distribuzione di acqua potabile del Comune	503.028	0	0	0	---
B.1 - 34	93111090	BOSCO CHIESANUOVA	Progetto per adeguamento rete fognaria del capoluogo e primi interventi urgenti	100.000	0	0	0	---
D.1 - 10	93111100	BOSCO CHIESANUOVA	Allacciamento al collettore di fondovalle dalle frazioni "Arzarè-Regno" Corbiolo (stralcio)	250.000	241.065	191.418	-49.647	adeguamento post consuntivo 2011
B.2 - 29	33121200	BOVOLONE	Adeguamento impianto di depurazione	3.000.000	60.000	0	-60.000	sospensione dell'investimento
B.2 - 29	33121210	BOVOLONE	Depuratore di Bovolone, San Pierino: interventi di adeguamento funzionale dell'attuale impianto	463.000	315.000	26.676	-288.324	sospensione dell'investimento
B.2 - 29	93312070	BOVOLONE	* Estensione e adeguamento rete fognaria nel Comune di Bovolone	1.110.000	51.160	0	-51.160	sospensione dell'investimento
B.2 - 29	93312080	BOVOLONE	Interventi urgenti per adeguamento depuratore	520.000	0	0	0	---
A.1 - 68	93312081	BOVOLONE	Estensione rete acquedotto a zone non servite e collegamento con la rete di Oppeano - 1° stralcio	350.000	0	0	0	---
A.1 - 68	93312100	BOVOLONE	Prolungamento della rete acquedotto in Via San Giovanni	200.000	0	0	0	---
B.2 - 05	32151200	BUSSOLENGO	Adeguamento impianto di depurazione	1.200.000	40.000	0	-40.000	sospensione dell'investimento
B.2 - 05	32151210	BUSSOLENGO	Depuratore di Bussolengo: Interventi di adeguamento funzionale dell'attuale impianto	302.000	302.000	15.658	-286.342	sospensione dell'investimento
D.2 - 08	93215070	BUSSOLENGO	* Rifacimento fognatura in alcune vie del capoluogo	104.841	104.841	9.412	-95.429	sospensione dell'investimento
B.1 - 06	93215100	BUSSOLENGO	Ampliamento fognature	325.000	0	0	0	---
D.2 - 44	93216070	BUTTAPIETRA	* Ristrutturazione delle condotte principali della rete fognaria comunale di Buttapietra	1.500.000	30.000	0	-30.000	sospensione dell'investimento
B.1 - 191	93216090	BUTTAPIETRA	* Estensione rete fognaria Via Isola della Scala e Via dell'Artigianato	540.437	10.000	19.788	9.788	adeguamento post consuntivo 2011



CODICE AATO	CODICE INTERVENTO	COMUNE	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO [€]	ANNO 2012 [€] (App. AATO del 20.12.2011)	INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2012 [€]	SCOSTAMEN TO [€]	CAUSE DI SCOSTAMENTO
B.1 - 175	93319070	CASALEONE	* Estensione della rete fognaria	975.000	30.000	0	-30.000	sospensione dell'investimento
A.1 - 39	93224080	CAZZANO TRAMIGNA	DI Potenziamento dell'acquedotto del capoluogo ed allacciamento delle contrade Monti, Campiano e Caltrani	400.000	0	2.729	2.729	adeguamento post consuntivo 2011
D.2 - 46	93325080	CEREA	Adeguamento collettore fognatura consortile della linea di Cerea	600.000	0	0	0	---
A.1 - 70	93325081	CEREA	Estensione rete idrica e fognaria in zone attualmente prive della rete di distribuzione e per risolvere il problema dell'arsenico nell'acqua	360.000	50.000	17.298	-32.702	adeguamento post consuntivo 2011
B.1 - 155	93126070	CERRO VERONESE	* Estensione e rifacimento della rete fognaria: 1a fase (progetto e primi interventi urgenti sulla rete del capoluogo)	250.000	0	0	0	---
B.1 - 155	93126100	CERRO VERONESE	Estensione rete fognaria del capoluogo (stralcio)	100.000	28.564	28.551	-13	Risparmi
B.1 - 194	93327070	COLOGNA VENETA	* Realizzazione fognatura nelle vie Ronchi, Sabbion, Matteotti; Crearo, S. Giustina a Cologna	400.000	0	0	0	---
B.1 - 64	93327071	COLOGNA VENETA	Completamento delle reti di fognatura nella frazione di Spessa di Cologna Veneta e altre località dei Comuni limitrofi	2.000.000	0	0	0	---
B.1 - 194	93327072	COLOGNA VENETA	Collettamenti fognari al depuratore per il disinquinamento dell'area Fratta-Gorzone	1.170.000	0	0	0	---
B.1 - 135	93327080	COLOGNA VENETA	Estensione della rete fognaria afferente all'impianto di depurazione di Cologna Veneta	4.980.000	1.000.000	0	-1.000.000	sospensione dell'investimento
B.2 - 15	93327081	COLOGNA VENETA	Potenziamento ed adeguamento del depuratore di Cologna Veneta: 1° stralcio	1.020.000	0	0	0	---
B.1 - 88 C.5 - 30	32281200	COLOGNOLA COLLI	AI Adeguamento di estensione della rete acquedottistica e fognaria	953.872	0	0	0	---
D.2 - 22	93332080	ERBE'	Interventi urgenti per adeguamento depuratore	91.000	0	0	0	---
B.1 - 197 D.2 - 22 D.1 - 13	93332100	ERBE'	Posa della condotta di fognatura nera in Via XXV Aprile, Via Giacomo Matteotti e dismissione impianto di depurazione di Erbè per collettamento a Sorgà	587.000	0	30.050	30.050	variazione del budget annuale



CODICE AATO	CODICE INTERVENTO	COMUNE	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO [€]	ANNO 2012 [€] (App. AATO del 20.12.2011)	INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2012 [€]	SCOSTAMEN TO [€]	CAUSE DI SCOSTAMENTO
B.5 - 15	93332101	ERBE'	Rifacimento reti di fognatura in Via San Giuseppe, Via F.lli Cairoli, Viale Europa, Via XX Settembre	587.313	150.000	0	-150.000	sospensione dell'investimento
B.1 - 147	93133070	ERBEZZO	Adeguamenti urgenti rete esistente e progetto di completamento della rete fognaria del Comune di Erbezzo	140.000	0	0	0	- - -
A.1 - 91	93133080	ERBEZZO	Potenziamento e ristrutturazione impianto sistema di adduzione acqua potabile a Cappella Fasani (Comune di Erbezzo)	200.000	17.946	27.907	9.961	adeguamento post consuntivo 2011
B.3 - 05	93133100	ERBEZZO	Impianti di depurazione e reti di raccolta ad Erbezzo	200.000	100.000	37.673	-62.327	adeguamento post consuntivo 2011
A.1 - 126	93135080	FUMANE	Estensione rete acquedotto in località Uri a Mazzurega	80.000	0	0	0	- - -
B.1 - 36 B.5 - 21 C.3 - 08 C.5 - 06	93135100	FUMANE	Adeguamento ed estensione reti fognarie e acquedottistiche	465.400	0	1.000	1.000	adeguamento post consuntivo 2011
A.1 - 104	93337120	GAZZO VERONESE	Realizzazione della rete idrica a servizio della frazione Maccacari	200.000	200.000	0	-200.000	sospensione dell'investimento
B.1 - 129 B.1 - 130 B.1 - 133	93337070b	GAZZO VERONESE	* Completamento rete fognaria comunale: - via Boschi (353.000€) - via Porto (300.000€) - via Buche Levà di sotto (400.000€)	1.053.000	284.370	0	-284.370	sospensione dell'investimento
A.1 - 92 C.1 - 105	31381200	GREZZANA	Rifacimento serbatoio "La Costa"	1.661.000	0	0	0	- - -
B.1 - 33	93138070	GREZZANA	Completamento rete fognaria nelle frazioni di Rosaro, Busoni e Corso	900.000	0	65.551	65.551	adeguamento post consuntivo 2011
B.1 - 16	93138071	GREZZANA	* Fognatura Frazione di Azzago: 2° Stralcio	1.340.000	0	0	0	- - -
B.1 - 39	93138072	GREZZANA	* Fognatura Frazione di Orsara	200.000	192.482	121.777	-70.705	Risparmi
B.1 - 238	93138073	GREZZANA	* Fognatura Frazione di Alcenago - loc. Coda, Vigo, Rupiano	2.500.000	40.000	0	-40.000	sospensione dell'investimento
A.3 - 06	93138091	GREZZANA	Realizzazione nuovo impianto di rilancio acquedotto in Via Asiago Comune di Grezzana	200.000	0	0	0	- - -



CODICE AATO	CODICE INTERVENTO	COMUNE	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO [€]	ANNO 2012 [€] (App. AATO del 20.12.2011)	INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2012 [€]	SCOSTAMEN TO [€]	CAUSE DI SCOSTAMENTO
A.3 - 06	93138100	GREZZANA	Interventi di potabilizzazione Grezzana - Nesente: opere di completamento - Adeguamento centrale di Nesente	150.000	0	0	0	---
A.3 - 06	93138090a	GREZZANA	Interventi di potabilizzazione Grezzana - Nesente: 2° e 3° stralcio (pozzi e sistemazione centrale Nesente; condotta Nesente - Grezzana)	1.154.000	0	0	0	---
A.3 - 06	93138090b	GREZZANA	Interventi di potabilizzazione Grezzana - Nesente: 2° Sub. A	292.000	0	0	0	---
B.2 - 30	93340081	ISOLA DELLA SCALA	Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a Isola della Scala e collettori di collegamento reti esistenti	4.300.000	100.000	9.369	-90.631	sospensione dell'investimento
A.1 - 64	93340082a	ISOLA DELLA SCALA	Realizzazione rete fognaria e acquedottistica in concomitanza alla realizzazione di opere pubbliche	76.610	0	0	0	---
B.1 - 169	93340082b	ISOLA DELLA SCALA	Realizzazione rete fognaria e acquedottistica	40.390	0	0	0	---
B.1 - 145	93341070	ISOLA RIZZA	* Fognature capoluogo	130.000	0	0	0	---
B.1 - 07	93242100	LAVAGNO	Estensione rete fognaria a località San Briccio - 1° stralcio	400.000	30.000	0	-30.000	sospensione dell'investimento
B.1 - 202	93242101	LAVAGNO	Estensione rete fognaria alla località San Giacomo e adeguamento rete di collettamento a San Martino Buon Albergo: completamento	425.000	0	0	0	---
B.1 - 202	93242101	LAVAGNO	Estensione rete fognaria alla località San Giacomo e adeguamento rete di collettamento a San Martino Buon Albergo: fognatura Via Monticelli	130.000	0	37.360	37.360	adeguamento post consuntivo 2011
B.1 - 203	93344070	LEGNAGO	* Interventi di adeguamento e completamento della rete fognaria in destra Adige - Porto e località Casette	400.000	20.000	0	-20.000	sospensione dell'investimento
A.1 - 149	93344071	LEGNAGO	Interventi per risolvere il problema arsenico nell'acqua potabile: completamento rete di distribuzione idrica nel comune di Legnago	4.450.000	57.381	10.685	-46.696	Risparmi
B.5 - 16	93146070	MARANO DI VALPOLICELLA	Separazione rete fognatura capoluogo e allacciamenti acquedotto nella frazione di Purano	280.000	0	0	0	---



CODICE AATO	CODICE INTERVENTO	COMUNE	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO [€]	ANNO 2012 [€] (App. AATO del 20.12.2011)	INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2012 [€]	SCOSTAMEN TO [€]	CAUSE DI SCOSTAMENTO
A.1 - 14 B.1 - 50 B.5 - 06 D.2 - 14	93146100	MARANO DI VALPOLICELLA	Adeguamento di reti fognatura e acquedotto	720.500	0	1.500	1.500	adeguamento post consuntivo 2011
B.1 - 55	93348070	MINERBE	* Fognatura nera area Ovest 2° lotto	725.000	0	0	0	---
B.1 - 55	93348071	MINERBE	Estensione rete fognaria Comune di Minerbe Via Trento, Crosarona e Trieste	400.000	0	0	0	---
B.1 - 206	32491200	MONTECCHIA DI CROSARA	Estensione rete fognaria in Via Zaffaini	280.000	0	0	0	---
B.1 - 206	93249091	MONTECCHIA DI CROSARA	Rifacimento Piazza Frutti	210.000	0	0	0	---
B.4 - 07	93249090	MONTECCHIA DI CROSARA	* Progetto per completamento fognatura consortile 4° lotto E - Vasca di laminazione Montecchia di Crosara_3.900 abitanti attuali (9.600 futuri)	500.000	0	20.685	20.685	adeguamento post consuntivo 2011
B.5 - 17	93250090	MONTEFORTE D'ALPONE	* Progetto per completamento fognatura consortile 4° lotto F - Vasca di laminazione Monteforte d'Alpone_2.900 abitanti attuali (3.200 futuri)	500.000	0	32.467	32.467	adeguamento post consuntivo 2011
B.1 - 09	93250100	MONTEFORTE D'ALPONE	Adeguamento e potenziamento sistema fognario	217.000	0	6.988	6.988	adeguamento post consuntivo 2011
B.1 - 207	93250101	MONTEFORTE D'ALPONE	Estensione rete fognaria in via Molinetto e via Dian	247.200	0	47.528	47.528	adeguamento post consuntivo 2011
B.2 - 44	93251070	MOZZECANE	* Adeguamento del depuratore comunale ai nuovi carichi provenienti dalla rete fognaria di Grezzano e zone limitrofe	850.000	15.000	6.422	-8.578	adeguamento post consuntivo 2011
B.1 - 143	93251090	MOZZECANE	* Lavori di realizzazione rete fognaria nella frazione S. Zeno di Mozzecane	150.000	0	0	0	---
B.1 - 208	93251100	MOZZECANE	Fognatura e acquedotto in Via Regina Margherita e acquedotto in altre vie del Comune	790.000	576.600	162.620	-413.980	Risparmi
B.1 - 15	93152080	NEGRAR	Realizzazione rete fognaria nelle frazioni di Fane e Mazzano e loro collettamento alla rete di Negrar	4.000.000	0	0	0	---
A.1 - 02	93152081	NEGRAR	Estensione rete idrica S. Peretto - 2° e 3° Stralcio	472.000	0	10.998	10.998	adeguamento post consuntivo 2011



CODICE AATO	CODICE INTERVENTO	COMUNE	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO [€]	ANNO 2012 [€] (App. AATO del 20.12.2011)	INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2012 [€]	SCOSTAMENTO [€]	CAUSE DI SCOSTAMENTO
B.1 - 209	93152082	NEGRAR	Realizzazione rete fognaria nelle frazioni di Montecchio e Spigamonte e loro collettamento alla rete di Negrar	2.055.750	0	0	0	---
B.1 - 13	93152090	NEGRAR	Realizzazione rete fognaria in Via Volpare	95.000	0	0	0	---
B.1 - 210	93152100	NEGRAR	Realizzazione rete fognatura di Via Quintarelli in località San Vito e rete idrica in Via Crosara	88.600	0	5.269	5.269	adeguamento post consuntivo 2011
B.1 - 211	93152101	NEGRAR	Realizzazione rete fognatura di Via Archimede (zona industriale), Via Roverina, Cà Paletta	250.000	0	0	0	---
B.1 - 51	93152102	NEGRAR	Adeguamento e potenziamento sistema fognario	1.121.100	7.427	1.500	-5.927	ritardi cronoprogramma su di realizzazione
B.2 - 31	33531200	NOGARA	Adeguamento impianto di depurazione	1.875.000	40.000	0	-40.000	sospensione dell'investimento
B.2 - 31	93353081	NOGARA	Interventi urgenti per adeguamento depuratore	65.000	0	0	0	---
B.2 - 38	93254080	NOGAROLE ROCCA	* Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a Nogarole Rocca e collettori di collegamento reti esistenti: impianto di depurazione	2.110.000	1.305.000	1.387.036	82.036	anticipi cronoprogramma su di realizzazione
B.2 - 38	93254080	NOGAROLE ROCCA	* Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a Nogarole Rocca e collettori di collegamento reti esistenti: condotte di collegamento	510.000	236.695	121.206	-115.489	ritardi cronoprogramma su di realizzazione
B.2 - 02	33551200	OPPEANO	Adeguamento impianto di depurazione di Casotton	600.000	30.000	0	-30.000	sospensione dell'investimento
B.2 - 02	93355070	OPPEANO	Potenziamento depuratore di Feniletto nel comune di Oppeano (Potenziamento del sistema di depurazione nelle zone Feniletto e limitrofe nel Comune di Oppeano)	3.608.000	100.000	0	-100.000	sospensione dell'investimento
B.1 - 177	93355071a	OPPEANO	* Adeguamento e ottimizzazione della rete fognaria: via Bertini, via Bursi, via Cadalora (2° stralcio)	350.000	0	0	0	---
B.1 - 177	93355071b	OPPEANO	* Adeguamento e ottimizzazione della rete fognaria: via Sorio					
A.1 - 108	93355080a	OPPEANO	Realizzazione nuovi tratti rete acquedotto in zone attualmente sprovviste: interventi urgenti in zone contaminate dal Cromo (Via Lino Lovo, Via Salieri)	331.931	0	0	0	---



CODICE AATO	CODICE INTERVENTO	COMUNE	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO [€]	ANNO 2012 [€] (App. AATO del 20.12.2011)	INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2012 [€]	SCOSTAMEN TO [€]	CAUSE DI SCOSTAMENTO
A.1 - 108	93355080b	OPPEANO	Realizzazione nuovi tratti rete acquedotto in zone attualmente sprovviste: realizzazione nuovi tratti di rete acquedotto nelle vie Bertini, Bursi, Cadalora (1° stralcio)	244.069	0	0	0	---
A.1 - 108	93355080c	OPPEANO	Realizzazione nuovi tratti rete acquedotto in zone attualmente sprovviste: realizzazione nuovi tratti di rete acquedotto nelle vie Boscoriondo, Spineta, Finiletto, Fornello e Franchine	720.000	720.000	14.095	-705.905	mancate approvazioni
A.1 - 54	93356100	PALU'	Adeguamento e potenziamento acquedotto	1.400.000	0	1.116	1.116	adeguamento post consuntivo 2011
B.1 - 31	93258070	PESCANTINA	* Estensione rete fognaria Ospedaletto e Santa Lucia	1.500.000	0	0	0	---
D.2 - 20	93258080	PESCANTINA	Interventi urgenti per adeguamento depuratori Tremolè e Settimo	117.000	0	0	0	---
A.1 - 17	93258100	PESCANTINA	Realizzazione rete idrica e fognaria in Viale Verona	770.000	0	0	0	---
B.2 - 13 D.2 - 42	32601200	POVEGLIANO	Potenziamento impianto di depurazione	3.750.000	80.000	0	-80.000	sospensione dell'investimento
B.2 - 13	32601210	POVEGLIANO	Depuratore di Povegliano: Interventi di adeguamento funzionale dell'attuale impianto	707.000	640.000	24.575	-615.425	sospensione dell'investimento
D.2 - 46	93260070	POVEGLIANO	* Rifacimento fognatura Via Cavour	201.100	0	0	0	---
B.1 - 163	32631200	RONCA'	Adeguamento e sistemazione rete fognaria nel capoluogo	750.000	0	0	0	---
B.1 - 94 b.1 - 95	93263090	RONCA'	* Progetto per completamento fognatura consortile: 4°lotto C - Collettore fognario allacciamento frazione Terrossa e vasca_1.000 abitanti attuali (2.700 futuri - 803.700€) 4°lotto D - Collettore fognario allacciamento Roncà e vasca_2.300 abitanti attuali (2.900 futuri - 838.700€)	1.642.400	0	10.931	10.931	adeguamento post consuntivo 2011
B.1 - 179	93364100	RONCO ALL'ADIGE	Estensione rete fognaria in Via della Pozza, Via Crosarona e Via Casetta nel capoluogo e in Via Cà del Sale in frazione Tombasozana	986.000	15.977	179.253	163.276	anticipi su cronoprogramma di realizzazione
B.1 - 08	33651200	ROVERCHIARA	Estensione rete fognaria in Via Bussè	300.000	0	0	0	---



CODICE AATO	CODICE INTERVENTO	COMUNE	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO [€]	ANNO 2012 [€] (App. AATO del 20.12.2011)	INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2012 [€]	SCOSTAMEN TO [€]	CAUSE DI SCOSTAMENTO
B.1 - 104	93167070	ROVERE' VERONESE	Completamento rete fognaria a servizio del capoluogo e nella frazione di San Rocco di Piegara e San Francesco: fognatura Squarantello	120.000	0	4.973	4.973	adeguamento post consuntivo 2011
B.1 - 104	93167070	ROVERE' VERONESE	Completamento rete fognaria a servizio del capoluogo e nella frazione di San Rocco di Piegara e San Francesco: fognatura San Francesco	180.000	0	0	0	---
B.1 - 137	93368100	SALIZZOLE	Fognature in alcune vie del territorio comunale (nelle Località Bionde, Engazzà, Salizzele, Valmorsel)	1.283.080	100.000	84.914	-15.086	Risparmi
A.1 - 22	93368101	SALIZZOLE	Estensione reti acquedottistiche e fognarie in alcune vie del capoluogo	200.000	0	0	0	---
B.2 - 45	93269090	SAN BONIFACIO	* Opere di affinamento e disinfezione scarico al depuratore di S. Bonifacio: pretrattamenti + trattamenti terziari	1.500.000	528.315	492.738	-35.577	ritardi su cronoprogramma di realizzazione
B.1 - 48	93269100	SAN BONIFACIO	Adeguamento fognature	185.000	50.440	1.765	-48.675	ritardi su cronoprogramma di realizzazione
C.2 - 08	93269101	SAN BONIFACIO	Collegamento acquedottistico San Bonifacio - Almisano	2.500.000	0	0	0	---
B.5 - 26	93269070	SAN BONIFACIO	Collettore fognario zona est di alleggerimento della rete di San Bonifacio	4.850.000	1.000.000	1.483	-998.517	sospensione dell'investimento
B.5 - 24	93269071	SAN BONIFACIO	* Collettore fognario zona sud di alleggerimento della rete di San Bonifacio frazioni di Locare, Lobia e Prova	2.100.000	0	0	0	---
D.2 - 18	93269072	SAN BONIFACIO	* Riquilificazione sistema fognario frazione di Prova	500.000	0	0	0	---
B.5 - 25	93269073	SAN BONIFACIO	* Fognature in Corso Venezia - 4° stralcio	245.000	0	0	0	---
B.5 - 12	93269074	SAN BONIFACIO	* Fognatura Via Colombo - Via Pigafetta	250.000	0	0	0	---
B.1 - 166	31701200	SAN GIOVANNI ILARIONE	Completamento ed adeguamento rete fognaria in via Verdi	70.000	0	0	0	---
A.1 - 37	93170110	SAN GIOVANNI ILARIONE	Completamento sistema acquedottistico in aree comunali	50.000	0	0	0	---



CODICE AATO	CODICE INTERVENTO	COMUNE	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO [€]	ANNO 2012 [€] (App. AATO del 20.12.2011)	INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2012 [€]	SCOSTAMENTO [€]	CAUSE DI SCOSTAMENTO
A.1 - 04 B.1 - 224	93271080	SAN GIOVANNI LUPATOTO	Realizzazione delle reti acquedotto e fognatura in alcune strade del capoluogo attualmente non servite (Acquedotto e fognatura Via Scajole)	1.095.000	700.000	886.747	186.747	anticipi su cronoprogramma di realizzazione
B.1 - 23 B.1 - 22 B.1 - 224	93271081	SAN GIOVANNI LUPATOTO	* Completamento della rete fognaria nelle Vie: Pacinotti, Apollo XI, Garofoli, Pace Paquara, Porto, Speranza	1.510.000	0	0	0	---
B.2 - 46	93271082	SAN GIOVANNI LUPATOTO	Ottimizzazione ed ampliamento impianto di depurazione da 24.000 a 40.000 AE	3.958.000	416.736	16.432	-400.304	sospensione dell'investimento
B.2 - 46	93271083	SAN GIOVANNI LUPATOTO	* Rifacimento comparto disidratazione fanghi dell'impianto di depurazione	260.000	0	0	0	---
B.3 - 09	93273080	SAN MARTINO BUON ALBERGO	Realizzazione rete fognaria nella frazione di Mambrotta: 1° stralcio, condotte piazza (90.545€) 2° stralcio, condotte e impianto depurazione (898.455€)	989.000	0	6.157	6.157	adeguamento post consuntivo 2011
A.1 - 09 A.1 - 124	93273081	SAN MARTINO BUON ALBERGO	Realizzazione acquedotto in località Pignatte	150.000	0	0	0	---
B.3 - 09	93273100	SAN MARTINO BUON ALBERGO	Realizzazione rete fognaria nella frazione di Mambrotta: opere di completamento	472.000	0	0	0	---
B.1 - 40	93174100	SAN MAURO DI SALINE	Realizzazione collettore fognario a servizio di utenze non servite	100.000	80.000	89.471	9.471	adeguamento post consuntivo 2011
A.1 - 77	93375080	SAN PIETRO DI MORUBIO	Realizzazione rete acquedotto in zona non servita nella frazione di Bonavicina	30.000	0	0	0	---
B.2 - 11	32761200	SAN PIETRO IN CARIANO	Adeguamento impianto di depurazione	5.000.000	90.000	0	-90.000	sospensione dell'investimento
B.5 - 27	32761210	SAN PIETRO IN CARIANO	Interventi di adeguamento funzionale dell'attuale impianto	475.000	90.000	9.048	-80.952	sospensione dell'investimento
B.5 - 11	93276090	SAN PIETRO IN CARIANO	Interventi di miglioramento della rete fognaria comunale: Area intervento Cadiloi	700.000	253.300	21.967	-231.333	ritardi su cronoprogramma di realizzazione
B.5 - 11	93276090	SAN PIETRO IN CARIANO	Interventi di miglioramento della rete fognaria comunale: Area intervento Cà dell'Ebreo	700.000	0	0	0	---

CODICE AATO	CODICE INTERVENTO	COMUNE	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO [€]	ANNO 2012 [€] (App. AATO del 20.12.2011)	INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2012 [€]	SCOSTAMEN TO [€]	CAUSE DI SCOSTAMENTO
B.5 - 11 B.1 - 184	93276090	SAN PIETRO IN CARIANO	Interventi di miglioramento della rete fognaria comunale: Area intervento Villaggio Stella	700.000	0	0	0	---
C.5 - 53	93276091	SAN PIETRO IN CARIANO	Interventi di miglioramento della rete fognaria comunale: nuovo sfioratore in località Paladon	272.000	0	0	0	---
B.5 - 14	93276100	SAN PIETRO IN CARIANO	Adeguamento ed estensione della rete idrica e fognaria nel capoluogo (sfioratore Valena)	1.238.000	17.000	11.960	-5.040	ritardi su cronoprogramma di realizzazione
B.4 - 14	93372070	SANGUINETTO	* 1°INTERVENTO: Ristrutturazione della rete fognaria del Comune di Sanguinetto - Rifacimento del collettore consortile Boschetti. 2°INTERVENTO: Ristrutturazione rete fognaria - realizzazione di una vasca volano nel Comune di Sanguinetto al servizio del collettore fognario consortile dei comuni ex CO.GE.FO	1.800.000	0	31	31	adeguamento post consuntivo 2011
B.3 - 13	31781200	SANT'ANNA D'ALFAEDO	Realizzazione reti fognatura e acquedotto in località Cona	220.000	0	1.550	1.550	adeguamento post consuntivo 2011
C.3 - 05	93178070	SANT'ANNA D'ALFAEDO	Rifacimento e potenziamento della condotta per l'alimentazione di acqua potabile al paese di S. Anna	975.000	0	0	0	---
B.3 - 12	93178071	SANT'ANNA D'ALFAEDO	Realizzazione impianto di depurazione e relativa rete a servizio della frazione di Vaggimal	400.000	0	0	0	---
B.1 - 44	93178090	SANT'ANNA D'ALFAEDO	Realizzazione rete fognaria nel comune di Sant'Anna d'Alfaedo e zone limitrofe frazioni Fosse, Ronconi e Vaona	627.000	0	23.877	23.877	adeguamento post consuntivo 2011
B.3 - 12	93178100	SANT'ANNA D'ALFAEDO	Realizzazione impianto di depurazione e relativa rete a servizio della frazione di Vaggimal - 2° Stralcio	400.000	162.173	116.205	-45.968	Risparmi
B.1 - 65	93178101	SANT'ANNA D'ALFAEDO	1° stralcio - collegamento frazione Ronconi	150.000	86.073	19.474	-66.599	Risparmi
B.1 - 73	93281080	SOAVE	Ristrutturazione urgente reti fognatura ed acquedotto di Borgo Covregnino e Borgo San Lorenzo	550.000	3.324	1.860	-1.464	Risparmi
C.5 - 20	93281110	SOAVE	Rifacimento rete idrica nel quartiere "musicisti" del capoluogo	271.000	171.000	145.992	-25.008	Risparmi



CODICE AATO	CODICE INTERVENTO	COMUNE	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO [€]	ANNO 2012 [€] (App. AATO del 20.12.2011)	INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2012 [€]	SCOSTAMENTO [€]	CAUSE DI SCOSTAMENTO
B.1 - 77	93281070	SOAVE	* Rifacimento e completamento delle reti di fognatura e acquedotto di C.so Vittorio Emanuele, Via Cangrande e vicoli adiacenti (in concomitanza a intervento su rete gas)	909.728	0	0	0	---
B.2 - 23 D.2 - 42	32821200	SOMMACAMPAGNA	Impianto di depurazione di Sommacampagna: adeguamento funzionale e ottimizzazione	3.850.000	30.000	0	-30.000	sospensione dell'investimento
B.2 - 23	93282070	SOMMACAMPAGNA	* Lavori all'impianto di depurazione (completamento per lo scarico al suolo)	500.000	0	0	0	---
B.1 - 43	93282071	SOMMACAMPAGNA	* Realizzazione by-pass del collettore fognario di Sona	620.800	0	0	0	---
A.1 - 07	93282072	SOMMACAMPAGNA	Ottimizzazione impianto rilancio acquedotto Sommacampagna e serbatoio Custoza	452.000	0	48	48	adeguamento post consuntivo 2011
B.2 - 39 B.1 - 172	93384080	SORGA'	* Realizzazione impianto di depurazione di Sorgà e reti di collettamento	3.414.940	144.570	0	-144.570	ritardi su cronoprogramma di realizzazione
B.2 - 39	93384081	SORGA'	* Realizzazione impianto di depurazione di Bonferraro e reti di collettamento	1.638.000	50.000	0	-50.000	ritardi su cronoprogramma di realizzazione
D.2 - 45	93388070	TREVENZUOLO	Interventi per l'adeguamento del depuratore in località Fagnano	300.000	0	0	0	---
A.1 - 80	93190100	VELO VERONESE	Estensione rete acquedotto contrada Scrivazzi, Garzon e Tezze	963.086	0	0	0	---
B.1 - 04	93291070	VERONA	* Fognatura Via del Pestrino, fraz. Copella e tratti minori in Verona e Comuni limitrofi	1.100.000	250.000	3.786	-246.214	sospensione dell'investimento
B.4 - 16	93291080	VERONA	Interventi urgenti per l'adeguamento del sistema fognario di Veronetta (collettore 8M): 1° stralcio	1.900.000	0	0	0	---
B.2 - 07	93291081	VERONA	* Depuratore "Città di Verona": interventi urgenti per adeguamento	600.000	0	0	0	---
B.2 - 08	93291081	VERONA	Depuratore "Città di Verona": "copertura vasche ossidazione"	1.627.020	627.020	438.797	-188.223	Risparmi
B.2 - 47	93291081	VERONA	Adeguamento depuratore - Interventi sulla linea acque	4.885.000	200.000	0	-200.000	sospensione dell'investimento



CODICE AATO	CODICE INTERVENTO	COMUNE	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO [€]	ANNO 2012 [€] (App. AATO del 20.12.2011)	INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2012 [€]	SCOSTAMEN TO [€]	CAUSE DI SCOSTAMENTO
B.2 - 43	93291081	VERONA	Adeguamento depuratore Verona - Comparto per il trattamento dei rifiuti liquidi (35.000 AE)	3.057.000	0	0	0	---
B.5 - 31	93291090	VERONA	Adeguamento della rete fognaria di Montorio: 1a fase (intervento urgente per adeguamento sfioratore)	200.000	0	0	0	---
C.5 - 03	93291091	VERONA	Intervento per risolvere il problema dei depositi di sabbia all'utenza nelle zone di Poiano e S. Michele. (Rete acquedotto Verona)	120.000	0	0	0	---
B.1 - 04	93291100	VERONA	Estensione rete fognaria in Via Lazzaretto	500.000	0	0	0	---
B.1 - 04	93291101	VERONA	Estensione rete fognaria in Via Ponte San Pancrazio e in Via 28 Marzo	460.000	449.746	388.636	-61.110	Risparmi
B.1 - 04 A.1 - 01	93291102	VERONA	Estensione rete fognaria e potenziamento rete acquedottistica in Via Cà dei Recchi, Via Guerrieri e Via Brigata Casale	458.000	0	0	0	---
A.1 - 01	93291103	VERONA	Potenziamento rete acquedotto località Trezzolano	249.000	0	42.020	42.020	adeguamento post consuntivo 2011
B.1 - 04	93291110	VERONA	Risanamento collettore fognario di Via Faccio	2.600.000	0	0	0	---
C.5 - 21 C.1 - 05	93291111	VERONA	Spostamento serbatoio "Terza torre Massimiliana"	800.000	0	0	0	---
B.1 - 236	93392100	VERONELLA	Fognature nelle Vie Desmontà, Lavagnoli, Fornasa, Stradon, San Marcello, Giamone e nella frazione Miega	2.391.500	0	9.358	9.358	variazione del budget annuale
A.1 - 154	31931300	VESTENANOVA	Rete fognaria e vasca Imhoff a servizio della Contrada Zovo nel Comune di Vestenanova	130.000	0	3.640	3.640	adeguamento post consuntivo 2011
A.1 - 44	93193070	VESTENANOVA	Completamento acquedotto ed adeguamento fognatura in località del capoluogo sprovviste di rete: acquedotto Barco	145.000	0	0	0	---
A.1 - 154	93193070	VESTENANOVA	Completamento acquedotto ed adeguamento fognatura in località del capoluogo sprovviste di rete: fognatura Mainenti	108.857	0	6.854	6.854	adeguamento post consuntivo 2011
D.2 - 35	33941200	VIGASIO	Interventi di adeguamento funzionale dell'attuale impianto	275.000	275.000	15.982	-259.018	sospensione dell'investimento
D.2 - 35 D.2 - 42	93394070	VIGASIO	* Adeguamento funzionale del depuratore comunale del capoluogo	515.000	0	0	0	---



CODICE AATO	CODICE INTERVENTO	COMUNE	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO [€]	ANNO 2012 [€] (App. AATO del 20.12.2011)	INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2012 [€]	SCOSTAMENTO [€]	CAUSE DI SCOSTAMENTO
D.2 - 30	93394090	VIGASIO	* Rifacimento linea fognaria Via Villafranca	180.000	0	0	0	- - -
B.1 - 181	93395070	VILLA BARTOLOMEA	* Completamento fognature nel capoluogo - 2° stralcio	385.000	15.000	0	-15.000	sospensione dell'investimento
A.1 - 52	93395071	VILLA BARTOLOMEA	Collegamento idrico Legnago-Villa Bartolomea (capoluogo)	1.500.000	300.000	89.460	-210.540	sospensione dell'investimento
B.1 - 237	93296070	VILLAFRANCA DI VERONA	* Riqualificazione via Quadrato - per fognatura	579.916	0	0	0	- - -
B.1 - 237	93296071	VILLAFRANCA DI VERONA	* Realizzazione rete fognaria in loc. Pozzomoreto	700.000	0	0	0	- - -
B.1 - 237	93296100	VILLAFRANCA DI VERONA	Fognature in varie vie sprovviste di rete	2.639.000	77.224	45.405	-31.819	ritardi cronoprogramma su di realizzazione
B.2 - 06	33971200	ZEVIO	Depuratore di Zevio, Tre Corone: interventi di adeguamento funzionale dell'attuale impianto	175.000	175.000	10.620	-164.380	sospensione dell'investimento
B.2 - 06	93397070	ZEVIO	Interventi per l'adeguamento del depuratore in località Tre Corone	300.000	0	0	0	- - -
B.1 - 03	93397090	ZEVIO	Ristrutturazione della rete di fognatura comunale - 1° stralcio	483.000	0	0	0	- - -
B.1 - 148	93397091	ZEVIO	Ristrutturazione della rete di fognatura comunale - 4° stralcio	263.000	0	0	0	- - -
B.1	34991200	PIU' COMUNI	Progettazione adeguamento rete fognaria secondo quanto previsto dalla direttiva 2000/60/CE (copertura agglomerati soggetti ad infrazione)	26.000.000	250.000	0	-250.000	sospensione dell'investimento
B.4 - 08	34991210	PIU' COMUNI	Adeguamento degli sfioratori di piena a servizio delle reti fognarie miste secondo quanto previsto all'Art.33 del PTA Veneto: presso impianti di depurazione	3.420.000	250.000	0	-250.000	sospensione dell'investimento
A.3	93400104	PIU' COMUNI	Interventi urgenti su impianti di potabilizzazione	839.500	0	0	0	- - -
D.2	93400110	PIU' COMUNI	Interventi urgenti ottimizzazione impianti di depurazione	21.537	0	0	0	- - -
B.4 - 08	93400123	PIU' COMUNI	Adeguamento degli sfioratori di piena a servizio delle reti fognarie miste secondo quanto previsto all'Art.33 del PTA Veneto: sulla rete fognaria	16.800.000	100.000	21.000	-79.000	sospensione dell'investimento

CODICE AATO	CODICE INTERVENTO	COMUNE	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO [€]	ANNO 2012 [€] (App. AATO del 20.12.2011)	INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2012 [€]	SCOSTAMEN TO [€]	CAUSE DI SCOSTAMENTO
C.4 - 04	93300070	PIU' COMUNI ³	Interventi per rifacimento rete idrica in Albaredo, Arcole, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S.A., Cologna V., Legnago, Minerbe, Pressana, Roveredo, Veronella, Zimella - 1° e 2° Stralcio	1.868.337	0	0	0	---
A.1 - 152	93300071	PIU' COMUNI ⁴	Interventi per estensione rete idrica in Albaredo, Arcole, Bonavigo, Boschi S.A., Cologna V., Legnago, Minerbe, Pressana, Roveredo, Terrazzo, Veronella, Zimella - 1° Stralcio	1.201.663	0	0	0	---
B.2 - 27	93300072	PIU' COMUNI ⁵	Completamento seconda fase schema fognario consortile (4° lotto)	700.000	0	0	0	---
B.5 - 19	93100070	PIU' COMUNI ⁶	* Rifacimento del collettore fognario Valpantena	14.000.000	180.000	252.933	72.933	variazione del budget annuale
B.3 - 08 D.2 - 02	93167100	ROVERE' VERONESE + VELO VERONESE	Adeguamento fognario e depurativo dei due capoluoghi	250.000	150.000	106.000	-44.000	ritardi su cronoprogramma di realizzazione
A.1 - 132	33991200	PIU' COMUNI ⁷	Estensione rete acquedotto nei Comuni di Nogara e Gazzo Veronese - 1° stralcio - Nogara	1.144.000	200.000	34.312	-165.688	sospensione dell'investimento
A.1 - 132 A.2 - 47	33991201	PIU' COMUNI ⁷	Estensione rete acquedotto nei Comuni di Nogara e Gazzo Veronese - 2° stralcio - Potenziamento adduzione	4.480.000	5.000	0	-5.000	sospensione dell'investimento
A.1 - 104	93337110	PIU' COMUNI ⁷	Estensione rete acquedotto nei Comuni di Nogara e Gazzo Veronese - 3° stralcio - Gazzo Veronese	2.876.000	35.000	0	-35.000	sospensione dell'investimento
A.1 - 150	93353070	NOGARA+GAZZO VERONESE	Lavori di ripristino della funzionalità degli acquedotti dei comuni di Nogara e Gazzo: 3° Stralcio (CISI)	1.150.000	0	0	0	---

³ ALBAREDO, ARCOLE, BEVILACQUA, BONAVIGO, BOSCHI S.A., COLOGNA V., LEGNAGO, MINERBE, PRESSANA, ROVEREDO, VERONELLA, ZIMELLA

⁴ ALBAREDO, ARCOLE, BONAVIGO, BOSCHI S.A., COLOGNA V., LEGNAGO, MINERBE, PRESSANA, ROVEREDO, TERRAZZO, VERONELLA, ZIMELLA

⁵ ARCOLE, BEVILACQUA, BONAVIGO, BOSCHI S.A., MINERBE, TERRAZZO

⁶ BOSCO CHIESANUOVA, CERRO VERONESE, ERBEZZO, GREZZANA, SANT'ANNA D'ALFAEDO

⁷ ISOLA DELLA SCALA+NOGARA+GAZZO



CODICE AATO	CODICE INTERVENTO	COMUNE	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO [€]	ANNO 2012 [€] (App. AATO del 20.12.2011)	INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2012 [€]	SCOSTAMENTO [€]	CAUSE DI SCOSTAMENTO
A.1 - 150	93353080	NOGARA+GAZZO VERONESE	Lavori di ripristino della funzionalità degli acquedotti dei comuni di Nogara e Gazzo: 2° Stralcio (CISI)	850.000	0	0	0	- - -
C.5 - 02	92400090	PIU' COMUNI	Adegamenti a livello di esercizio minimo e ottimizzazione reti e impianti acquedotto	6.389.162	346.000	657.018	311.018	interventi straordinari per emergenza
D.2 - 40	92400090	PIU' COMUNI	Adegamenti a livello di esercizio minimo e ottimizzazione reti e impianti fognatura/depurazione	9.503.919	692.000	932.783	240.783	interventi straordinari per emergenza
C.5 - 02	92400091	PIU' COMUNI	Messa a norma inerenti la sicurezza degli impianti acquedotto	3.197.863	500.000	116.945	-383.055	sospensione dell'investimento
D.2 - 40	92400091	PIU' COMUNI	Messa a norma inerenti la sicurezza degli impianti fognatura/depurazione	5.129.936	1.000.000	106.921	-893.079	sospensione dell'investimento
E.2 - 03 F.2 - 02	92400093	PIU' COMUNI	Sistemi di telecontrollo su impianti acquedotto - fognatura - depurazione	1.881.785	100.000	2.670	-97.330	sospensione dell'investimento
T.1	92400110	PIU' COMUNI	Allacciamenti	19.730.389	2.317.623	1.807.228	-510.395	adeguamento post consuntivo 2011
A.1	92400111	PIU' COMUNI	Interventi di pianificazione territoriale: estensioni e potenziamenti acquedotto concomitanti a interventi per nuove lottizzazioni e/o in concomitanza ad interventi di altri enti	1.263.857	104.898	195.853	90.955	adeguamento post consuntivo 2011
B.1	92400111	PIU' COMUNI	Interventi di pianificazione territoriale: estensioni e potenziamenti fognatura concomitanti a interventi per nuove lottizzazioni e/o in concomitanza ad interventi di altri enti	782.244	104.898	45.087	-59.812	adeguamento post consuntivo 2011
C.5 - 02	92400112	PIU' COMUNI	Situazioni di potenziale pericolo per la salute pubblica e danno all'ambiente: interventi acquedotto	2.289.226	264.699	225.647	-39.052	ritardi su cronoprogramma di realizzazione
D.2 - 40	92400112	PIU' COMUNI	Situazioni di potenziale pericolo per la salute pubblica e danno all'ambiente: interventi fognatura/depurazione	3.863.084	529.398	466.036	-63.362	ritardi su cronoprogramma di realizzazione
S.1	92400092	PIU' COMUNI	Apparecchiature e strumentazione per sedi periferiche	342.044	10.300	12.129	1.829	adeguamento post consuntivo 2011
F.1 - 02	91400070	PIU' COMUNI	Rilevamento in campo e costruzione SIT infrastrutture fognarie	2.016.711	50.000	9.000	-41.000	sospensione dell'investimento



CODICE AATO	CODICE INTERVENTO	COMUNE	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO [€]	ANNO 2012 [€] (App. AATO del 20.12.2011)	INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2012 [€]	SCOSTAMEN TO [€]	CAUSE DI SCOSTAMENTO
C.4 - 03	91400071	PIU' COMUNI	Attività Monitoraggio, controllo, ricerca perdite reti ed impianti acquedotto	426.837	16.667	0	-16.667	sospensione dell'investimento
F.4 - 02	91400071	PIU' COMUNI	Attività Monitoraggio, controllo, ricerca infiltrazioni reti ed impianti fognatura/depurazione	560.622	33.333	0	-33.333	sospensione dell'investimento
E.2 - 03 F.2 - 02	91500080	PIU' COMUNI	Sistemi di automazione e telecontrollo - nucleo operativo di controllo	1.804.550	100.000	120.376	20.376	adeguamento post consuntivo 2011
S.1	91500070	PIU' COMUNI	Investimenti immateriali	2.381.855	25.000	0	-25.000	sospensione dell'investimento
S.1	91500073	PIU' COMUNI	Sistemi informativi e gestionali sede centrale e sedi periferiche	2.450.397	100.000	199.817	99.817	variazione del budget annuale
S.1	91500081	PIU' COMUNI	Implementazione e sostituzione strumentazione laboratorio analisi per controllo qualità del prodotto	1.125.467	50.000	118.415	68.415	variazione del budget annuale
S.1	91400090	PIU' COMUNI	Qualità Ambiente e Sicurezza	1.044.887	160.000	112.758	-47.242	sospensione dell'investimento
S.1	91500090	PIU' COMUNI	Adeguamento strutture, arredi e strumentazioni sedi periferiche	1.083.065	39.030	21.578	-17.452	Risparmi
S.1	91400092	PIU' COMUNI	Studi dei sistemi acquedottistici e fognari connessi all'ottimizzazione degli investimenti, all'ottimizzazione della gestione del servizio, ed ai rischi igienico-sanitari e ambientali	402.465	25.000	10.000	-15.000	Risparmi
SOMMANO				312.608.370	22.146.005	11.715.316	-10.430.689	



ALLEGATO 2: DETTAGLIO INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2012 – Confronto con gli investimenti 2012 approvati dal CdA di Acque Veronesi in data 21.03.2012

CODICE AATO	CODICE INTERVENTO	COMUNE	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO [€]	ANNO 2012 [€] (App. CdA del 21.03.2012)	INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2012 [€]	SCOSTAMENTO [€]	CAUSE DI SCOSTAMENTO
B.1 - 57	93302080	ALBAREDO D'ADIGE	Realizzazione rete idrica e fognaria in zone sprovviste all'interno del capoluogo: fognatura Viale Europa	125.000	0	0	0	---
B.1 - 57	93302080	ALBAREDO D'ADIGE	Realizzazione rete idrica e fognaria in zone sprovviste all'interno del capoluogo: completamento fognatura e acquedotto	221.500	5.117	11.326	6.209	Adeguamento post consuntivo 2011
B.1 - 142	93303100	ANGIARI	Realizzazione tratti fognatura in Via Santa Croce, Via Possessione, Via Cason	925.000	16.272	8.840	-7.432	mancate approvazioni
A.1 - 31	93304110	ARCOLE	Interventi urgenti per adeguamento del sistema fognario e acquedottistico del Comune	200.000	20.000	45.548	25.548	Adeguamento post consuntivo 2011
B.1 - 78	93105080	BADIA CALAVENA	Realizzazione condotte fognarie al servizio del capoluogo	1.851.000	0	7.196	7.196	Adeguamento post consuntivo 2011
A.1 - 53	93207080	BELFIORE	Opere acquedottistiche a tutela quali-quantitativa della falda	2.850.000	0	0	0	---
B.1 - 161	93207090	BELFIORE	Estensione rete fognaria a zone non servite e collettamento al depuratore di Belfiore	168.000	150.250	117.097	-33.152	risparmi
B.1 - 161	93207110	BELFIORE	Estensione rete fognaria a zone non servite e collettamento al depuratore di Belfiore - 2° stralcio Via Casoni	85.000	77.588	64.740	-12.848	risparmi
B.1 - 56	93308100	BEVILACQUA	Adeguamento reti fognarie	320.000	0	0	0	---
B.1 - 63	93309090	BONAVIGO	Estensione rete fognaria in zone attualmente non servite	150.000	0	2.821	2.821	Adeguamento post consuntivo 2011
B.1 - 62	93310090	BOSCHI SANT'ANNA	Estensione rete fognaria in zone attualmente non servite	300.000	270.902	201.834	-69.069	risparmi
B.1 - 34	93111070	BOSCO CHIESANUOVA	Allacciamento contrada Grobbe al collettore della Lessinia	269.000	0	3.066	3.066	Adeguamento post consuntivo 2011
A.1 - 112	93111080	BOSCO CHIESANUOVA	Allacciamento all'acquedotto delle contrade Brutti, Rolli, Merli, Tecle e Squaranton	303.000	0	0	0	---
A.1 - 112	93111081	BOSCO CHIESANUOVA	Ristrutturazione impianto Villa Ponti (acquedotto della lessinia) e potenziamento del sistema di distribuzione di acqua potabile del Comune	503.028	0	0	0	---



CODICE AATO	CODICE INTERVENTO	COMUNE	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO [€]	ANNO 2012 [€] (App. CdA del 21.03.2012)	INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2012 [€]	SCOSTAMENTO [€]	CAUSE DI SCOSTAMENTO
B.1 - 34	93111090	BOSCO CHIESANUOVA	Progetto per adeguamento rete fognaria del capoluogo e primi interventi urgenti	100.000	0	0	0	---
D.1 - 10	93111100	BOSCO CHIESANUOVA	Allacciamento al collettore di fondo valle dalle frazioni "Arzarè-Regno" Corbiolo (stralcio)	250.000	191.065	191.418	353	Adeguamento post consuntivo 2011
B.2 - 29	33121200	BOVOLONE	Adeguamento impianto di depurazione	3.000.000	0	0	0	---
B.2 - 29	33121210	BOVOLONE	Depuratore di Bovolone, San Pierino: interventi di adeguamento funzionale dell'attuale impianto	463.000		26.676	26.676	variazione del budget annuale
B.2 - 29	93312070	BOVOLONE	* Estensione e adeguamento rete fognaria nel Comune di Bovolone	1.110.000	0	0	0	---
B.2 - 29	93312080	BOVOLONE	Interventi urgenti per adeguamento depuratore	520.000	0	0	0	---
A.1 - 68	93312081	BOVOLONE	Estensione rete acquedotto a zone non servite e collegamento con la rete di Oppeano - 1° stralcio	350.000	0	0	0	---
A.1 - 68	93312100	BOVOLONE	Prolungamento della rete acquedotto in Via San Giovanni	200.000	0	0	0	---
B.2 - 05	32151200	BUSSOLENGO	Adeguamento impianto di depurazione	1.200.000	0	0	0	---
B.2 - 05	32151210	BUSSOLENGO	Depuratore di Bussolengo: Interventi di adeguamento funzionale dell'attuale impianto	302.000		15.658	15.658	variazione del budget annuale
D.2 - 08	93215070	BUSSOLENGO	* Rifacimento fognatura in alcune vie del capoluogo	104.841		9.412	9.412	variazione del budget annuale
B.1 - 06	93215100	BUSSOLENGO	Ampliamento fognature	325.000	0	0	0	---
D.2 - 44	93216070	BUTTAPIETRA	* Ristrutturazione delle condotte principali della rete fognaria comunale di Buttapietra	1.500.000	0	0	0	---
B.1 - 191	93216090	BUTTAPIETRA	* Estensione rete fognaria nel comune di Buttapietra – Via Isola della Scala e Via dell'Artigianato	540.437	0	19.788	19.788	Adeguamento post consuntivo 2011
B.1 - 175	93319070	CASALEONE	* Estensione della rete fognaria	975.000	0	0	0	---
A.1 - 39	93224080	CAZZANO DI TRAMIGNA	Potenziamento dell'acquedotto del capoluogo ed allacciamento delle contrade Monti, Campiano e Caltrani	400.000	2.550	2.729	179	Adeguamento post consuntivo 2011
D.2 - 46	93325080	CEREA	Adeguamento collettore fognatura consortile della linea di Cerea	600.000	0	0	0	---



CODICE AATO	CODICE INTERVENTO	COMUNE	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO [€]	ANNO 2012 [€] (App. CdA del 21.03.2012)	INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2012 [€]	SCOSTAMENTO [€]	CAUSE DI SCOSTAMENTO
A.1 - 70	93325081	CEREA	Estensione rete idrica e fognaria in zone attualmente prive della rete di distribuzione e per risolvere il problema dell'arsenico nell'acqua	360.000	10.240	17.298	7.058	Adeguamento post consuntivo 2011
B.1 - 155	93126070	CERRO VERONESE	* Estensione e rifacimento della rete fognaria: 1a fase (progetto e primi interventi urgenti sulla rete del capoluogo)	250.000	0	0	0	---
B.1 - 155	93126100	CERRO VERONESE	Estensione rete fognaria del capoluogo (stralcio)	100.000	28.564	28.551	-13	risparmi
B.1 - 194	93327070	COLOGNA VENETA	* Realizzazione fognatura nelle vie Ronchi, Sabbion, Matteotti; Crearo, S. Giustina a Cologna	400.000	0	0	0	---
B.1 - 64	93327071	COLOGNA VENETA	Completamento delle reti di fognatura nella frazione di Spessa di Cologna Veneta e altre località dei Comuni limitrofi	2.000.000	0	0	0	---
B.1 - 194	93327072	COLOGNA VENETA	Collettamenti fognari al depuratore per il disinquinamento dell'area Fratta-Gorzone	1.170.000	0	0	0	---
B.1 - 135	93327080	COLOGNA VENETA	Estensione della rete fognaria afferente all'impianto di depurazione di Cologna Veneta	4.980.000	0	0	0	---
B.2 - 15	93327081	COLOGNA VENETA	Potenziamento ed adeguamento del depuratore di Cologna Veneta: 1° stralcio	1.020.000	1.152	0	-1.152	adeguamento post consuntivo 2011
B.1 - 88 C.5 - 30	32281200	COLOGNOLA AI COLLI	Adeguamento di estensione della rete acquedottistica e fognaria	953.872		0	0	---
D.2 - 22	93332080	ERBE'	Interventi urgenti per adeguamento depuratore	91.000	0	0	0	---
B.1 - 197 D.2 - 22 D.1 - 13	93332100	ERBE'	Posa della condotta di fognatura nera in Via XXV Aprile, Via Giacomo Matteotti e dismissione impianto di depurazione di Erbe' per collettamento a Sorgà	587.000	0	30.050	30.050	variazione del budget annuale
B.5 - 15	93332101	ERBE'	Rifacimento reti di fognatura in Via San Giuseppe, Via F.lli Cairoli, Viale Europa, Via XX Settembre	587.313	10.466	0	-10.466	mancate approvazioni
B.1 - 147	93133070	ERBEZZO	Adeguamenti urgenti rete esistente e progetto di completamento della rete fognaria del Comune di Erbezzo	140.000	0	0	0	---
A.1 - 91	93133080	ERBEZZO	Potenziamento e ristrutturazione impianto sistema di adduzione acqua potabile a Cappella Fasani (Comune di Erbezzo)	200.000	28.868	27.907	-961	risparmi



CODICE AATO	CODICE INTERVENTO	COMUNE	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO [€]	ANNO 2012 [€] (App. CdA del 21.03.2012)	INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2012 [€]	SCOSTAMENTO [€]	CAUSE DI SCOSTAMENTO
B.3 - 05	93133100	ERBEZZO	Impianti di depurazione e reti di raccolta ad Erbezzo	200.000	20.909	37.673	16.765	Adeguamento post consuntivo 2011
A.1 - 126	93135080	FUMANE	Estensione rete acquedotto in località Uri a Mazzurega	80.000	0	0	0	---
B.1 - 36 B.5 - 21 C.3 - 08 C.5 - 06	93135100	FUMANE	Adeguamento ed estensione reti fognarie e acquedottistiche	465.400	0	1.000	1.000	Adeguamento post consuntivo 2011
A.1 - 104	93337120	GAZZO VERONESE	Realizzazione della rete idrica a servizio della frazione Maccacari	200.000	0	0	0	---
B.1 - 129 B.1 - 130 B.1 - 133	93337070	GAZZO VERONESE	* Completamento rete fognaria comunale: - via Boschi (353.000€) - via Porto (300.000€) - via Buche Levà di sotto (400.000€)	1.053.000	0	0	0	---
A.1 - 92 C.1 - 105	31381200	GREZZANA	Rifacimento serbatoio "La Costa"	1.661.000	0	0	0	---
B.1 - 33	93138070	GREZZANA	Completamento rete fognaria nelle frazioni di Rosaro, Busoni e Corso	900.000	66.285	65.551	-734	risparmi
B.1 - 16	93138071	GREZZANA	* Fognatura Frazione di Azzago: 2° Stralcio	1.340.000	0	0	0	---
B.1 - 39	93138072	GREZZANA	* Fognatura Frazione di Orsara	200.000	129.303	121.777	-7.526	risparmi
B.1 - 238	93138073	GREZZANA	* Fognatura Frazione di Alcenago - loc. Coda, Vigo, Rupiano	2.500.000	0	0	0	---
A.3 - 06	93138091	GREZZANA	Realizzazione nuovo impianto di rilancio acquedotto in Via Asiago Comune di Grezzana	200.000	0	0	0	---
A.3 - 06	93138100	GREZZANA	Interventi di potabilizzazione Grezzana - Nesente: opere di completamento - Adeguamento centrale di Nesente	150.000	0	0	0	---
A.3 - 06	93138090a	GREZZANA	Interventi di potabilizzazione Grezzana - Nesente: 2° e 3° stralcio (pozzi e sistemazione centrale Nesente; condotta Nesente - Grezzana)	1.154.000	0	0	0	---
A.3 - 06	93138090b	GREZZANA	Interventi di potabilizzazione Grezzana - Nesente: 2° Sub. A	292.000	399	0	-399	risparmi
B.2 - 30	93340081	ISOLA SCALA DELLA	Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a Isola della Scala e collettori di collegamento reti esistenti	4.300.000	4.430	9.369	4.939	Adeguamento post consuntivo 2011



CODICE AATO	CODICE INTERVENTO	COMUNE	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO [€]	ANNO 2012 [€] (App. CdA del 21.03.2012)	INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2012 [€]	SCOSTAMENTO [€]	CAUSE DI SCOSTAMENTO
A.1 - 64	93340082a	ISOLA DELLA SCALA	Realizzazione rete fognaria e acquedottistica in concomitanza alla realizzazione di opere pubbliche	76.610	6.347	0	-6.347	risparmi
B.1 - 169	93340082b	ISOLA DELLA SCALA	Realizzazione rete fognaria e acquedottistica	40.390		0	0	---
B.1 - 145	93341070	ISOLA RIZZA	* Fognature capoluogo	130.000	0	0	0	---
B.1 - 07	93242100	LAVAGNO	Estensione rete fognaria a località San Briccio - 1° stralcio	400.000	0	0	0	---
B.1 - 202	93242101	LAVAGNO	Estensione rete fognaria alla località San Giacomo e adeguamento rete di collettamento a San Martino Buon Albergo: completamento	425.000	15.000	0	-15.000	ritardi su cronoprogramma di realizzazione
B.1 - 202	93242101	LAVAGNO	Estensione rete fognaria alla località San Giacomo e adeguamento rete di collettamento a San Martino Buon Albergo: fognatura Via Monticelli	130.000	35.619	37.360	1.740	adeguamento posto consuntivo 2011
B.1 - 203	93344070	LEGNAGO	* Interventi di adeguamento e completamento della rete fognaria in destra Adige - Porto e località Casette	400.000	0	0	0	---
A.1 - 149	93344071	LEGNAGO	Interventi per risolvere il problema arsenico nell'acqua potabile: completamento rete di distribuzione idrica nel comune di Legnago	4.450.000	81.254	10.685	-70.569	risparmi
B.5 - 16	93146070	MARANO DI VALPOLICELLA	Separazione rete fognatura capoluogo e allacciamenti acquedotto nella frazione di Purano	280.000	657	0	-657	adeguamento post consuntivo 2011
A.1 - 14 B.1 - 50 B.5 - 06 D.2 - 14	93146100	MARANO DI VALPOLICELLA	Adeguamento di reti fognatura e acquedotto	720.500	9.755	1.500	-8.255	ritardi su cronoprogramma di realizzazione
B.1 - 55	93348070	MINERBE	* Fognatura nera area Ovest 2° lotto	725.000	0	0	0	---
B.1 - 55	93348071	MINERBE	Estensione rete fognaria Comune di Minerbe Via Trento, Crosara e Trieste	400.000	0	0	0	---
B.1 - 206	32491200	MONTECCHIA DI CROSARA	Estensione rete fognaria in Via Zaffaini	280.000	0	0	0	---



CODICE AATO	CODICE INTERVENTO	COMUNE	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO [€]	ANNO 2012 [€] (App. CdA del 21.03.2012)	INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2012 [€]	SCOSTAMENTO [€]	CAUSE DI SCOSTAMENTO
B.1 - 206	93249091	MONTECCHIA DI CROSARA	Rifacimento Piazza Frutti	210.000	0	0	0	---
B.4 - 07	93249090	MONTECCHIA DI CROSARA	* Progetto per completamento fognatura consortile 4° lotto E - Vasca di laminazione Montecchia di Crosara_3.900 abitanti attuali (9.600 futuri)	500.000	29.235	20.685	-8.550	ritardi su cronoprogramma di realizzazione
B.5 - 17	93250090	MONTEFORTE D'ALPONE	* Progetto per completamento fognatura consortile 4° lotto F - Vasca di laminazione Monteforte d'Alpone_2.900 abitanti attuali (3.200 futuri)	500.000	28.769	32.467	3.698	adeguamento posto consuntivo 2011
B.1 - 09	93250100	MONTEFORTE D'ALPONE	Adeguamento e potenziamento sistema fognario	217.000	6.988	6.988	0	---
B.1 - 207	93250101	MONTEFORTE D'ALPONE	Estensione rete fognaria in via Molinetto e via Dian	247.200	9.500	47.528	38.028	anticipi su cronoprogramma di realizzazione
B.2 - 44	93251070	MOZZECANE	* Adeguamento del depuratore comunale ai nuovi carichi provenienti dalla rete fognaria di Grezzano e zone limitrofe	850.000	6.422	6.422	0	---
B.1 - 143	93251090	MOZZECANE	* Lavori di realizzazione rete fognaria nella frazione S. Zeno di Mozzecane	150.000	0	0	0	---
B.1 - 208	93251100	MOZZECANE	Fognatura e acquedotto in Via Regina Margherita e acquedotto in altre vie del Comune	790.000	272.964	162.620	-110.344	ritardi su cronoprogramma di realizzazione
B.1 - 15	93152080	NEGRAR	Realizzazione rete fognaria nelle frazioni di Fane e Mazzano e loro collettamento alla rete di Negrar	4.000.000	0	0	0	---
A.1 - 02	93152081	NEGRAR	Estensione rete idrica S. Peretto - 2° e 3° Stralcio	472.000	0	10.998	10.998	adeguamento posto consuntivo 2011
B.1 - 209	93152082	NEGRAR	Realizzazione rete fognaria nelle frazioni di Montecchio e Spigamonte e loro collettamento alla rete di Negrar	2.055.750	0	0	0	---
B.1 - 13	93152090	NEGRAR	Realizzazione rete fognaria in Via Volpare	95.000	0	0	0	---
B.1 - 210	93152100	NEGRAR	Realizzazione rete fognatura di Via Quintarelli in località San Vito e rete idrica in Via Crosara	88.600	5.000	5.269	269	adeguamento posto consuntivo 2011
B.1 - 211	93152101	NEGRAR	Realizzazione rete fognatura di Via Archimede (zona	250.000	0	0	0	---



CODICE AATO	CODICE INTERVENTO	COMUNE	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO [€]	ANNO 2012 [€] (App. CdA del 21.03.2012)	INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2012 [€]	SCOSTAMENTO [€]	CAUSE DI SCOSTAMENTO
			industriale), Via Roverina, Cà Paletta					
B.1 - 51	93152102	NEGRAR	Adeguamento e potenziamento sistema fognario	1.121.100	16.274	1.500	-14.774	ritardi su cronoprogramma di realizzazione
B.2 - 31	33531200	NOGARA	Adeguamento impianto di depurazione	1.875.000	0	0	0	---
B.2 - 31	93353081	NOGARA	Interventi urgenti per adeguamento depuratore	65.000	0	0	0	---
B.2 - 38	93254080	NOGAROLE ROCCA	* Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a Nogarole Rocca e collettori di collegamento reti esistenti: impianto di depurazione	2.110.000	1.424.200	1.387.036	-37.164	ritardi su cronoprogramma di realizzazione
B.2 - 38	93254080	NOGAROLE ROCCA	* Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a Nogarole Rocca e collettori di collegamento reti esistenti: condotte di collegamento	510.000	168.651	121.206	-47.445	ritardi su cronoprogramma di realizzazione
B.2 - 02	33551200	OPPEANO	Adeguamento impianto di depurazione di Casotton	600.000	0	0	0	---
B.2 - 02	93355070	OPPEANO	Potenziamento depuratore di Feniletto nel comune di Oppeano (Potenziamento del sistema di depurazione nelle zone Feniletto e limitrofe nel Comune di Oppeano)	3.608.000	0	0	0	---
B.1 - 177	93355071a	OPPEANO	* Adeguamento e ottimizzazione della rete fognaria: via Bertini, via Bursi, via Cadalora (2° stralcio)	350.000	24.504	0	-24.504	risparmi
B.1 - 177	93355071b	OPPEANO	* Adeguamento e ottimizzazione della rete fognaria: via Sorio		0	0	0	---
A.1 - 108	93355080a	OPPEANO	Realizzazione nuovi tratti rete acquedotto in zone attualmente sprovviste: interventi urgenti in zone contaminate dal Cromo (Via Lino Lovo, Via Salieri)	331.931	0	0	0	---
A.1 - 108	93355080b	OPPEANO	Realizzazione nuovi tratti rete acquedotto in zone attualmente sprovviste: realizzazione nuovi tratti di rete acquedotto nelle vie Bertini, Bursi, Cadalora (1° stralcio)	244.069	0	0	0	---
A.1 - 108	93355080c	OPPEANO	Realizzazione nuovi tratti rete acquedotto in zone attualmente sprovviste: realizzazione nuovi tratti di rete acquedotto nelle vie Boscoriondo, Spineta, Finiletto, Fornello e Franchine	720.000	275.324	14.095	-261.229	ritardi su cronoprogramma di realizzazione



CODICE AATO	CODICE INTERVENTO	COMUNE	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO [€]	ANNO 2012 [€] (App. CdA del 21.03.2012)	INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2012 [€]	SCOSTAMENTO [€]	CAUSE DI SCOSTAMENTO
A.1 - 54	93356100	PALU'	Adeguamento e potenziamento acquedotto	1.400.000	0	1.116	1.116	adeguamento posto consuntivo 2011
B.1 - 31	93258070	PESCANTINA	* Estensione rete fognaria Ospedaletto e Santa Lucia	1.500.000	0	0	0	---
D.2 - 20	93258080	PESCANTINA	Interventi urgenti per adeguamento depuratori Tremolè e Settimo	117.000	0	0	0	---
A.1 - 17	93258100	PESCANTINA	Realizzazione rete idrica e fognaria in Viale Verona	770.000	10.748	0	-10.748	adeguamento post consuntivo 2011
B.2 - 13 D.2 - 42	32601200	POVEGLIANO	Potenziamento impianto di depurazione	3.750.000	0	0	0	---
B.2 - 13	32601210	POVEGLIANO	Depuratore di Povegliano: Interventi di adeguamento funzionale dell'attuale impianto	707.000		24.575	24.575	variazione del budget annuale
D.2 - 46	93260070	POVEGLIANO	* Rifacimento fognatura Via Cavour	201.100	0	0	0	---
B.1 - 163	32631200	RONCA'	Adeguamento e sistemazione rete fognaria nel capoluogo	750.000	0	0	0	---
B.1 - 94 b.1 - 95	93263090	RONCA'	* Progetto per completamento fognatura consortile: 4°lotto C - Collettore fognario allacciamento frazione Terrossa e vasca_1.000 abitanti attuali (2.700 futuri - 803.700€) 4°lotto D - Collettore fognario allacciamento Roncà e vasca_2.300 abitanti attuali (2.900 futuri - 838.700€)	1.642.400	89.318	10.931	-78.387	ritardi su cronoprogramma di realizzazione
B.1 - 179	93364100	RONCO ALL'ADIGE	Estensione rete fognaria in Via della Pozza, Via Crosarona e Via Casetta nel capoluogo e in Via Cà del Sale in frazione Tombasozana	986.000	134.507	179.253	44.746	variazione del budget annuale
B.1 - 08	33651200	ROVERCHIARA	Estensione rete fognaria in Via Bussè	300.000	0	0	0	---
B.1 - 104	93167070	ROVERE' VERONESE	Completamento rete fognaria a servizio del capoluogo e nella frazione di San Rocco di Piegara e San Francesco: fognatura Squarantello	120.000	5.710	4.973	-737	risparmi
B.1 - 104	93167070	ROVERE' VERONESE	Completamento rete fognaria a servizio del capoluogo e nella frazione di San Rocco di Piegara e San Francesco: fognatura San Francesco	180.000	0	0	0	---
B.1 - 137	93368100	SALIZZOLE	Fognature in alcune vie del territorio comunale (nelle Località Bionde, Engazzà, Salizzole, Valmorsel)	1.283.080	0	84.914	84.914	variazione del budget annuale



CODICE AATO	CODICE INTERVENTO	COMUNE	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO [€]	ANNO 2012 [€] (App. CdA del 21.03.2012)	INVESTIMEN TI REALIZZATI AL 31.12.2012 [€]	SCOSTAMEN TO [€]	CAUSE DI SCOSTAMENTO
A.1 - 22	93368101	SALIZZOLE	Estensione reti acquedottistiche e fognarie in alcune vie del capoluogo	200.000	0	0	0	---
B.2 - 45	93269090	SAN BONIFACIO	* Opere di affinamento e disinfezione scarico al depuratore di S. Bonifacio: pretrattamenti + trattamenti terziari	1.500.000	198.315	492.738	294.423	variazione del budget annuale
B.1 - 48	93269100	SAN BONIFACIO	Adeguamento fognature	185.000	58.540	1.765	-56.775	mancate approvazioni
C.2 - 08	93269101	SAN BONIFACIO	Collegamento acquedottistico San Bonifacio - Almisano	2.500.000	0	0	0	---
B.5 - 26	93269070	SAN BONIFACIO	Collettore fognario zona est di alleggerimento della rete di San Bonifacio	4.850.000	2.339	1.483	-856	adeguamento post consuntivo 2011
B.5 - 24	93269071	SAN BONIFACIO	* Collettore fognario zona sud di alleggerimento della rete di San Bonifacio, frazioni di Locare, Lobia e Prova	2.100.000	0	0	0	---
D.2 - 18	93269072	SAN BONIFACIO	* Riqualificazione sistema fognario frazione di Prova	500.000	0	0	0	---
B.5 - 25	93269073	SAN BONIFACIO	* Fognature in Corso Venezia - 4° stralcio	245.000	120.397	0	-120.397	risparmi
B.5 - 12	93269074	SAN BONIFACIO	* Fognatura Via Colombo - Via Pigafetta	250.000	0	0	0	---
B.1 - 166	31701200	SAN GIOVANNI ILARIONE	Completamento ed adeguamento rete fognaria in via Verdi	70.000	0	0	0	---
A.1 - 37	93170110	SAN GIOVANNI ILARIONE	Completamento sistema acquedottistico in aree comunali	50.000	1.000	0	-1.000	risparmi
A.1 - 04 B.1 - 224	93271080	SAN GIOVANNI LUPATOTO	Realizzazione delle reti acquedotto e fognatura in alcune strade del capoluogo attualmente non servite (Acquedotto e fognatura Via Scajole)	1.095.000	974.392	886.747	-87.645	ritardi su cronoprogramma di realizzazione
B.1 - 23 B.1 - 22 B.1 - 224	93271081	SAN GIOVANNI LUPATOTO	* Completamento della rete fognaria nelle Vie: Pacinotti, Apollo XI, Garofoli, Pace Paquara, Porto, Speranza	1.510.000	0	0	0	---
B.2 - 46	93271082	SAN GIOVANNI LUPATOTO	Ottimizzazione ed ampliamento impianto di depurazione da 24.000 a 40.000 AE	3.958.000	16.515	16.432	-83	adeguamento post consuntivo 2011
B.2 - 46	93271083	SAN GIOVANNI LUPATOTO	* Rifacimento comparto disidratazione fanghi dell'impianto di depurazione	260.000	0	0	0	---
B.3 - 09	93273080	SAN MARTINO BUON ALBERGO	Realizzazione rete fognaria nella frazione di Mambrotta: 1°stralcio, condotte piazza (90.545€) 2°stralcio, condotte e impianto depurazione (898.455€)	989.000	6.469	6.157	-312	adeguamento post consuntivo 2011



CODICE AATO	CODICE INTERVENTO	COMUNE	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO [€]	ANNO 2012 [€] (App. CdA del 21.03.2012)	INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2012 [€]	SCOSTAMENTO [€]	CAUSE DI SCOSTAMENTO
A.1 - 09 A.1 - 124	93273081	SAN MARTINO BUON ALBERGO	Realizzazione acquedotto in località Pignatte	150.000	30.748	0	-30.748	risparmi
B.3 - 09	93273100	SAN MARTINO BUON ALBERGO	Realizzazione rete fognaria nella frazione di Mambrotta: opere di completamento	472.000	0	0	0	---
B.1 - 40	93174100	SAN MAURO DI SALINE	Realizzazione collettore fognario a servizio di utenze non servite	100.000	89.881	89.471	-409	risparmi
A.1 - 77	93375080	SAN PIETRO DI MORUBIO	Realizzazione rete acquedotto in zona non servita nella frazione di Bonavicina	30.000	0	0	0	---
B.2 - 11	32761200	SAN PIETRO IN CARIANO	Adeguamento impianto di depurazione	5.000.000	0	0	0	---
B.5 - 27	32761210	SAN PIETRO IN CARIANO	Interventi di adeguamento funzionale dell'attuale impianto	475.000		9.048	9.048	variazione del budget annuale
B.5 - 11	93276090	SAN PIETRO IN CARIANO	Interventi di miglioramento della rete fognaria comunale: Area intervento Cadiloi	700.000	264.970	21.967	-243.003	ritardi su cronoprogramma di realizzazione
B.5 - 11	93276090	SAN PIETRO IN CARIANO	Interventi di miglioramento della rete fognaria comunale: Area intervento Cà dell'Ebreo	700.000	0	0	0	---
B.5 - 11 B.1 - 184	93276090	SAN PIETRO IN CARIANO	Interventi di miglioramento della rete fognaria comunale: Area intervento Villaggio Stella	700.000		0	0	---
C.5 - 53	93276091	SAN PIETRO IN CARIANO	Interventi di miglioramento della rete fognaria comunale: nuovo sfioratore in località Paladon	272.000	0	0	0	---
B.5 - 14	93276100	SAN PIETRO IN CARIANO	Adeguamento ed estensione della rete idrica e fognaria nel capoluogo (sfioratore Valena)	1.238.000	17.672	11.960	-5.712	ritardi su cronoprogramma di realizzazione
B.4 - 14	93372070	SANGUINETTO	* 1°INTERVENTO: Ristrutturazione della rete fognaria del Comune di Sanguinetto - Rifacimento del collettore consortile Boschetti. 2°INTERVENTO: Ristrutturazione rete fognaria - realizzazione di una vasca volano nel Comune di Sanguinetto al servizio del collettore fognario consortile dei comuni ex CO.GE.FO	1.800.000	0	31	31	adeguamento posto consuntivo 2011



CODICE AATO	CODICE INTERVENTO	COMUNE	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO [€]	ANNO 2012 [€] (App. CdA del 21.03.2012)	INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2012 [€]	SCOSTAMENTO [€]	CAUSE DI SCOSTAMENTO
B.3 - 13	31781200	SANT'ANNA D'ALFAEDO	Realizzazione reti fognatura e acquedotto in località Cona	220.000	0	1.550	1.550	adeguamento posto consuntivo 2011
C.3 - 05	93178070	SANT'ANNA D'ALFAEDO	Rifacimento e potenziamento della condotta per l'alimentazione di acqua potabile al paese di S. Anna	975.000	0	0	0	---
B.3 - 12	93178071	SANT'ANNA D'ALFAEDO	Realizzazione impianto di depurazione e relativa rete a servizio della frazione di Vaggimal	400.000	0	0	0	---
B.1 - 44	93178090	SANT'ANNA D'ALFAEDO	Realizzazione rete fognaria nel comune di Sant'Anna d'Alfaedo e zone limitrofe (frazioni Fosse, Ronconi e Vaona)	627.000	19.477	23.877	4.400	adeguamento posto consuntivo 2011
B.3 - 12	93178100	SANT'ANNA D'ALFAEDO	Realizzazione impianto di depurazione e relativa rete a servizio della frazione di Vaggimal - 2° Stralcio	400.000	152.544	116.205	-36.339	risparmi
B.1 - 65	93178101	SANT'ANNA D'ALFAEDO	1° stralcio - collegamento frazione Ronconi	150.000	26.861	19.474	-7.388	risparmi
B.1 - 73	93281080	SOAVE	Ristrutturazione urgente reti fognatura ed acquedotto di Borgo Covreggino e Borgo San Lorenzo	550.000	3.254	1.860	-1.394	risparmi
C.5 - 20	93281110	SOAVE	Rifacimento rete idrica nel quartiere "musicisti" del capoluogo	271.000	168.564	145.992	-22.572	risparmi
B.1 - 77	93281070	SOAVE	* Rifacimento e completamento delle reti di fognatura e acquedotto di C.so Vittorio Emanuele, Via Cangrande e vicoli adiacenti (in concomitanza a intervento su rete gas)	909.728	357	0	-357	risparmi
B.2 - 23 D.2 - 42	32821200	SOMMACAMPAGNA	Impianto di depurazione di Sommacampagna: adeguamento funzionale e ottimizzazione	3.850.000	0	0	0	---
B.2 - 23	93282070	SOMMACAMPAGNA	* Lavori all'impianto di depurazione (completamento per lo scarico al suolo)	500.000	0	0	0	---
B.1 - 43	93282071	SOMMACAMPAGNA	* Realizzazione by-pass del collettore fognario di Sona	620.800	0	0	0	---
A.1 - 07	93282072	SOMMACAMPAGNA	Ottimizzazione impianto rilancio acquedotto Sommacampagna e serbatoio Custoza	452.000	5.031	48	-4.983	risparmi
B.2 - 39 B.1 - 172	93384080	SORGA'	* Realizzazione impianto di depurazione di Sorgà e reti di collettamento	3.414.940	80.000	0	-80.000	ritardi su cronoprogramma di realizzazione



CODICE AATO	CODICE INTERVENTO	COMUNE	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO [€]	ANNO 2012 [€] (App. CdA del 21.03.2012)	INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2012 [€]	SCOSTAMENTO [€]	CAUSE DI SCOSTAMENTO
B.2 - 39	93384081	SORGA'	* Realizzazione impianto di depurazione di Bonferraro e reti di collettamento	1.638.000	60.000	0	-60.000	ritardi su cronoprogramma di realizzazione
D.2 - 45	93388070	TREVENZUOLO	Interventi per l'adeguamento del depuratore in località Fagnano	300.000	0	0	0	---
A.1 - 80	93190100	VELO VERONESE	Estensione rete acquedotto contrada Scrivazzi, Garzon e Tezze	963.086	0	0	0	---
B.1 - 04	93291070	VERONA	* Fognatura Via del Pestrino, fraz. Copella e tratti minori in Verona e Comuni limitrofi	1.100.000	0	3.786	3.786	adeguamento posto consuntivo 2011
B.4 - 16	93291080	VERONA	Interventi urgenti per l'adeguamento del sistema fognario di Veronetta (collettore 8M): 1° stralcio	1.900.000	0	0	0	---
B.2 - 07	93291081	VERONA	* Depuratore "Città di Verona": interventi urgenti	600.000	0	0	0	---
B.2 - 08	93291081	VERONA	Depuratore "Città di Verona": "copertura vasche ossidazione"	1.627.020	609.040	438.797	-170.243	risparmi
B.2 - 47	93291081	VERONA	Adeguamento depuratore - Interventi sulla linea acque	4.885.000	40.000	0	-40.000	mancate approvazioni
B.2 - 43	93291081	VERONA	Adeguamento depuratore Verona - Comparto per il trattamento dei rifiuti liquidi (35.000 AE)	3.057.000	0	0	0	---
B.5 - 31	93291090	VERONA	Adeguamento della rete fognaria di Montorio: 1a fase (intervento urgente per adeguamento sfioratore)	200.000	0	0	0	---
C.5 - 03	93291091	VERONA	Intervento per risolvere il problema dei depositi di sabbia all'utenza nelle zone di Poiano e S. Michele. (Rete acquedotto Verona)	120.000	0	0	0	---
B.1 - 04	93291100	VERONA	Estensione rete fognaria in Via Lazzaretto	500.000	0	0	0	---
B.1 - 04	93291101	VERONA	Estensione rete fognaria in Via Ponte San Pancrazio e in Via 28 Marzo	460.000	445.794	388.636	-57.158	risparmi
B.1 - 04 A.1 - 01	93291102	VERONA	Estensione rete fognaria e potenziamento rete acquedottistica in Via Cà dei Recchi, Via Guerrieri e Via Brigata Casale	458.000	0	0	0	---
A.1 - 01	93291103	VERONA	Potenziamento rete acquedotto località Trezzolano	249.000	19.560	42.020	22.460	anticipi su cronoprogramma di realizzazione



CODICE AATO	CODICE INTERVENTO	COMUNE	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO [€]	ANNO 2012 [€] (App. CdA del 21.03.2012)	INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2012 [€]	SCOSTAMENTO [€]	CAUSE DI SCOSTAMENTO
B.1 - 04	93291110	VERONA	Risanamento collettore fognario di Via Faccio	2.600.000	0	0	0	---
C.5 - 21 C.1 - 05	93291111	VERONA	Spostamento serbatoio "Terza torre Massimiliana"	800.000	0	0	0	---
B.1 - 236	93392100	VERONELLA	Fognature nelle Vie Desmontà, Lavagnoli, Fornasa, Stradon, San Marcello, Giamone e nella frazione Miega	2.391.500	0	9.358	9.358	variazione del budget annuale
A.1 - 154	31931300	VESTENANOVA	Rete fognaria e vasca Imhoff a servizio della Contrada Zovo nel Comune di Vestenanova	130.000		3.640	3.640	adeguamento posto consuntivo 2011
A.1 - 44	93193070	VESTENANOVA	Completamento acquedotto ed adeguamento fognatura in località del capoluogo sprovviste di rete: acquedotto Barco	145.000	0	0	0	---
A.1 - 154	93193070	VESTENANOVA	Completamento acquedotto ed adeguamento fognatura in località del capoluogo sprovviste di rete: fognatura Mainenti	108.857	945	6.854	5.909	adeguamento posto consuntivo 2011
D.2 - 35	33941200	VIGASIO	Interventi di adeguamento funzionale dell'attuale impianto	275.000		15.982	15.982	variazione del budget annuale
D.2 - 35 D.2 - 42	93394070	VIGASIO	* Adeguamento funzionale del depuratore comunale del capoluogo	515.000	0	0	0	---
D.2 - 30	93394090	VIGASIO	* Rifacimento linea fognaria Via Villafranca	180.000	0	0	0	---
B.1 - 181	93395070	VILLA BARTOLOMEA	* Completamento fognature nel capoluogo - 2° stralcio	385.000	0	0	0	---
A.1 - 52	93395071	VILLA BARTOLOMEA	Collegamento idrico Legnago-Villa Bartolomea (capoluogo)	1.500.000	0	89.460	89.460	variazione del budget annuale
B.1 - 237	93296070	VILLAFRANCA DI VERONA	* Riqualificazione via Quadrato - per fognatura	579.916	0	0	0	---
B.1 - 237	93296071	VILLAFRANCA DI VERONA	* Realizzazione rete fognaria in loc. Pozzomoreto	700.000	0	0	0	---
B.1 - 237	93296100	VILLAFRANCA DI VERONA	Fognature in varie vie sprovviste di rete	2.639.000	77.224	45.405	-31.819	ritardi su cronoprogramma di realizzazione
B.2 - 06	33971200	ZEVIO	Depuratore di Zevio, Tre Corone: interventi di adeguamento funzionale dell'attuale impianto	175.000		10.620	10.620	variazione del budget annuale



CODICE AATO	CODICE INTERVENTO	COMUNE	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO [€]	ANNO 2012 [€] (App. CdA del 21.03.2012)	INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2012 [€]	SCOSTAMENTO [€]	CAUSE DI SCOSTAMENTO
B.2 - 06	93397070	ZEVIÒ	Interventi per l'adeguamento del depuratore in località Tre Corone	300.000	0	0	0	---
B.1 - 03	93397090	ZEVIÒ	Ristrutturazione della rete di fognatura comunale - 1° stralcio	483.000	3.194	0	-3.194	risparmi
B.1 - 148	93397091	ZEVIÒ	Ristrutturazione della rete di fognatura comunale - 4° stralcio	263.000	0	0	0	---
B.1	34991200	PIU' COMUNI	Progettazione adeguamento rete fognaria secondo quanto previsto dalla direttiva 2000/60/CE (copertura agglomerati soggetti ad infrazione)	26.000.000	0	0	0	---
B.4 - 08	34991210	PIU' COMUNI	Adeguamento degli sfioratori di piena a servizio delle reti fognarie miste secondo quanto previsto all'Art.33 del PTA Veneto: presso impianti di depurazione	3.420.000	0	0	0	---
A.3	93400104	PIU' COMUNI	Interventi urgenti su impianti di potabilizzazione	839.500	6.263	0	-6.263	adeguamento post consuntivo 2011
D.2	93400110	PIU' COMUNI	Interventi urgenti ottimizzazione impianti di depurazione	21.537	4.561	0	-4.561	adeguamento post consuntivo 2011
B.4 - 08	93400123	PIU' COMUNI	Adeguamento degli sfioratori di piena a servizio delle reti fognarie miste secondo quanto previsto all'Art.33 del PTA Veneto: sulla rete fognaria	16.800.000	0	21.000	21.000	variazione del budget annuale
C.4 - 04	93300070	PIU' COMUNI ⁸	Interventi per rifacimento rete idrica in Albaredo, Arcole, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S.A., Cologna V., Legnago, Minerbe, Pressana, Roveredo, Veronella, Zimella - 1° e 2° Stralcio	1.868.337	0	0	0	---
A.1 - 152	93300071	PIU' COMUNI ⁹	Interventi per estensione rete idrica in Albaredo, Arcole, Bonavigo, Boschi S.A., Cologna V., Legnago, Minerbe, Pressana, Roveredo, Terrazzo, Veronella, Zimella - 1° Stralcio	1.201.663	0	0	0	---
B.2 - 27	93300072	PIU' COMUNI ¹⁰	Completamento seconda fase schema fognario consortile (4° lotto)	700.000	0	0	0	---

⁸ ALBAREDO, ARCOLE, BEVILACQUA, BONAVIGO, BOSCHI S.A., COLOGNA V., LEGNAGO, MINERBE, PRESSANA, ROVEREDO, VERONELLA, ZIMELLA

⁹ ALBAREDO, ARCOLE, BONAVIGO, BOSCHI S.A., COLOGNA V., LEGNAGO, MINERBE, PRESSANA, ROVEREDO, TERRAZZO, VERONELLA, ZIMELLA

¹⁰ ARCOLE, BEVILACQUA, BONAVIGO, BOSCHI S.A., MINERBE, TERRAZZO



CODICE AATO	CODICE INTERVENTO	COMUNE	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO [€]	ANNO 2012 [€] (App. CdA del 21.03.2012)	INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2012 [€]	SCOSTAMENTO [€]	CAUSE DI SCOSTAMENTO
B.5 - 19	93100070	PIU' COMUNI ¹¹	* Rifacimento del collettore fognario Valpantena	14.000.000	307.000	252.933	-54.067	ritardi su cronoprogramma di realizzazione
B.3 - 08 D.2 - 02	93167100	ROVERE' VERONESE + VELO VERONESE	Adeguamento fognario e depurativo dei due capoluoghi	250.000	157.735	106.000	-51.735	ritardi su cronoprogramma di realizzazione
A.1 - 132	33991200	PIU' COMUNI ¹²	Estensione rete acquedotto nei Comuni di Nogara e Gazzo Veronese - 1° stralcio - Nogara	1.144.000	0	34.312	34.312	variazione del budget annuale
A.1 - 132 A.2 - 47	33991201	PIU' COMUNI ⁷	Estensione rete acquedotto nei Comuni di Nogara e Gazzo Veronese - 2° stralcio - Potenziamento adduzione	4.480.000	0	0	0	---
A.1 - 104	93337110	PIU' COMUNI ⁷	Estensione rete acquedotto nei Comuni di Nogara e Gazzo Veronese - 3° stralcio - Gazzo Veronese	2.876.000	0	0	0	---
A.1 - 150	93353070	NOGARA+GAZZO VERONESE	Lavori di ripristino della funzionalità degli acquedotti dei comuni di Nogara e Gazzo: 3° Stralcio (CISI)	1.150.000	0	0	0	---
A.1 - 150	93353080	NOGARA+GAZZO VERONESE	Lavori di ripristino della funzionalità degli acquedotti dei comuni di Nogara e Gazzo: 2° Stralcio (CISI)	850.000	0	0	0	---
C.5 - 02	92400090	PIU' COMUNI	Adeguamenti a livello di esercizio minimo e ottimizzazione reti e impianti acquedotto	6.389.162	220.000	657.018	437.018	interventi straordinari per emergenza
D.2 - 40	92400090	PIU' COMUNI	Adeguamenti a livello di esercizio minimo e ottimizzazione reti e impianti fognatura/depurazione	9.503.919	60.000	932.783	872.783	interventi straordinari per emergenza
C.5 - 02	92400091	PIU' COMUNI	Messa a norma inerenti la sicurezza degli impianti acquedotto	3.197.863	200.000	116.945	-83.055	adeguamento post consuntivo 2011
D.2 - 40	92400091	PIU' COMUNI	Messa a norma inerenti la sicurezza degli impianti fognatura/depurazione	5.129.936	161.735	106.921	-54.814	adeguamento post consuntivo 2011

¹¹ BOSCO CHIESANUOVA, CERRO VERONESE, ERBEZZO, GREZZANA, SANT'ANNA D'ALFAEDO

¹² ISOLA DELLA SCALA+NOGARA+GAZZO



CODICE AATO	CODICE INTERVENTO	COMUNE	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO [€]	ANNO 2012 [€] (App. CdA del 21.03.2012)	INVESTIMEN TI REALIZZATI AL 31.12.2012 [€]	SCOSTAMEN TO [€]	CAUSE DI SCOSTAMENTO
E.2 - 03 F.2 - 02	92400093	PIU' COMUNI	Sistemi di telecontrollo su impianti acquedotto - fognatura - depurazione	1.881.785	2.760	2.670	-90	risparmi
T.1	92400110	PIU' COMUNI	Allacciamenti	19.730.389	2.317.623	1.807.228	-510.395	adeguamento post consuntivo 2011
A.1	92400111	PIU' COMUNI	Interventi di pianificazione territoriale: estensioni e potenziamenti acquedotto concomitanti a interventi per nuove lottizzazioni e/o in concomitanza ad interventi di altri enti	1.263.857	6.553	195.853	189.301	adeguamento posto consuntivo 2011
B.1	92400111	PIU' COMUNI	Interventi di pianificazione territoriale: estensioni e potenziamenti fognatura concomitanti a interventi per nuove lottizzazioni e/o in concomitanza ad interventi di altri enti	782.244	204.299	45.087	-159.213	adeguamento post consuntivo 2011
C.5 - 02	92400112	PIU' COMUNI	Situazioni di potenziale pericolo per la salute pubblica e danno all'ambiente: interventi acquedotto	2.289.226	390.004	225.647	-164.357	ritardi su cronoprogramma di realizzazione
D.2 - 40	92400112	PIU' COMUNI	Situazioni di potenziale pericolo per la salute pubblica e danno all'ambiente: interventi fognatura/depurazione	3.863.084	557.739	466.036	-91.703	ritardi su cronoprogramma di realizzazione
S.1	92400092	PIU' COMUNI	Apparecchiature e strumentazione per sedi periferiche	342.044	1.005	12.129	11.124	adeguamento posto consuntivo 2011
F.1 - 02	91400070	PIU' COMUNI	Rilevamento in campo e costruzione SIT infrastrutture fognarie	2.016.711	0	9.000	9.000	adeguamento posto consuntivo 2011
C.4 - 03	91400071	PIU' COMUNI	Attività Monitoraggio, controllo, ricerca perdite reti ed impianti acquedotto	426.837	0	0	0	- - -
F.4 - 02	91400071	PIU' COMUNI	Attività Monitoraggio, controllo, ricerca infiltrazioni reti ed impianti fognatura/depurazione	560.622	25.000	0	-25.000	variazione del budget annuale
E.2 - 03 F.2 - 02	91500080	PIU' COMUNI	Sistemi di automazione e telecontrollo - nucleo operativo di controllo	1.804.550	4.500	120.376	115.876	variazione del budget annuale
S.1	91500070	PIU' COMUNI	Investimenti immateriali	2.381.855	25.000	0	-25.000	adeguamento post consuntivo 2011
S.1	91500073	PIU' COMUNI	Sistemi informativi e gestionali sede centrale e sedi periferiche	2.450.397	185.000	199.817	14.817	adeguamento posto consuntivo 2011



CODICE AATO	CODICE INTERVENTO	COMUNE	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO [€]	ANNO 2012 [€] (App. CdA del 21.03.2012)	INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2012 [€]	SCOSTAMENTO [€]	CAUSE DI SCOSTAMENTO
S.1	91500081	PIU' COMUNI	Implementazione e sostituzione strumentazione laboratorio analisi per controllo qualità del prodotto	1.125.467	70.000	118.415	48.415	variazione del budget annuale
S.1	91400090	PIU' COMUNI	Qualità Ambiente e Sicurezza	1.044.887	110.000	112.758	2.758	adeguamento posto consuntivo 2011
S.1	91500090	PIU' COMUNI	Adeguamento strutture, arredi e strumentazioni sedi periferiche	1.083.065	39.030	21.578	-17.452	risparmi
S.1	91400092	PIU' COMUNI	Studi dei sistemi acquedottistici e fognari connessi all'ottimizzazione degli investimenti, all'ottimizzazione della gestione del servizio, ed ai rischi igienico-sanitari e ambientali	402.465	25.000	10.000	-15.000	risparmi
SOMMANO				312.608.370	12.264.999	11.715.316	-549.683	

ALLEGATO 3: SINTESI DEGLI INTERVENTI CONCLUSI NELL'ANNO 2012

COMUNE	CODICE AATO	INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO [€]	IMPORTO CHIUSURA [€]
ALBAREDO D'ADIGE	B.1 - 57	Realizzazione rete idrica e fognaria in zone sprovviste all'interno del capoluogo: fognatura Viale Europa	125.000	115.557
BELFIORE	B.1 - 161	Estensione rete fognaria a zone non servite e collettamento al depuratore di Belfiore	168.000	134.847,61
BONAVIGO	B.1 - 63	Estensione rete fognaria in zone attualmente non servite	150.000	93.238,58
BOSCHI SANT'ANNA	B.1 - 62	Estensione rete fognaria in zone attualmente non servite	300.000	230.931,31
BOSCO CHIESANUOVA	A.1 - 112	Ristrutturazione impianto Villa Ponti (acquedotto della Lessinia) e potenziamento del sistema di distribuzione di acqua potabile del Comune di Bosco	503.028	497.279,91
CAZZANO DI TRAMIGNA	A.1 - 39	Potenziamento dell'acquedotto del capoluogo ed allacciamento delle contrade Monti, Campiano e Caltrani	400.000	364.338,17
ERBEZZO	A.1 - 91	Potenziamento e ristrutturazione impianto sistema di adduzione acqua potabile a Cappella Fasani (Comune di Erbezzo)	200.000	196.489,44
GREZZANA	B.1 - 33	Completamento rete fognaria nelle frazioni di Rosaro, Busoni e Corso	900.000	898.830,38
LEGNAGO	A.1 - 149	Interventi per risolvere il problema arsenico nell'acqua potabile: completamento rete di distribuzione idrica nel comune di Legnago - 1° stralcio - via Batorcolo	4.450.000	67.671,67
NOGAROLE ROCCA	B.2 - 38	* Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a Nogarole Rocca e collettori di collegamento reti esistenti: condotte di collegamento	510.000	413.490,21
OPPEANO	B.1 - 177	* Adeguamento e ottimizzazione della rete fognaria	350.000	325.496
OPPEANO	B.1 - 177	Realizzazione nuovi tratti di rete acquedotto in località Cà degli Oppi (1° stralcio)	244.069	202.139
POVEGLIANO	D.2 - 46	* Rifacimento fognatura Via Cavour	201.100	219.073,13
SAN BONIFACIO	B.5 - 25	* Fognature in Corso Venezia - 4° stralcio	245.000	121.675,33
SANT'ANNA D'ALFAEDO	B.1 - 44	Realizzazione rete fognaria nel comune di Sant'Anna d'Alfaedo e zone limitrofe (frazioni Fosse, Ronconi e Vaona)	627.000	624.644,38
SOAVE	B.1 - 77	* Rifacimento e completamento delle reti di fognatura e acquedotto di C.so Vittorio Emanuele, Via Cangrande e vicoli adiacenti (in concomitanza a intervento su rete gas)	909.728	791.853,72

COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE

REALIZZAZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA IN ZONE SPROVVISTE ALL'INTERNO DEL CAPOLUOGO: FOGNATURA VIALE EUROPA

Descrizione intervento: Posa di un nuovo tratto di fognatura nera a gravità lungo viale Europa non servita da tale servizio; l'intervento include lo spostamento dei sottoservizi esistenti.

Direzione Lavori: ing. Mirco Sparesotto.

Progetto: a firma dell'ing. Marco Sparesotto e dell'ing. Alessandro Giacopuzzi dello studio SP ingegneria.

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.).

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 115.556,64 (IVA esclusa) che risulta inferiore di € 9.443,36 (IVA esclusa) rispetto l'importo complessivo di € 125.000,00 previsti nel Piano Operativo Triennale di Acque Veronesi.

Contributi: non sono previsti contributi.

Approvazioni: con determinazione n. 59 del 25.01.2012 il Direttore Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e la relazione del R.U.P. sul conto economico finale dei lavori.

Tempistica: i lavori sono iniziati il 28.02.2011 e sono stati ultimati il 26.09.2011.

Collaudo: Essendo l'intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dall'ing. Marco Sparesotto in data 13.12.2011.

Codice POT: 93302080

Codice PdA2011: B.1 – 57



COMUNE DI BELFIORE

ESTENSIONE RETE FOGNARIA A ZONE NON SERVITE E COLLETTAMENTO AL DEPURATORE DI BELFIORE

Descrizione intervento: realizzazione di un tratto di rete di fognatura nera lungo via Casoni, via Buggia e via Strà che risultano sprovviste del servizio di collettamento fognario.

Direzione Lavori: ing. Roberto Penazzi.

Progetto: a firma dell'ing. Roberto Penazzi.

RUP: geom. Luigi Citron (Comune di Belfiore).

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 134.847,61 (IVA esclusa) che risulta inferiore di € 33.152,39 (IVA esclusa) rispetto l'importo complessivo di €168.000,00 previsti nel Piano Operativo Triennale di Acque Veronesi.

Contributi: con DGR 4177 del 30.12.2005 la Regione Veneto ha stanziato un contributo pari a 300.000€ (di cui 193.873,00 a beneficio del comune di Belfiore ed €106.127,00 a disposizione di Acque Veronesi), confermato dai successivi decreti n.83/2007, n.28/2011 e n.5/2012.

Approvazioni: con determinazione n. 475 del 14.06.2012 il Direttore Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e la relazione acclarante dei lavori in oggetto.

Tempistica: i lavori sono iniziati il 31.01.2012 e sono stati ultimati il 27.04.2012.

Collaudo: Essendo l'intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dall'ing. Roberto Penazzi in data 05.06.2012.

Codice POT: 93207090

Codice PdA2011: B.1 – 161



COMUNE DI BONAVIGO

ESTENSIONE RETE FOGNARIA IN ZONE ATTUALMENTE NON SERVITE

Codice POT: 93309090

Codice PdA2011: B.1 – 63

Descrizione intervento: realizzazione nuove tratte di rete fognatura nera in via Pilastro che risulta sprovvista del servizio di collettamento reflui.

Direzione Lavori: ing. Gianluca Ferrari.

Progetto: a firma dell'ing. Gianluca Ferrari.

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.).

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 93.238,58 (IVA esclusa) che risulta inferiore di €56.761,42 (IVA esclusa) rispetto l'importo complessivo di €150.000,00 previsti nel Piano Operativo Triennale di Acque Veronesi.

Contributi: non sono previsti contributi.

Approvazioni: con determinazione n. 1117 del 28.12.2012 il Direttore Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e la relazione del R.U.P. sul conto economico finale dei lavori in oggetto.

Tempistica: i lavori sono iniziati il 28.03.2011 e sono stati ultimati il 18.07.2011.

Collaudo: Essendo l'intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dall'ing. Gianluca Ferrari in data 30.11.2011.



COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA

ESTENSIONE RETE FOGNARIA IN ZONE ATTUALMENTE NON SERVITE

Descrizione intervento: realizzazione della rete di fognatura nera (parte a gravità e parte in pressione) lungo via Belfiore e via Olmo che risultano sprovviste del servizio di collettamento reflui. L'intervento include la messa in opera di un nuovo impianto di sollevamento.

Direzione Lavori: ing. Tiziano Dal Corso.

Progetto: a firma dell'ing. Tiziano Dal Corso dello studio EarthPlan.

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.).

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 230.931,31 (IVA esclusa) che risulta inferiore di € 69.068,69 (IVA esclusa) rispetto l'importo complessivo di € 300.000,00 previsti nel Piano Operativo Triennale di Acque Veronesi.

Contributi: con DGR 4265 del 28.12.2006 la Regione Veneto ha stanziato un contributo pari a 100.000€, confermato dai successivi decreti n. 64/2009 e n.217/2011.

Approvazioni: con determinazione n. 1049 del 07.12.2012 il Direttore Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e la relazione acclarante del R.U.P. relativi ai lavori in oggetto.

Tempistica: i lavori sono iniziati il 08.05.2012 e sono stati ultimati il 10.10.2012.

Collaudo: Essendo l'intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dall'ing. Tiziano Dal Corso in data 04.12.2012.

Codice POT: 93310090

Codice PdA2011: B.1 – 62



COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA

RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO VILLA PONTI (ACQUEDOTTO DELLA LESSINIA) E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE DEL COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA

Descrizione intervento: Potenziamento dell'acquedotto a servizio del centro abitato di Bosco Chiesanuova, tramite posa di due nuovi tratti di condotte e rinnovamento del serbatoio denominato "Villa Ponti" sito a monte della rete acquedottistica interessata. I lavori sono stati realizzati in due stralci funzionali.

Direzione Lavori: ing. Massimo Merzari (primo stralcio), ing. Silvano Rossato (secondo stralcio).

Progetto: a firma dell'ing. Massimo Merzari dello studio Inthec.

RUP: ing. Giovanni Sala.

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 497.279,91 (IVA esclusa) che risulta inferiore di € 4.720,09 (IVA esclusa) rispetto l'importo complessivo di € 502.000,00 previsti nel Piano Operativo Triennale di Acque Veronesi.

Contributi: non sono previsti contributi.

Approvazioni: con determinazione n. 323 del 24.04.2012 il Direttore Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e la relazione del R.U.P. sul conto economico finale dei lavori in oggetto.

Tempistica: i lavori relativi al primo stralcio funzionale sono iniziati il 07.07.2009 e sono stati ultimati il 19.05.2010, mentre quelli relativi al secondo stralcio funzionale sono iniziati il 09.10.2009 e sono stati ultimati in data 03.06.2010.

Collaudo: il certificato di regolare esecuzione relativo al primo stralcio funzionale è stato rilasciato dall'ing. Massimo Merzari in data 24.06.2010, mentre per il secondo stralcio funzionale è stato rilasciato dall'ing. Silvano Rossato in data 02.08.2010.

Codice POT: 93111081

Codice PdA2011: A.1 – 112



COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA

POTENZIAMENTO DELL'ACQUEDOTTO DEL CAPOLUOGO ED ALLACCIAMENTO DELLE CONTRADE MONTI, CAMPIANO E CALTRANI

Descrizione intervento: realizzazione di alcune opere per il potenziamento dello schema acquedottistico del comune, al fine di garantire l'approvvigionamento idrico alle frazioni poste a quote elevate, e raggiungere le località di Caltrano, Marsiglio, Monti, Soraighe prima sprovviste del servizio.

Direzione Lavori: ing. Giovanni Crosara e ing. Riccardo Ballerini

Progetto: a firma dell'ing. Giovanni Crosara e dall'ing. Riccardo Ballerini.

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.).

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 364.338,17 (IVA esclusa) che risulta inferiore di € 35.661,83 (IVA esclusa) rispetto l'importo complessivo di € 400.000,00 previsti nel Piano Operativo Triennale di Acque Veronesi.

Contributi: non sono previsti contributi.

Approvazioni: con determinazione n. 437 del 01.06.2012 il Direttore Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e la relazione generale del R.U.P. relativi lavori in oggetto.

Tempistica: i lavori sono iniziati il 24.11.2009 e sono stati ultimati il 22.07.2011.

Collaudo: Essendo l'intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore Lavori in data 26.01.2012.

Codice POT: 93224080

Codice PdA2011: A.1 – 39



COMUNE DI ERBEZZO

POTENZIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SISTEMA DI ADDUZIONE ACQUA POTABILE A CAPPELLA FASANI

Descrizione intervento: Potenziamento e ristrutturazione dell'intero sistema di adduzione di acqua potabile alla frazione Cappella Fasani, mediante l'aumento dell'alimentazione dal serbatoio Chiomati e contemporanea dismissione della linea ad ovest del serbatoio Jacopo.

Direzione Lavori: ing..

Progetto: a firma dell'ing. Carmelo Dellisanti dello Studio Pragma Engineering.

RUP: ing. Giovanni Sala.

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 196.489,44 (IVA esclusa) che risulta inferiore di € 3.510,56 (IVA esclusa) rispetto l'importo complessivo di € 200.000,00 previsti nel Piano Operativo Triennale di Acque Veronesi.

Contributi: non sono previsti contributi.

Approvazioni: con determinazione n. 481 del 15.06.2012 il Direttore Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e la relazione del R.U.P. sul conto economico finale dei lavori in oggetto.

Tempistica: i lavori relativi sono iniziati il 06.06.2011 e sono stati ultimati il 01.02.2012.

Collaudo: il certificato di regolare esecuzione è stato rilasciato dall'ing. Alessandra Ferrara in data 13.04.2012.

Codice POT: 93133080

Codice PdA2011: A.1 - 91



COMUNE DI GREZZANA

COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA NELLE FRAZIONI DI ROSARO, BUSONI E CORSO

Descrizione intervento: L'intervento è stato diviso in due stralci; il primo per il collegamento della rete fognaria nera esistente al collettore fognario della Valpantena recapitante al depuratore di Verona. Il secondo per il completamento della rete di fognatura nera in frazione Rosaro, frazione Macchielli e realizzazione di 4 nuove vasche imhoff.

Direzione Lavori: ing. Antonio Tucci

Progetto: a firma dell'ing. Antonio Tucci del Centro Studi Progetti S.p.A.

RUP: ing. Giovanni Sala.

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 898.830,38 (IVA esclusa) che risulta inferiore di € 1.169,62 (IVA esclusa) rispetto l'importo complessivo di € 900.000,00 previsti nel Piano Operativo Triennale di Acque Veronesi.

Contributi: con DGR 4253 del 28.12.2006 la Regione Veneto ha stanziato un contributo pari a 900.000€, confermato dai successivi decreti n. 64/2009 e n.49/2012.

Approvazioni: con determinazione n. 1050 del 07.12.2012 il Direttore Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e la relazione acclarante dei lavori in oggetto.

Tempistica: i lavori relativi sono iniziati il 03.11.2009 e sono stati ultimati il 11.06.2011.

Collaudo: Il certificato di collaudo è stato rilasciato dall'ing. Carlo Fortini in data 25.11.2011.

Codice POT: 93138070

Codice PdA2011: A.1-33



COMUNE DI LEGNAGO

INTERVENTI PER RISOLVERE IL PROBLEMA ARSENICO NELL'ACQUA POTABILE: COMPLETAMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE IDRICA NEL COMUNE DI LEGNAGO: 1°STRALCIO - VIA BATORCOLO

Descrizione intervento: realizzazione di una nuova condotta acquedottistica lungo via Batorcolo. L'intervento costituisce stralcio di un progetto più ampio che prevede l'estensione del servizio idrico a zone non servite nel comune di Legnago, al fine di ovviare al problema della presenza di Arsenico rilevato nel sistema di approvvigionamento idrico privato degli utenti non ancora raggiunti dal servizio di pubblico acquedotto.

Direzione Lavori: ing. Riccardo Ballerini

Progetto: a firma dell'ing. Giovanni Crosara e dell'ing. Riccardo Ballerini studio Crosara-Ballerini

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.).

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 67.671,67 (IVA esclusa) che risulta inferiore di € 32.328,33 (IVA esclusa) rispetto l'importo complessivo di €100.000,00 previsti nel Piano Operativo Triennale di Acque Veronesi.

Contributi: non sono previsti contributi.


Approvazioni: con determinazione n. 119 del 28.12.2012 il Direttore Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e la relazione del R.U.P. sul conto economico finale dei lavori in oggetto.

Tempistica: i lavori sono iniziati il 05.12.2011 e sono stati ultimati il 18.09.2012.

Collaudo: Essendo l'intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dall'ing. Riccardo Ballerini e dall'ing. Giovanni Crosara in data 19.11.2012.

Codice POT: 93344071

Codice PdA2011: A.1 - 149

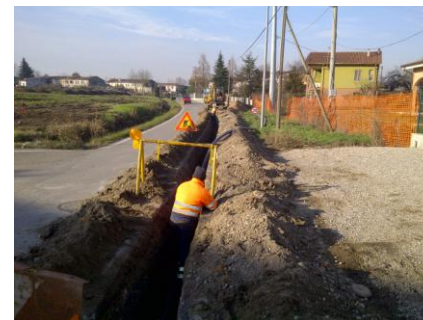

COMUNE DI NOGAROLE ROCCA

COSTRUZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE A NOGAROLE ROCCA E COLLETTORI DI COLLEGAMENTO RETI ESISTENTI: CONDOTTE DI COLLEGAMENTO – 1°STRALCIO

Descrizione intervento: realizzazione delle opere di collegamento delle reti fognarie esistenti al nuovo depuratore (opere 2°stralcio) previsto in località Pradelle.

Direzione Lavori: ing. Alberto Galli.

Progetto: a firma dell'ing. Alberto Galli e ing. Massimo Parravicini dello Studio Galli Ingegneria S.p.A.

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.).

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 413.490,21 (IVA esclusa) che risulta inferiore di € 66.509,79 (IVA esclusa) rispetto l'importo complessivo di € 480.000,00 previsti nel Piano Operativo Triennale di Acque Veronesi.

Contributi: non sono previsti contributi.

Approvazioni: con determinazione n. 1116 del 28.12.2012 il Direttore Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e la relazione del R.U.P. sul conto economico finale dei lavori in oggetto.

Tempistica: i lavori sono iniziati il 13.09.2011 e sono stati ultimati il 26.06.2011.

Collaudo: Essendo l'intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dall'ing. Alberto Galli in data 23.10.2012.

Codice POT: 93254080

Codice PdA2011: B.2 - 38



COMUNE DI OPPEANO

ADEGUAMENTO E OTTIMIZZAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA E ACQUEDOTTO IN ALCUNE VIE DI LOCALITA' CA' DEGLI OPPI

Descrizione intervento: posa di tratti di rete acquedottistica in via delle Corti, via Busona e via Bertini e realizzazione di nuove condotta di fognatura nera lungo via Bursi, via Cadalora, via Sorio, via Bertini. I lavori sono stati realizzati in due stralci funzionali, e, in parte, in concomitanza ad opere di riqualificazione stradale promosse dal Comune, al fine di ridurre i costi ed i tempi dei lavori di manomissione e ripristino stradale.

Direzione Lavori: ing. Mirco Sparesotto (1° stralcio) e arch. Filippo Bricolo (2° stralcio)

Progetto: a firma dell'ing. Mirco Sparesotto dello studio SP Ingegneria (1° stralcio) e dell'arch. Filippo Bricolo dello studio Bricolo Falsarella associati (2° stralcio)

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.).

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 527.635 (IVA esclusa) di cui € 170.975 per i lavori di 1° stralcio fognatura ed € 356.660€ relativi al 2° stralcio (acquedotto + fognatura).

Contributi: non sono previsti contributi

Approvazioni: il Direttore Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e la relazione del R.U.P. sul conto economico finale dei lavori in oggetto per i lavori di 1° e 2° stralcio rispettivamente con determinazione n. 533 del 29.06.2012 e n. 578 del 11.07.2012.

Tempistica: i lavori relativi al 1° stralcio sono iniziati il 27.05.2009 e sono stati ultimati il 12.09.2011, mentre quelli del 2° stralcio sono stati avviati il 27.05.2009 e conclusi 12.09.2011.

Collaudo: Essendo gli interventi inferiori a € 500.000,00, i certificati di collaudo sono sostituiti dai certificati di regolare esecuzione rilasciati dall'ing. Mirco Sparesotto in data 08.02.2012 e dall'arch. Filippo Bricolo in data 20.03.2012 rispettivamente per il 1° e 2° stralcio.

Codice POT: 93355071 - 93355080a – 93355080b

Codice PdA2011: A.1 – 108 e B.1 - 177



COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE

RIFACIMENTO FOGNATURA IN VIA CAVOUR

Descrizione intervento: conversione dell'esistente rete mista in nuova rete separata per acque nere.

Direzione Lavori: ing. Giorgio Sterzi

Progetto: a firma dell'ing. Giorgio Sterzi dello Studio Ingegneria Sterzi.

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.).

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 219.073,13 (IVA esclusa) che risulta superiore di € 17.973,13 (IVA esclusa) rispetto l'importo complessivo di € 201.100,00 previsti nel Piano Operativo Triennale di Acque Veronesi. Le maggiori spese hanno trovato copertura nella voce del Piano Operativo "Situazioni di potenziale pericolo per la salute pubblica e danno all'ambiente"

Contributi: non sono previsti contributi.

Approvazioni: con determinazione n. 38 del 16.01.2012 il Direttore Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e la relazione del R.U.P. sul conto economico finale dei lavori in oggetto.

Tempistica: i lavori sono iniziati il 13.07.2009 e sono stati ultimati il 11.08.2011.

Collaudo: Essendo l'intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dall'ing. Giorgio Sterzi in data 11.11.2011.

Codice POT: 93260070 e 92400112

Codice PdA2011: D.2 - 46



COMUNE DI SAN BONIFACIO

LAVORI DI FOGNATURA IN CORSO VENEZIA – 4°STRALCIO

Descrizione intervento: rifacimento della fognatura in un tratto di Corso Venezia al fine di concludere l'opera iniziata dal comune di San Bonifacio (precedente gestore del Servizio Idrico Integrato). L'intervento, che prevede la separazione della rete mista, ha visto la compartecipazione del Comune che ha finanziato la quota dei lavori relativi al collettamento delle acque meteoriche.

Direzione Lavori: arch. Fabio Beltrame.

Progetto: a firma dell'ing. Daniele Rinaldo.

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.).

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 186.675,33 (IVA esclusa di cui 65.000€ a carico del comune di San Bonifacio) che risulta inferiore di € 123.324,67 (IVA esclusa) rispetto l'importo complessivo di € 310.000,00 previsti nel Piano Operativo Triennale di Acque Veronesi.

Contributi: non sono previsti contributi.

Approvazioni: con determinazione n. 744 del 12.09.2012 il Direttore Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e la relazione del R.U.P. sul conto economico finale dei lavori in oggetto.

Tempistica: i lavori sono iniziati il 24.05.2011 e sono stati ultimati il 20.10.2011.

Collaudo: Essendo l'intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dall'arch. Fabio Beltrame in data 01.06.2012.

Codice POT: 93269073

Codice PdA2011: B.5 - 25



COMUNE DI SANT'ANNA D'ALFAEDO E ROVERE' VERONESE

COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA NELLE FRAZIONI DI RONCONI, FOSSE E VAONA E NEL CAPOLUOGO DI ROVERE' VERONESE

Descrizione intervento: per il comune di Sant'Anna d'Alfaedo, sono stati realizzati il collegamento della frazione Ronconi al collettore di fondo valle ed il completamento della fognatura nera nella frazioni di Fosse e Vaona con convogliamento dei reflui al collettore di fondo valle; per il comune di Rovere', si è provveduto al completamento della fognatura nera del capoluogo.

Direzione Lavori: ing. Antonio Tucci

Progetto: a firma dell'ing. Antonio Tucci del Centro Studi Progetti SpA

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.).

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 624.644,38 (IVA esclusa) che risulta inferiore di € 2.355,62 (IVA esclusa) rispetto l'importo complessivo di € 627.000,00 previsti nel Piano Operativo Triennale di Acque Veronesi.

Contributi: con DGR 4253 del 28.12.2006 la Regione Veneto ha stanziato un contributo pari a 627.000€, confermato dal successivo decreto n. 271/2009. A seguito delle economie riscontrate, il contributo definitivo è stato determinato in € 624.644,38 con decreto n. 502/2012.

Approvazioni: con determinazione n. 517 del 26.06.2012 il Direttore Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e la relazione acclarante del R.U.P. relativi ai lavori in oggetto.

Tempistica: i lavori sono iniziati il 07.10.2009 e sono stati ultimati il 16.09.2011.

Collaudo: Essendo l'intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dall'ing. Antonio Tucci in data 11.11.2011.

Codice POT: 93178090

Codice PdA2011: B.1 - 44



COMUNE DI SOAVE

RIFACIMENTO E COMPLETAMENTO DELLE RETI DI FOGNATURA E ACQUEDOTTO DI C.SO VITTORIO EMANUELE, VIA CANGRANDE E VICOLI ADIACENTI (IN CONCOMITANZA A INTERVENTO SU RETE GAS)

Descrizione intervento: rifacimento dei sottoservizi di C.so Vittorio Emanuele II fino alla stazione di sollevamento di Porta Nuova e nei vicoli adiacenti. I lavori consistono nella separazione della rete di fognatura mista mediante posa di un collettore per le acque nere, in concomitanza al completamento/rifacimento delle reti di acquedotto e gasdotto ove necessario. I lavori, per la quota relativa alla rete gas, sono stati finanziati dal comune di Soave.

Direzione Lavori: ing. Franco Talamini.

Progetto: a firma dell'ing. Franco Talamini dello studio STM Ingegneria.

RUP: p.i. Antonio Dal Prà (Comune di Soave).

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta per le sole opere afferenti al servizio idrico integrato è pari a € 791.853,72 (IVA esclusa) che risulta inferiore di € 117.874,28 (IVA esclusa) rispetto l'importo complessivo di € 989.728,00 previsti nel Piano Operativo Triennale di Acque Veronesi.

Contributi: non sono previsti contributi.

Approvazioni: con determinazione n. 90 del 06.02.2012 il Direttore Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e la relazione del R.U.P. sul conto economico finale dei lavori in oggetto.

Tempistica: i lavori sono iniziati il 24.10.2008 e sono stati ultimati il 29.06.2010.

Collaudo: Essendo l'intervento superiore a € 500.000,00 ed inferiore a € 1.000.000,00, il certificato di collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dall'ing. Franco Talamini in data 03.11.2011.

Codice POT: 93281070

Codice PdA2011: B.1 – 77





SEDE: LUNGADIGE GALTAROSSA, 8 - 37137 VERONA
