



2013 Piano Operativo Triennale degli investimenti 2013-2015
Consuntivo al 31.12.2013



INDICE

SEZIONE 1: INVESTIMENTI REALIZZATI NELL'ANNO 2013	6
RIPARTIZIONE DEGLI INVESTIMENTI NEL TERRITORIO	7
RIPARTIZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER SERVIZIO	7
SEZIONE 2: INTERVENTI SOGGETTI A CONTRIBUTO	12
CONTRIBUTI REGIONE VENETO	12
CONTRIBUTI PIANO DELLA MONTAGNA	13
PIANI STRALCIO	14
SEZIONE 3: SCOSTAMENTI TRA INVESTIMENTI PIANIFICATI ED INVESTIMENTI REALIZZATI NELL'ANNO 2013.....	18
INTRODUZIONE	18
ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI	19
SEZIONE 4: INVESTIMENTI REALIZZATI NEGLI ANNI DI GESTIONE 2007-2013	21

ALLEGATI

ALLEGATO 1: INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2013	22
ELENCO DI DETTAGLIO	23
ALLEGATO 2: SINTESI DEGLI INTERVENTI CONCLUSI NELL'ANNO 2013.....	42



PREMESSA

Il presente documento analizza gli investimenti che Acque Veronesi s.c. a r.l. ha realizzato nel corso dell'esercizio 2013.

Gli obiettivi prefissati per l'anno 2013 sono stati definiti nel Piano Operativo Triennale 2013-2015, approvato dall'Assemblea d'Ambito dell'AATO Veronese (ora Consiglio di Bacino) con deliberazione n. 8 del 19 dicembre 2012.

Tale Piano prevedeva investimenti inferiori a quanto potenzialmente realizzabile da questa Società, a causa delle note difficoltà, riscontrate in generale da tutte le Società di gestione del servizio idrico, nell'accedere ai finanziamenti da parte degli istituti di credito.

Gli investimenti programmati da Acque Veronesi per l'esercizio 2013 sono sintetizzati nella seguente tabella:

INVESTIMENTI 2013	POT 2013-2015 Approvazione AATO 19.12.2012
MACROCATEGORIE	[€]
Interventi sulle infrastrutture del servizio idrico integrato	13.659.869
Interventi di struttura	630.000
SOMMANO	14.289.869
Di cui	
<i>Contributi Regione Veneto</i>	200.000
<i>Contributi "Piano della Montagna"</i>	0
<i>di cui allacciamenti + contatori</i>	2.037.567
Investimenti al netto di contributi, allacciamenti e contatori	12.052.302

Nel corso dell'anno appena concluso, le difficoltà di finanziamento sono state ulteriormente aggravate a causa della pubblicazione, avvenuta in data 28.12.2012 e quindi dopo l'approvazione del Piano 2013-2015, del **nuovo metodo tariffario** da parte dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico.

Ciò ha costretto Acque Veronesi a rivedere il proprio Piano Economico e Finanziario sulla base del suddetto metodo, ed i risultati hanno evidenziato la impossibilità di garantire la copertura economica a tutti gli interventi presenti nel Piano approvato, stimando in 5 milioni di Euro la disponibilità di risorse per gli investimenti 2013.

Alla luce di ciò, si è reso doveroso rivedere la programmazione degli interventi tenendo in considerazione la nuova disponibilità di investimento, obbligando questa Società a sospendere tutti gli interventi previsti dal Piano 2013-2015, ad eccezione di quelli soggetti a contributo pubblico a fondo perduto e di quelli aventi impegni già in essere verso terzi (contratti in essere con fornitori), in modo massimizzare il volume degli investimenti realizzabili e non pregiudicare l'erogazione dei contributi stessi.


Questa scelta è stata validata dal Consiglio di Amministrazione di Acque Veronesi nella seduta del 04.06.2013 e comunicata al Consiglio di Bacino Veronese in data 17.06.2013.

SEZIONE 1: INVESTIMENTI REALIZZATI NELL'ANNO 2013

Gli investimenti realizzati da Acque Veronesi nel corso dell'esercizio 2013 sono stati 8,3 milioni di Euro.


INVESTIMENTI 2013	CONSUNTIVO AL 31.12.2013
MACROCATEGORIE	[€]
Interventi sulle infrastrutture del S.I.I.	8.049.722
Interventi di struttura	222.043
SOMMANO	8.271.756
Di cui	
Contributi Regione Veneto	1.000.000
Contributi "Piano della Montagna"	22.224
di cui allacciamenti + contatori	1.842.610
Investimenti al netto di contributi, allacciamenti e contatori	5.406.931

Il territorio interessato dagli investimenti della Società nel corso dell'anno 2013 è costituito dai 73 Comuni in cui Acque Veronesi ha gestito il servizio idrico integrato, come rappresenta in figura:

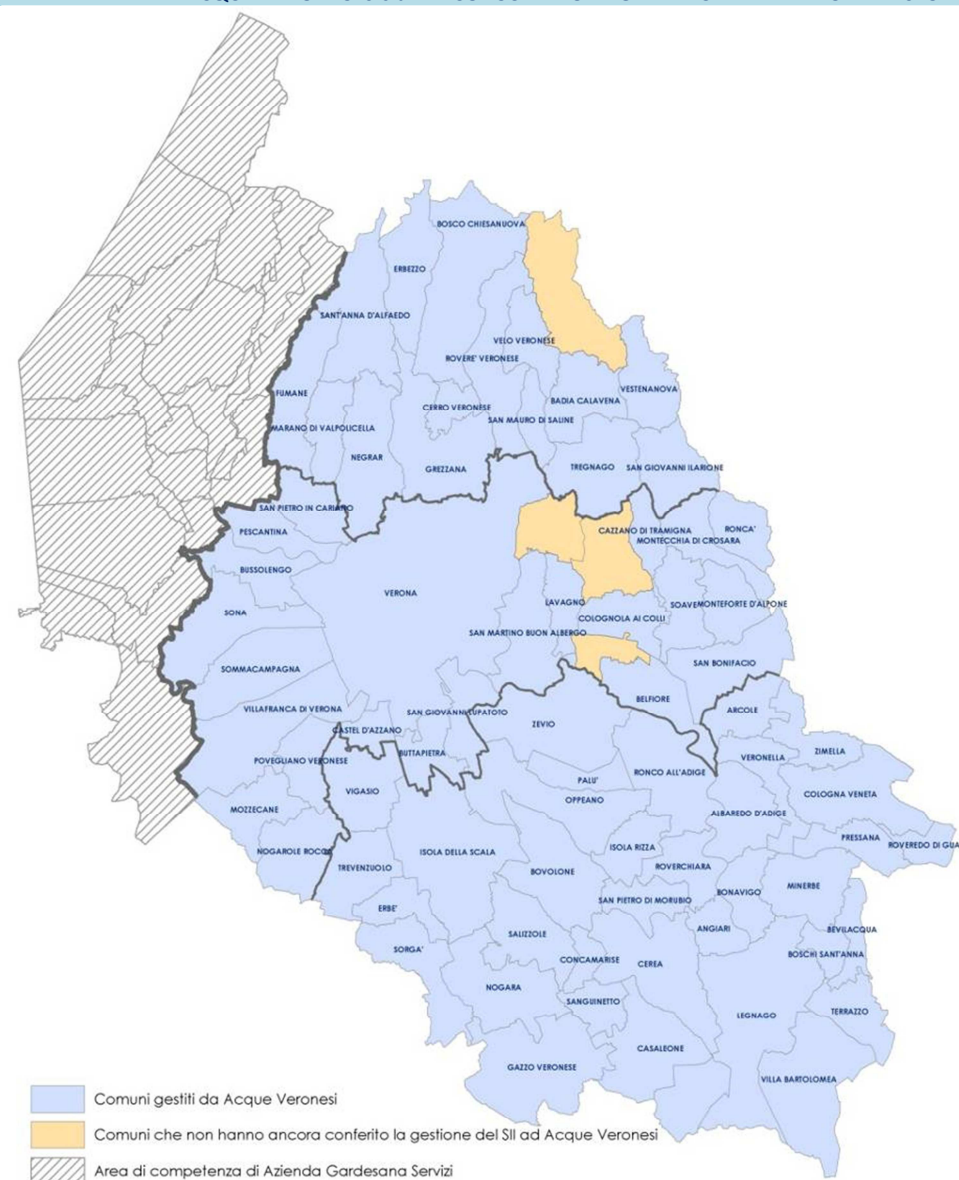

RIPARTIZIONE DEGLI INVESTIMENTI NEL TERRITORIO

La distribuzione degli investimenti sul territorio può essere riepilogata su quattro aree operative cui afferiscono i 73 comuni gestiti. A partire infatti dal 2013 è stato introdotto un nuovo modello organizzativo territoriale che prevede la gestione delle reti e degli impianti di acquedotto e fognatura come in figura:

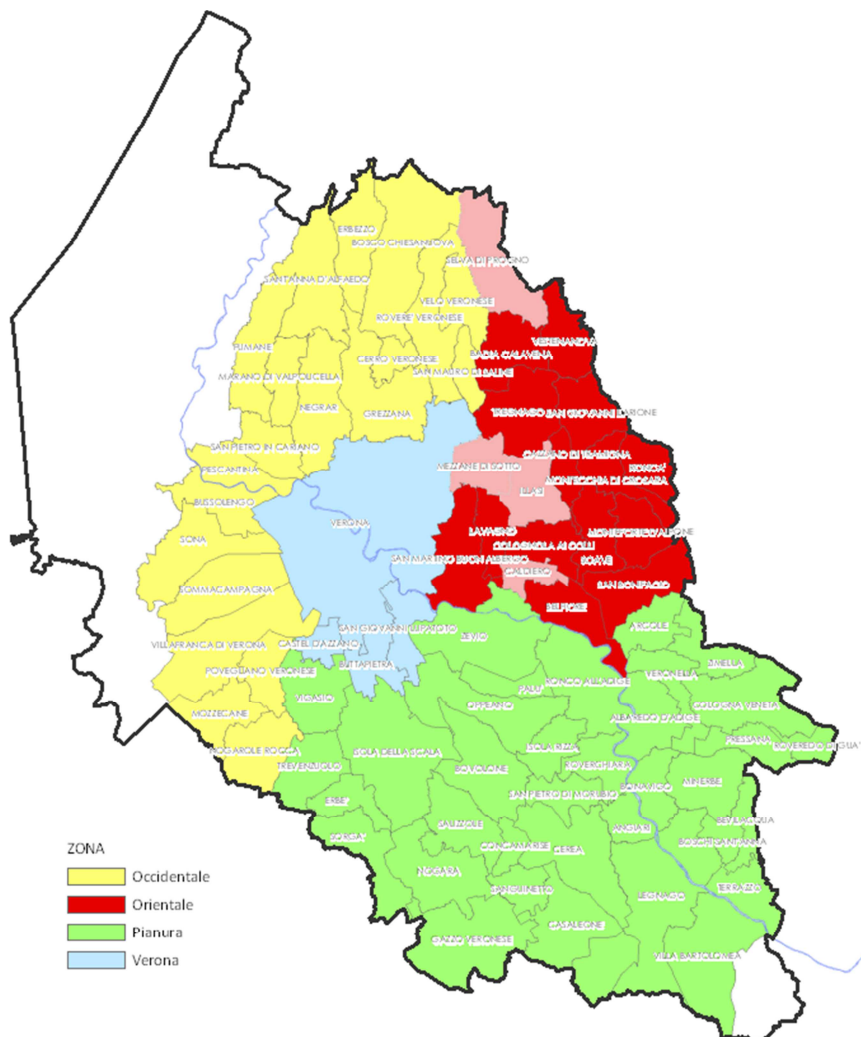

Oltre agli interventi riconducibili direttamente alle quattro zone operative, gli investimenti 2013 di Acque Veronesi hanno interessato anche:

- "più zone" ovvero i lavori su infrastrutture a servizio dei Comuni appartenenti a più zone quali, ad esempio, la realizzazione di depuratori consortili, di adduttrici intercomunali e di collettori fognari, a cui si aggiungono gli investimenti per la gestione operativa del servizio;
- "struttura" ovvero gli investimenti non direttamente riconducibili ai singoli Comuni in quanto necessari al funzionamento della società ed al rapporto con l'utenza, quali l'implementazione di sistemi informativi e gestionali, la messa a punto del sistema di telecontrollo, la ricerca di perdite e la realizzazione del sistema cartografico digitale;
- "allacciamenti" sono gli investimenti riconducibili alla realizzazione di allacciamenti delle utenze alle reti pubbliche di acquedotto e fognatura.

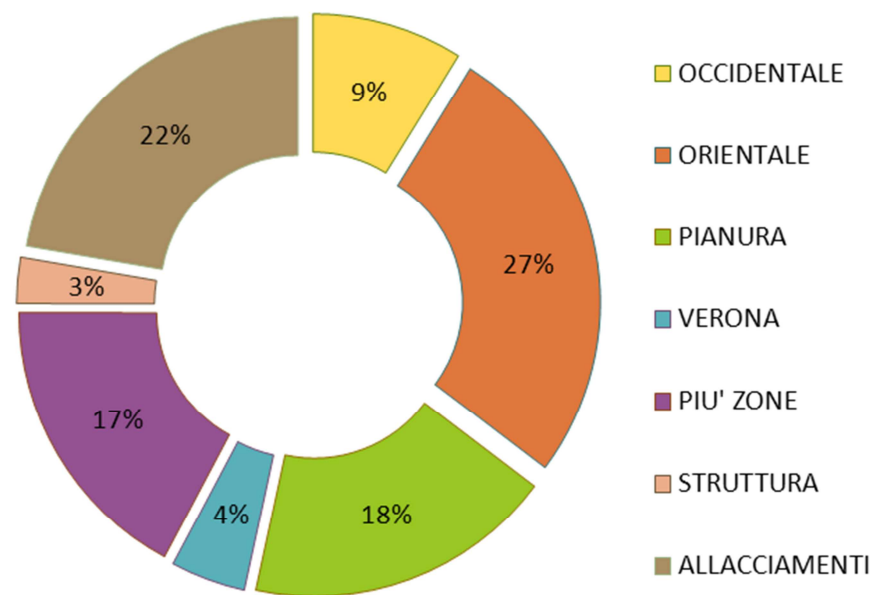


Figura 1 - Investimenti realizzati nel 2013 suddivisi per zona

RIPARTIZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER SERVIZIO

La ripartizione degli investimenti secondo le macro-categorie previste nel Piano 2013-2015 approvato, individua:

Interventi sulle infrastrutture del servizio idrico integrato (8.049.722€): sono prevalentemente interventi afferenti ai singoli Comuni gestiti dalla società, necessari per la realizzazione/ristrutturazione di nuovi acquedotti e/o sistemi di fognatura e depurazione. Questa categoria include altresì una serie di opere che contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza, efficacia, efficienza ed economicità del servizio idrico integrato (adeguamenti e manutenzioni straordinarie, telecontrollo, etc...). Gli investimenti sulle infrastrutture gestite sono accorpabili sulla base della tipologia di servizio cui si riferiscono e delle criticità indicate nel Piano d'Ambito.

Interventi di struttura (222.043€): hanno riguardato principalmente interventi strutturali e gestionali per la realizzazione della cartografia, l'attività di ricerca perdite, l'implementazione di sistemi informativi. Per la maggior parte hanno costituito il proseguimento di quelli già inseriti nel Piano Operativo Triennale (POT) 2012-2014, e risultano indispensabili per un efficace ed efficiente funzionamento della Società.

L'aerogramma seguente evidenzia il rapporto tra gli investimenti sulle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato rispetto a quelli stanziati per far fronte alle esigenze di struttura; allo stesso tempo viene messa in luce la predominanza, all'interno degli investimenti sulle infrastrutture, degli interventi dedicati al servizio di fognatura e depurazione rispetto a quelli di acquedotto (in conformità agli indirizzi programmatici del Consiglio di Bacino Veronese):




Figura 2 - Investimenti realizzati nell'anno 2013 suddivisi per categoria

Interventi sulle infrastrutture del servizio idrico integrato (8.049.722€)

Sono stati eseguiti interventi per un totale di circa 8 milioni di Euro riepilogabili, sulla base delle categorie di criticità descritte nel Piano d'Ambito dell'AATO Veronese approvato con Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 6 del 20 dicembre 2011, come segue:

A. Investimenti per garantire l'efficacia servizio acquedotto:

- l'estensione delle reti di acquedotto;
- il potenziamento dei sistemi di adduzione e l'interconnessione tra acquedotti locali e fonti;
- la ricerca e l'attivazione di nuove fonti di approvvigionamento.

B. Investimenti per garantire l'efficacia del servizio fognatura e depurazione e prevenire danni all'ambiente:

- l'estensione delle reti fognarie;
- l'aumento della potenzialità del servizio depurazione per agglomerati con carico inquinante superiore a 2.000 AE;
- l'aumento della potenzialità del servizio depurazione per agglomerati con carico inquinante inferiore a 2.000 AE;
- la razionalizzazione dei sistemi di sfioro;
- la riabilitazione dei collettori e delle reti di raccolta ammalorati.

C. Investimenti per garantire l'efficienza del servizio acquedotto:

- il potenziamento dei serbatoi;
- l'attivazione di nuove fonti di captazione e/o l'interconnessione tra acquedotti limitrofi;
- la realizzazione di nuove condotte di adduzione ed il potenziamento delle reti di distribuzione;
- la riabilitazione delle reti di distribuzione ammalorate.

D. Investimenti per garantire l'efficienza del servizio fognatura-depurazione:

- la centralizzazione dei trattamenti depurativi;
- la manutenzione straordinaria delle reti (e/o degli impianti di depurazione e/o degli impianti di sollevamento).

E. Investimenti per il recupero di efficienza nel servizio acquedotto:

- la realizzazione di sistemi di telecontrollo;
- l'attivazione di sistemi di monitoraggio, controllo e modellazione delle reti acquedottistiche.

F. Investimenti per il recupero di efficienza nei servizi di fognatura e depurazione:

- Il rilevamento in campo delle infrastrutture acquedottistiche, l'implementazione e l'aggiornamento del sistema informativo territoriale per l'analisi funzionale delle opere;
- la realizzazione dei sistemi di telecontrollo degli impianti di sollevamento;
- la realizzazione dei sistemi di telecontrollo degli impianti di depurazione;
- l'attivazione di sistemi di monitoraggio, controllo e modellazione dei sistemi fognari.

Nello specifico, sono stati realizzati 56 progetti di cui:

23 Analisi di Fattibilità

8 Progetti Preliminari

2 Progetti Preliminari/Definitivi

6 Progetti Definitivi

4 Progetti Definitivo-Esecutivo

13 Progetti Esecutivi.

A questi sottogruppi vanno ad aggiungersi i lavori connessi e/o accessori al servizio idrico integrato per i quali non è prevista copertura tariffaria, ovvero allacciamenti (identificati dal "**GRUPPOT.1**") che riguardano l'acquisto di contatori e la loro installazione in caso di allacciamento delle nuove utenze ai servizi di distribuzione dell'acqua potabile e collettamento dei reflui (investimenti coperti dal contributo degli utenti).



CATEGORIE	INVESTIMENTI 2013 [€]
ACQUEDOTTO	2.357.327
A. Investimenti per garantire l'efficacia servizio acquedotto	1.666.158
C. Investimenti per garantire l'efficienza del servizio acquedotto	603.086
E. Investimenti per il recupero di efficienza nel servizio acquedotto	13.801
FOGNATURA / DEPURAZIONE	3.849.683
B. Investimenti per garantire l'efficacia del servizio fognatura e depurazione e prevenire danni all'ambiente	3.024.255
D. Investimenti per garantire l'efficienza del servizio fognatura depurazione	885.939
F. Investimenti per il recupero di efficienza nei servizi di fognatura e depurazione	13.801
NON TARIFFATI	1.842.712
SOMMANO	8.049.722

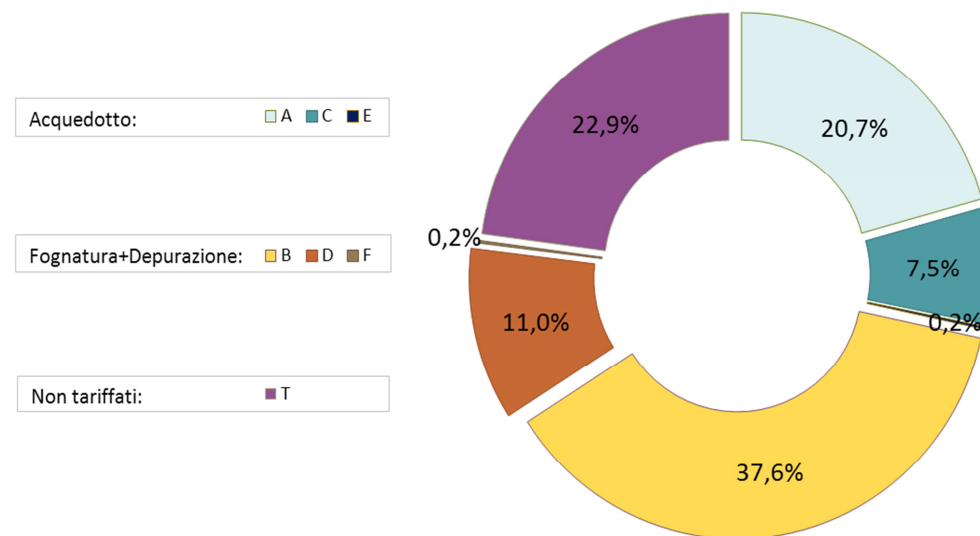


Figura 3 - Investimenti realizzati nel 2013 sulle infrastrutture del S.I.I

Interventi di struttura (222.043€)

In riferimento alle necessità relative ad efficacia ed efficienza di funzionamento della società, sono stati realizzati investimenti per circa 0,5 milioni di Euro destinati a:

- Qualità Ambiente e Sicurezza;
- Studi dei sistemi acquedottistici, fognari e depurativi connessi all'ottimizzazione degli investimenti, all'ottimizzazione della gestione del servizio, ed ai rischi igienico-sanitari e ambientali;
- Sistemi informativi;
- Implementazione e sostituzione strumentazione laboratorio analisi per controllo qualità del prodotto;
- Adeguamento Strutture e Arredi per sede centrale e sedi periferiche;
- Acquisto attrezzature per le squadre operative.

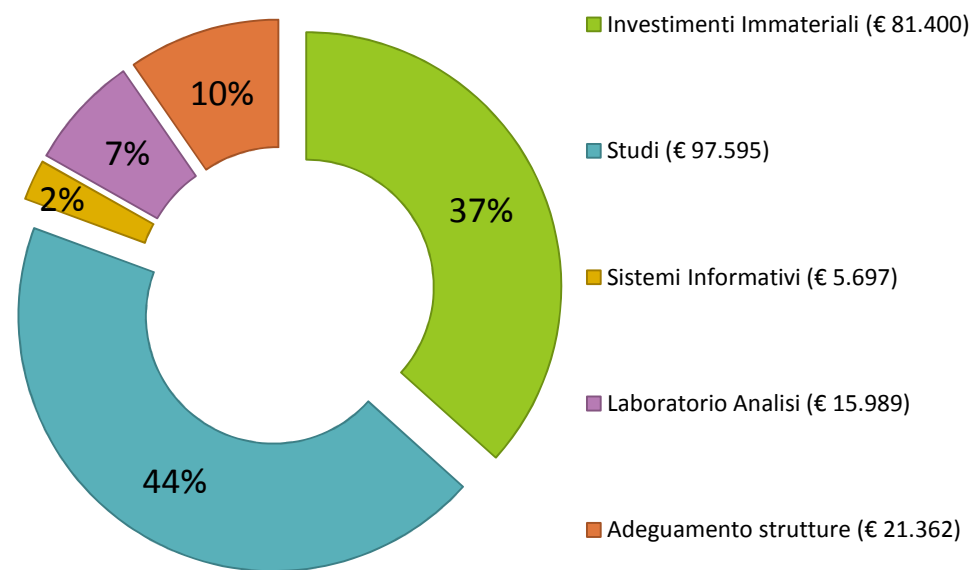


Figura 4 - Investimenti di struttura realizzati nel 2013



SEZIONE 2: INTERVENTI SOGGETTI A CONTRIBUTO

CONTRIBUTI REGIONE VENETO

Nel corso dell'anno, la Regione Veneto:

- ha stanziato a favore di Acque Veronesi, con DGR n.2813 del 30.12.2013, 480.000€ di contributi così ripartiti:
 - € 60.000 per l'intervento di "Adeguamento del sistema fognario" (*comune di Arcole*);
 - € 200.000 per l'intervento di "Realizzazione della rete idrica a servizio della frazione Maccacari" (*comune di Gazzo Veronese*);
 - € 200.000 per l'intervento di "Estensione della rete idrica dell'acquedotto alla località Torretta" (*comune di Legnago*);
 - € 20.000 per l'intervento di "Estensione della rete fognaria di Via Mangano" (*comune di San Giovanni Ilarione*);
- ha formalmente concesso ad Acque Veronesi, a seguito dell'approvazione di relativi progetti definitivi, 1.632.700€ di contributi per i seguenti interventi:
 - € 232.700 per l'intervento di "Adeguamento ed estensione reti fognarie es acquedottistiche - *comune di Fumane*"(Decreto n. 33 del 15.02.2013);
 - € 1.000.000 per l'intervento di "Opere acquedottistiche a tutela qualitativa della falda – *comune di Belfiore*" (Decreto n. 5 del 18.01.2013);
 - € 200.000 per l'intervento di "Ampliamento fognature - *comune di Bussolengo*"(Decreto n. 60 del 20.03.2013);
 - € 200.000 per l'intervento di "Ampliamento fognature - *comune di Monteforte d'Alpone*"(Decreto n. 77 del 03.04.2013);
- ha preso atto della conclusione dei lavori dei seguenti interventi soggetti a contributo regionale (riconoscendo nel contempo l'entità del contributo definitivo):
 - "Estensione rete fognaria in zone attualmente non servite (*Comune di Boschi Sant'Anna*)" - costo complessivo pari ad €230.931,31 - entità del contributo definitivo pari a €100.000,00(Decreto n. 40 del 21.02.2013);
 - "Completamento rete fognaria nelle frazioni di Rosaro, Busoni e Corso (*Comune di Grezzana*)" - costo complessivo pari ad €898.830,38 - entità del contributo definitivo pari a €898.830,38(Decreto n. 404 del 09.10.2013).

CONTRIBUTI PIANO DELLA MONTAGNA

L'A.A.T.O. Veronese con Deliberazione n. 16 del 22 dicembre 2008 ha dato incarico ad Acque Veronesi di redigere un piano di opere urgenti relativo al territorio montano di propria competenza, al fine di eliminare le criticità specifiche presenti, garantendo ai cittadini idonei servizi e parità di trattamento, utilizzando un fondo costituitosi grazie agli effetti dell'articolo 12, comma 2ter della Legge Regionale 27 marzo 1998, n. 5, modificato con legge regionale 16 agosto 2007, n. 20.

Tale piano, che contempla gli interventi di cui alla prossima tabella, è stato sottoposto all'esame ed all'approvazione dell'Autorità d'Ambito, che ha assegnato i fondi all'interno della propria Delibera n. 15 del 14.12.2009.

Per tutti gli interventi è stata raggiunta la conclusione formale dei lavori tranne nel caso dell'opera nei Comuni di Roverè Veronese e Velo Veronese (gestita in due stralci indipendenti).

Per arrivare a completa copertura del contributo concesso restano ancora da realizzare opere per € 37.290,76.

CODICE AATO	COMUNE	DENOMINAZIONE INTERVENTO	AUTORIZZATO [€]	FINALE / PROVVISORIO [€]
D.1 - 10	BOSCO CHIESA-NUOVA	Allacciamento al collettore di fondovalle dalle frazioni "Arzarè-Regno" Corbiolo (stralcio)	250.000	249.546,02
B.1 - 155	CERRO VERONESE	Estensione rete fognaria del capoluogo (stralcio)	100.000	99.987,22
B.3 - 05	ERBEZZO	Impianti di depurazione e reti di raccolta ad Erbezzo	200.000	200.000,00 ¹
B.1 - 40	SAN MAURO DI SALINE	Realizzazione collettore fognario a servizio di utenze non servite	100.000	99.590,55
B.1 - 65	SANT'ANNA D'ALFAEDO	1° stralcio - collegamento frazione Ronconi	150.000	142.612,45
B.3 - 08 D.2 - 02	ROVERE' VERONESE VELO VERONESE	Adeguamento fognario e depurativo dei due capoluoghi	250.000	220.973,00
TOTALE			1.050.000,00	1.012.709,24

¹ Si precisa che complessivamente per questo intervento sono stati spesi € 226.825,88. La copertura economica delle spese aggiuntive, quantificate in € 26.825,88, è stata così individuata e ripartita:

- euro 9.999,58 a carico del comune di Erbezzo, per la quota parte relativa al potenziamento del sistema di adduzione idrica mirato a servire i nuovi insediamenti;
- euro 16.764,54 a carico di Acque Veronesi, all'interno dell'investimento previsto al codice 92400111 "Interventi di pianificazione territoriale: estensioni e potenziamenti acquedotto concomitanti a interventi per nuove lottizzazioni e/o in concomitanza ad interventi di altri Enti".



PIANI STRALCIO

Con riferimento alle opere inserite nella deliberazione dell'AATO Veronese n.7 del 17 febbraio 2011 (rideterminazione dei sostegni economici alla realizzazione degli interventi urgenti di fognatura e depurazione), si riporta l'elenco di riepilogo degli investimenti realizzati fino al 31.12.2012:



COMUNE	CODICE PdA 2011	INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO [€]	INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI (2007-2012) [€]	INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2013 [€]	CONCLUSO /IN FASE DI CONCLUSIONE
BOVOLONE	B.2 - 29	* Estensione e adeguamento rete fognaria nel Comune di Bovolone - stralcio funzionale	200.000	18.840	3.752	X
BOVOLONE	B.2 - 29	* Estensione e adeguamento rete fognaria nel Comune di Bovolone - completamente	1.039.000	-	-	X
BUSSOLENGO	D.2 - 08	* Rifacimento fognatura in alcune vie del capoluogo	104.841	9.412	-	X
BUTTAPIETRA	D.2 - 44	* Ristrutturazione delle condotte principali della rete fognaria comunale di Buttapietra	1.500.000	69.870	-	X
BUTTAPIETRA	B.1 - 191	* Estensione rete fognaria nel comune di Buttapietra - Via Isola della Scala e Via dell'Artigianato	540.437	90.635	388	X
CASALEONE	B.1 - 175	* Estensione della rete fognaria	975.000	82.654	-	X
CERRO VERONESE	B.1 - 155	* Estensione e rifacimento della rete fognaria: 1a fase (progetto e primi interventi urgenti sulla rete del capoluogo)	250.000	226.721	-	X
COLOGNA VENETA	B.1 - 194	* Realizzazione fognatura nelle vie Ronchi, Sabbion, Matteotti; Crearo, S. Giustina a Cologna	400.000	389.454	-	X
GAZZO VERONESE	B.1 - 129 B.1 - 130 B.1 - 133	* Completamento rete fognaria comunale: - via Boschi (353.000€) - via Porto (300.000€) - via Buche Levà di sotto (400.000€)	1.053.000	68.630	-	X
GREZZANA	B.1 - 39	* Fognatura Frazione di Orsara	200.000	129.245	2.080	X
GREZZANA	B.1 - 16	* Fognatura Frazione di Azzago: 2° Stralcio	1.340.000	59.479	-	X
GREZZANA	B.1 - 238	* Fognatura Frazione di Alcenago - loc. Coda, Vigo, Rupiano	2.500.000	91.757	-	X
ISOLA RIZZA	B.1 - 145	* Fognature capoluogo	130.000	129.018	-	X
LEGNAGO	B.1 - 203	* Interventi di adeguamento e completamento della rete fognaria in destra Adige - Porto e località Casette	400.000	19.890	-	
MINERBE	B.1 - 55	* Fognatura nera area Ovest 2° lotto	725.000	724.447	-	X
MONTECCHIA DI CROSARA	B.4 - 07	* Progetto per completamento fognatura consortile 4° lotto: E - Vasca di laminazione Montecchia di Crosara_3.900 abitanti attuali (9.600 futuri)	500.000	466.511	-	X
MONTEFORTE D'ALPONE	B.5 - 17	* Progetto per completamento fognatura consortile 4° lotto F - Vasca di laminazione Monteforte d'Alpone_2.900 abitanti attuali (3.200 futuri)	500.000	478.913	6.829	X
MOZZECANE	B.1 - 143	* Lavori di realizzazione rete fognaria nella frazione S. Zeno di Mozzecane	150.000	144.742	-	X
MOZZECANE	B.2 - 44	* Adeguamento del depuratore comunale ai nuovi carichi provenienti dalla rete fognaria di Grezzano e zone limitrofe	850.000	200.485	-	X
NOGAROLE ROCCA	B.2 - 38	* Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a Nogarole Rocca e	510.000	462.555	-	X



COMUNE	CODICE PdA 2011	INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO [€]	INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI (2007-2012) [€]	INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2013 [€]	CONCLUSO /IN FASE DI CONCLUSI ONE
		collettori di collegamento reti esistenti: condotte di collegamento				
NOGAROLE ROCCA	B.2 - 38	* Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a Nogarole Rocca e collettori di collegamento reti esistenti: impianto di depurazione	2.468.000	1.488.194	564.056	X
OPPEANO	B.1 - 177	* Adeguamento e ottimizzazione della rete fognaria: via Bertini, via Bursi, via Cadalora (2° stralcio)	350.000	94.942	-	X
OPPEANO	B.1 - 177	* Adeguamento e ottimizzazione della rete fognaria: via Sorio		230.554	-	X
PESCANTINA	B.1 - 31	* Estensione rete fognaria Ospedaletto e Santa Lucia	1.500.000	1.493.127	-	X
PIU' COMUNI: 2	B.5 - 19	* Rifacimento del collettore fognario Valpantena - 1°stralcio	4.280.000	117.192	-	X
PIU' COMUNI: 2	B.5 - 19	* Rifacimento del collettore fognario Valpantena - completamento 2° stralcio	9.720.000	1.011.294	-	X
POVEGLIANO	D.2 - 46	* Rifacimento fognatura Via Cavour	201.100	201.038	-	
RONCA'	B.1 - 94 b.1 - 95	* Progetto per completamento fognatura consortile: 4°lotto C - Collettore fognario allacciamento frazione Terrossa e vasca_1.000 abitanti attuali (2.700 futuri - 803.700€) 4°lotto D - Collettore fognario allacciamento Roncà e vasca_2.300 abitanti attuali (2.900 futuri - 838.700€)	1.642.400	1.500.678	16.938	
SAN BONIFACIO	B.2 - 45	* Opere di affinamento e disinfezione scarico al depuratore di S. Bonifacio: pretrattamenti + trattamenti terziari	1.260.696	985.792	202.690	
SAN BONIFACIO	B.5 - 25	* Fognature in Corso Venezia - 4° stralcio	245.000	124.603	-	
SAN BONIFACIO	B.5 - 12	* Fognatura Via Colombo - Via Pigafetta	250.000	212.626	-	
SAN BONIFACIO	B.5 - 24	* Collettore fognario zona sud di alleggerimento della rete di San Bonifacio, frazioni di Locare, Lobia e Prova	2.100.000	19.565	-	
SAN BONIFACIO	D.2 - 18	* Riqualificazione sistema fognario frazione di Prova	500.000	-	-	
SAN GIOVANNI LUPATOTO	B.1 - 23 B.1 - 22 B.1 - 224	* Completamento della rete fognaria nelle Vie: Pacinotti, Apollo XI, Garofoli, Pace Paquara, Porto, Speranza	1.510.000	1.206.090	-	
SAN GIOVANNI LUPATOTO	B.2 - 46	* Rifacimento comparto disidratazione fanghi dell'impianto di depurazione	260.000	237.819	-	
SANGUINETTO	B.4 - 14	* 1°INTERVENTO: Ristrutturazione della rete fognaria del Comune di Sanguinetto - Rifacimento del collettore consortile Boschetti. 2°INTERVENTO: Ristrutturazione rete fognaria - realizzazione di una vasca volano nel Comune di Sanguinetto al servizio del collettore fognario consortile dei comuni ex CO.GE.FO	1.800.000	1.754.723	30.458	

²BOSCO CHIESANUOVA, CERRO VERONESE, ERBEZZO, GREZZANA, SANT'ANNA D'ALFAEDO




COMUNE	CODICE PdA 2011	INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO [€]	INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI (2007-2012) [€]	INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2013 [€]	CONCLUSO /IN FASE DI CONCLUSI ONE
SOAVE	B.1 - 77	* Rifacimento e completamento delle reti di fognatura e acquedotto di C.so Vittorio Emanuele, Via Cangrande e vicoli adiacenti (in concomitanza a intervento su rete gas)	909.728	798.301	-	
SOMMACAMPAGNA	B.2 - 23	* Lavori all'impianto di depurazione (completamento per lo scarico al suolo)	500.000	499.853	-	
SOMMACAMPAGNA	B.1 - 43	* Realizzazione by-pass del collettore fognario di Sona	620.800	138.563	-	
SORGA'	B.2 - 39 B.1 - 172	* Realizzazione impianto di depurazione di Sorgà e reti di collettamento	3.414.940	74.151	-	
SORGA'	B.2 - 39	* Realizzazione impianto di depurazione di Bonferraro e reti di collettamento	1.638.000	-	-	
VERONA	B.2 - 07	* Depuratore "Città di Verona": interventi urgenti per adeguamento	600.000	574.896	168	
VERONA	B.1 - 04	* Fognatura Via del Pestrino, fraz. Copella e tratti minori in Verona e Comuni limitrofi	1.100.000	763.779	4.866	
VIGASIO	D.2 - 35 D.2 - 42	* Adeguamento funzionale del depuratore comunale del capoluogo - 1° stralcio	215.000	170.518	-	
VIGASIO	D.2 - 30	* Rifacimento linea fognaria Via Villafranca	180.000	143.698	-	
VILLA BAROLOMEA	B.1 - 181	* Completamento fognature nel capoluogo - 2° stralcio	385.000	22.020	-	
VILLAFRANCA DI VERONA	B.1 - 237	* Riqualificazione via Quadrato - per fognatura - (considerare solo quota per lav. di fognatura)	579.916	574.152	3.972	
VILLAFRANCA DI VERONA	B.1 - 237	* Realizzazione rete fognaria in loc. Pozzomoreto	700.000	633.436	-	
SOMMANO			52.797.857	18.934.859	836.197	

SEZIONE 3: SCOSTAMENTI TRA INVESTIMENTI PIANIFICATI ED INVESTIMENTI REALIZZATI NELL'ANNO 2013

INTRODUZIONE

Il riepilogo della situazione degli investimenti di Acque Veronesi, riportato nella tabella sottostante, evidenzia la quota degli investimenti realizzati nel 2013 a confronto con il relativo budget approvato dal Consiglio di Bacino Veronese.

INVESTIMENTI 2013	Approvazione AATO n.8 del 19.12.2012 [€]	Investimenti realizzati al 31.12.2013 [€]	SCOSTAMENTO	
			[€] /	[%]
Interventi sulle infrastrutture acquedotto/fognatura/depurazione	13.659.869	8.049.722	-5.610.147	
Interventi di struttura	630.000	222.043	-407.957	
	14.289.869	8.271.765	-6.018.104	-42%
<i>Di cui:</i>				
Contributi Regione Veneto	200.000	998.830	798.830	
Interventi relativi al "Piano della Montagna"	0	22.224	22.224	
Interventi relativi ad allacciamenti	2.037.567	1.842.712	-194.855	
	2.237.567	2.863.766	626.199	28%
TOTALE INVESTIMENTI TARIFFATI	12.052.302	5.407.999	-6.644.303	-55%

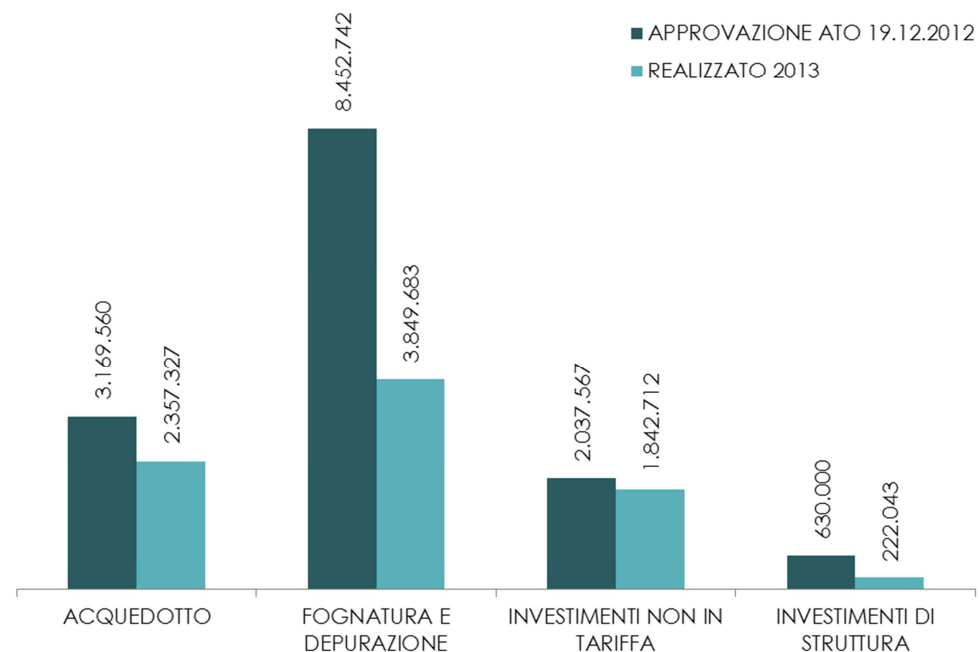

Le cause dello scostamento tra gli investimenti previsti nel Piano Operativo approvato dall'AATO Veronese e quelli effettivamente realizzati sono brevemente descritte nel paragrafo seguente e maggiormente dettagliate, per ciascun intervento, nell'allegato 1 alla presente relazione.


ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

La comparazione tra gli investimenti realizzati e quelli previsti nel Piano Operativo per l'anno 2013 evidenzia complessivamente la seguente situazione:

SERVIZIO	SCOSTAMENTI COMPLESSIVI		MAGGIORI SPESE	MINORI SPESE
	[€]	[%]	[€]	[€]
ACQUEDOTTO	-812.233	-26%	429.669	-1.345.904
FOGNATURA E DEPURAZIONE	-4.603.059	-54%	901.181	-5.400.239
INVESTIMENTI NON IN TARIFFA	-194.855	-10%	0	-194.855
INVESTIMENTI DI STRUTTURA	-407.957	-65%	5.989	-413.946
	-6.018.104	-42%	1.336.839	-7.354.944

Su complessivi 1,3 milioni di Euro, le cause di maggiori spese possono essere raggruppate nelle seguenti categorie:

- anticipi su cronoprogramma di realizzazione;
- interventi straordinari per emergenze;
- adeguamento post consuntivo 2012.

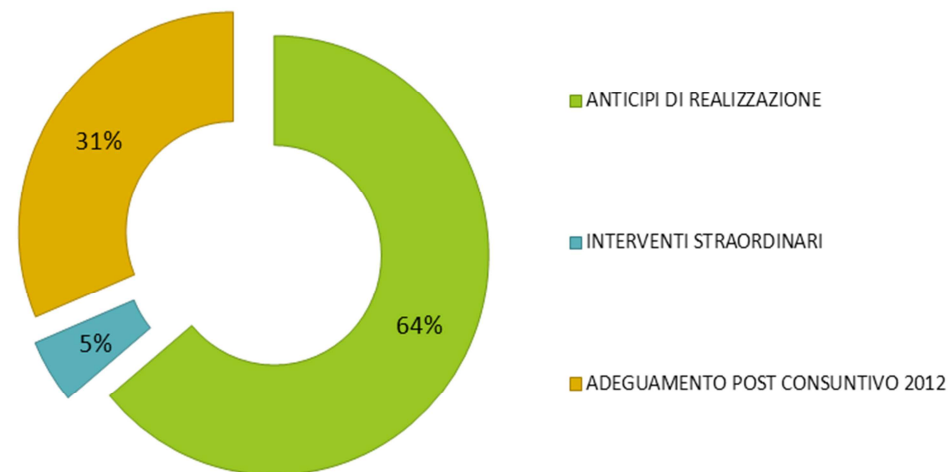


Nello specifico:

- le somme anticipate rispetto la programmazione approvata dal Consiglio di Bacino Veronese hanno riguardato solamente interventi soggetti a contributo regionale (in linea con gli indirizzi societari);
- gli interventi straordinari corrispondono all'avvio del progetto per la risoluzione della situazione di emergenza dovuta alla presenza dei PFAS nelle acque potabili prelevate nella centrale di Almisano;
- gli adeguamenti "post consuntivo 2012" si riferiscono ad impegni di spesa autorizzati nel 2012, la cui conclusione è però avvenuta nel corso del 2013.

Le cause invece di minori spese rispetto gli investimenti previsti per l'anno 2013 (circa 7,4 milioni di Euro) hanno riguardato invece:


- ritardi su cronoprogramma di realizzazione (condizioni metereologiche avverse nei luoghi di cantiere, etc...);
- mancate approvazioni/autorizzazioni (complessità procedurali per ottenere pareri, concessioni, autorizzazioni, approvazioni da enti terzi, allungamento dei tempi delle procedure espropriative...);
- risparmi (certi o da confermare in caso di lavori non conclusi);
- sospensione dell'investimento (in attesa della concessione dei finanziamenti da parte degli istituti di credito);
- adeguamento post consuntivo 2012 (ovvero spese anticipate nel 2012 rispetto la previsione a finire utilizzata per la redazione del Piano 2013-2015 approvato).

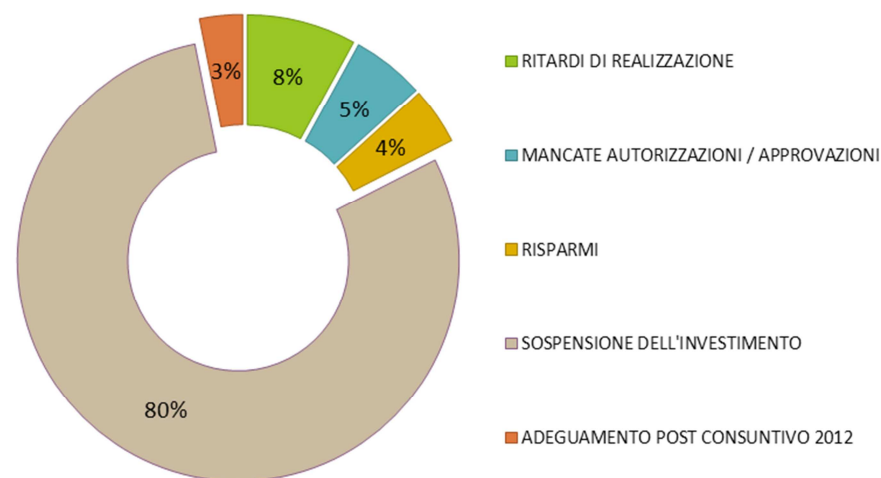

Da quest'analisi si nota che la causa principale delle minori spese è da ricondurre alla decisione della Società di sospendere l'avvio degli interventi già previsti in considerazione della ridotta disponibilità economica dovuta all'introduzione del nuovo Metodo Tariffario.


SEZIONE 4: INVESTIMENTI REALIZZATI NEGLI ANNI DI GESTIONE 2007-2013

Acque Veronesi ha complessivamente realizzato investimenti per **100,6 milioni di Euro** negli anni di gestione 2007-2013, come di seguito riepilogato:

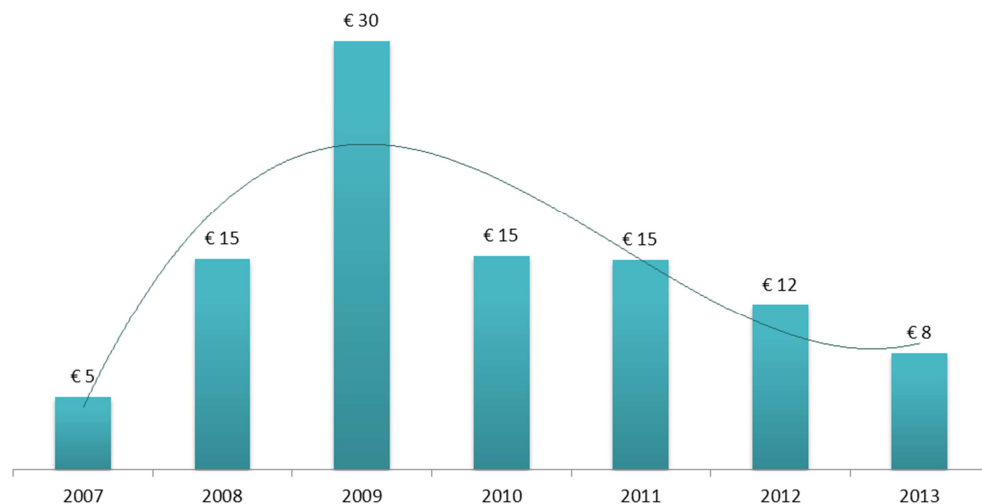

Valori espressi in milioni di Euro

Gli investimenti realizzati, al netto dei contributi degli utenti per l'allacciamento al servizio, e di quelli della Regione Veneto e dell'AATO Veronese, portano a complessivi **77,7 milioni di Euro**, come evidenzia il grafico sottostante:

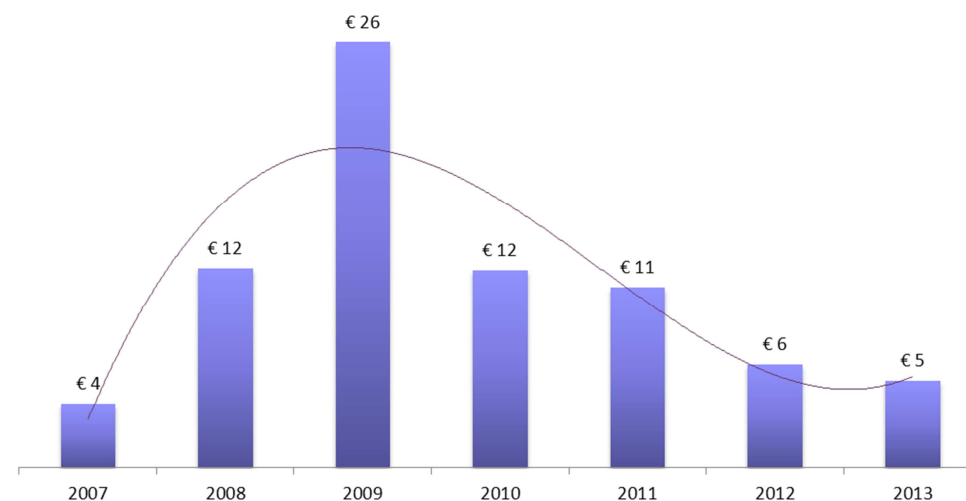

Valori espressi in milioni di Euro

ALLEGATO 1: INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2013

Nel Piano Operativo 2013-2015, gli interventi che prevedevano investimenti da realizzare nel triennio di riferimento sono stati distinti da quelli in fase di conclusione o programmati ad anni successivi al 2015. Nel corso dell'anno appena concluso, sono state comunque registrate delle spese relative a commesse per le quali, al momento della redazione del Piano, non si prevedevano investimenti per l'anno 2013; questo ha determinato quindi maggiori spese per i seguenti due casi:

- interventi straordinari (situazione di emergenza dovuta alla presenza dei PFAS nelle acque potabili prelevate nella centrale di Almisano);
- impegni di spesa autorizzati nel 2012, la cui conclusione è avvenuta nel corso del 2013.

Il dettaglio degli investimenti realizzati, con relativi scostamenti rispetto quanto approvato dall'Autorità d'Ambito e le cause di maggiori/minori spese è proposto nelle tabelle seguenti, che riprendono la struttura del Piano 2013-2015 ovvero:

	Approvazione AATO n.8 del 19.12.2012 [€]	Investimenti realizzati al 31.12.2013 [€]	scostamento
Interventi previsti nel triennio 2013-2015	12.252.303	6.429.053	-5.823.249
allacciamenti	2.037.567	1.842.712	- 194.855
	14.289.870	8.271.765	- 6.018.104



ELENCO DI DETTAGLIO

CODICE ACVR	COMUNE	CODICE PdA 2011	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO	IMPORTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO	ANNO 2013 APP. 8/2012	INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2013	SCOSTAMENTO	CAUSE SCOSTAMENTO
93302080	ALBAREDO D'ADIGE	B.1 - 57	Realizzazione rete idrica e fognaria in zone sprovviste all'interno del capoluogo: fognatura Viale Europa	125.000		-	-	-	
93304110	ARCOLE	A.1 - 31	Interventi urgenti per adeguamento del sistema fognario e acquedottistico del Comune: 1° stralcio	68.000		-	-	-	
93207090	BELFIORE	B.1 - 161	Estensione rete fognaria a zone non servite e collettamento al depuratore di Belfiore	168.000	106.127	-	-	-	
93309090	BONAVIGO	B.1 - 63	Estensione rete fognaria in zone attualmente non servite	150.000		-	-	-	
93310090	BOSCHI SANT'ANNA	B.1 - 62	Estensione rete fognaria in zone attualmente non servite	300.000	100.000	-	-	-	
93111081	BOSCO CHIESANUOVA	A.1 - 112	Ristrutturazione impianto Villa Ponti (acquedotto della lessinia) e potenziamento del sistema di distribuzione di acqua potabile del Comune di Bosco	503.028		-	-	-	
93111090	BOSCO CHIESANUOVA	B.1 - 34	Progetto per adeguamento rete fognaria del capoluogo e primi interventi urgenti	100.000		-	-	-	
93111100	BOSCO CHIESANUOVA	D.1 - 10	Allacciamento al collettore di fondovalle dalle frazioni "Arzarè-Regno" Corbiolo (stralcio)	250.000	250.000	-	-	-	
93312080	BOVOLONE	B.2 - 29	Interventi urgenti per adeguamento depuratore	520.000		-	-	-	
93224080	CAZZANO DI TRAMIGNA	A.1 - 39	Potenziamento dell'acquedotto del capoluogo ed allacciamento delle contrade Monti, Campiano e Caltrani	400.000		-	-	-	
93126070	CERRO VERONESE	B.1 - 155	* Estensione e rifacimento della rete fognaria: 1a fase (progetto e primi interventi urgenti sulla rete del capoluogo)	250.000		-	-	-	
93126100	CERRO VERONESE	B.1 - 155	Estensione rete fognaria del capoluogo (stralcio)	100.000	100.000	-	-	-	
93327070	COLOGNA VENETA	B.1 - 194	* Realizzazione fognatura nelle vie Ronchi, Sabbion, Matteotti; Crearo, S. Giustina a Cologna	400.000		-	-	-	



CODICE ACVR	COMUNE	CODICE PdA 2011	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO	IMPORTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO	ANNO 2013 APP. 8/2012	INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2013	SCOSTAMENTO	CAUSE SCOSTAMENTO
93332080	ERBE'	D.2 - 22	Interventi urgenti per adeguamento depuratore	91.000		-	-	-	
93133080	ERBEZZO	A.1 - 91	Potenziamento e ristrutturazione impianto sistema di adduzione acqua potabile a Cappella Fasani (Comune di Erbezzo)	200.000		-	-	-	
93133100	ERBEZZO	B.3 - 05	Impianti di depurazione e reti di raccolta ad Erbezzo	200.000	200.000	-	-	-	
93135080	FUMANE	A.1 - 126	Estensione rete acquedotto in località Uri a Mazzurega	80.000		-	-	-	
93138070	GREZZANA	B.1 - 33	Completamento rete fognaria nelle frazioni di Rosaro, Busoni e Corso	900.000	900.000	-	76	76	adeguamento post consuntivo 2012
93138072	GREZZANA	B.1 - 39	* Fognatura Frazione di Orsara	200.000		-	2.080	2.080	adeguamento post consuntivo 2012
93138091	GREZZANA	A.3 - 06	Realizzazione nuovo impianto di rilancio acquedotto in Via Asiago Comune di Grezzana	200.000		-	-	-	
93138100	GREZZANA	A.3 - 06	Interventi di potabilizzazione Grezzana - Nesente: opere di completamento - Adeguamento centrale di Nesente	150.000		-	-	-	
93138090a	GREZZANA	A.3 - 06	Interventi di potabilizzazione Grezzana - Nesente: 2° e 3° stralcio (pozzi e sistemazione centrale Nesente; condotta Nesente - Grezzana)	1.154.000	675.291	-	-	-	
93138090a	GREZZANA	A.3 - 06	Interventi di potabilizzazione Grezzana - Nesente: 2° Sub. A	292.000		-	-	-	
93340082b	ISOLA DELLA SCALA	A.1 - 64	Realizzazione rete fognaria e acquedottistica in concomitanza alla realizzazione di opere pubbliche	76.610		-	-	-	
93340082b	ISOLA DELLA SCALA	B.1 - 169	Realizzazione rete fognaria e acquedottistica	40.390		-	-	-	
93341070	ISOLA RIZZA	B.1 - 145	* Fognature capoluogo	130.000		-	-	-	



CODICE ACVR	COMUNE	CODICE PdA 2011	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO	IMPORTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO	ANNO 2013 APP. 8/2012	INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2013	SCOSTAMENTO	CAUSE SCOSTAMENTO
93242101	LAVAGNO	B.1 - 202	Estensione rete fognaria alla località San Giacomo e adeguamento rete di collettamento a San Martino Buon Albergo: fognatura Via Monticelli	130.000		-	-	-	
93348070	MINERBE	B.1 - 55	* Fognatura nera area Ovest 2° lotto	725.000		-	-	-	
93348071	MINERBE	B.1 - 55	Estensione rete fognaria Comune di Minerbe Via Trento, Crosara e Trieste	400.000	400.000	-	-	-	
93249091	MONTECCHIA DI CROSARA	B.1 - 206	Rifacimento Piazza Frutti	210.000		-	-	-	
93249090	MONTECCHIA DI CROSARA	B.4 - 07	* Progetto per completamento fognatura consortile 4° lotto: E - Vasca di laminazione Montecchia di Crosara_3.900 abitanti attuali (9.600 futuri)	500.000		-	-	-	
93250090	MONTEFORTE D'ALPONE	B.5 - 17	* Progetto per completamento fognatura consortile 4° lotto F - Vasca di laminazione Monteforte d'Alpone_2.900 abitanti attuali (3.200 futuri)	500.000		-	6.829	6.829	adeguamento post consuntivo 2012
93251090	MOZZECANE	B.1 - 143	* Lavori di realizzazione rete fognaria nella frazione S. Zeno di Mozzecane	150.000		-	-	-	
93251100	MOZZECANE	B.1 - 208	Fognatura e acquedotto in Via Regina Margherita e acquedotto in altre vie del Comune	790.000		50.000	2.129	- 47.871	risparmi
93152090	NEGRAR	B.1 - 13	Realizzazione rete fognaria in Via Volpare	95.000		-	-	-	
93152100	NEGRAR	B.1 - 210	Realizzazione rete fognatura di Via Quintarelli in località San Vito e rete idrica in Via Crosara	88.600		-	-	-	
93353081	NOGARA	B.2 - 31	Interventi urgenti per adeguamento depuratore	65.000		-	-	-	
93254080	NOGAROLE ROCCA	B.2 - 38	* Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a Nogarole Rocca e collettori di collegamento reti esistenti: condotte di collegamento	510.000		50.000	-	- 50.000	risparmi
93355071a	OPPEANO	B.1 - 177	* Adeguamento e ottimizzazione della rete fognaria: via Bertini, via Bursi, via Cadalora (2° stralcio)	350.000		-	-	-	



CODICE ACVR	COMUNE	CODICE PdA 2011	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO	IMPORTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO	ANNO 2013 APP. 8/2012	INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2013	SCOSTAMENTO	CAUSE SCOSTAMENTO
93355071a	OPPEANO	B.1 - 177	* Adeguamento e ottimizzazione della rete fognaria: via Sorio			-	-	-	
93355080	OPPEANO	A.1 - 108	Realizzazione nuovi tratti rete acquedotto in zone attualmente sprovviste: interventi urgenti in zone contaminate dal Cromo (Via Lino Lovo, Via Salieri)	331.931		-	-	-	
93355080c	OPPEANO	A.1 - 108	Realizzazione nuovi tratti rete acquedotto in zone attualmente sprovviste: realizzazione nuovi tratti di rete acquedotto nelle vie Bertini, Bursi, Cadalora (1° stralcio)	244.069		-	-	-	
93258070	PESCANTINA	B.1 - 31	* Estensione rete fognaria Ospedaletto e Santa Lucia	1.500.000		-	-	-	
93258080	PESCANTINA	D.2 - 20	Interventi urgenti per adeguamento depuratori Tremolè e Settimo	117.000		-	-	-	
93260070	POVEGLIANO	D.2 - 46	* Rifacimento fognatura Via Cavour	201.100		-	-	-	
93263090	RONCA'	B.1 - 94 b.1 - 95	* Progetto per completamento fognatura consortile: 4°lotto C - Collettore fognario allacciamento frazione Terrossa e vasca_1.000 abitanti attuali (2.700 futuri - 803.700€) 4°lotto D - Collettore fognario allacciamento Roncà e vasca_2.300 abitanti attuali (2.900 futuri - 838.700€)	1.642.400		57.942	16.938	- 41.004	mancate autorizzazioni / approvazioni
93167070	ROVERE' VERONESE	B.1 - 104	Completamento rete fognaria a servizio del capoluogo e nella frazione di San Rocco di Piegara e San Francesco: fognatura Squarantello	120.000		-	-	-	
93269073	SAN BONIFACIO	B.5 - 25	* Fognature in Corso Venezia - 4° stralcio	245.000		-	-	-	
93269074	SAN BONIFACIO	B.5 - 12	* Fognatura Via Colombo - Via Pigafetta	250.000		-	-	-	
93170110	SAN GIOVANNI ILARIONE	A.1 - 37	Completamento sistema acquedottistico in aree comunali	50.000		-	-	-	
93271080	SAN GIOVANNI LUPATOTO	A.1 - 04 B.1 - 224	Realizzazione delle reti acquedotto e fognatura in alcune strade del capoluogo attualmente non servite (Acquedotto e fognatura Via Scajole)	1.095.000		-	153.487	153.487	adeguamento post consuntivo 2012
93271081	SAN GIOVANNI LUPATOTO	B.1 - 23 B.1 - 22 B.1 - 224	* Completamento della rete fognaria nelle Vie: Pacinotti, Apollo XI, Garofoli, Pace Paquara, Porto, Speranza	1.510.000		-	-	-	



CODICE ACVR	COMUNE	CODICE PdA 2011	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO	IMPORTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO	ANNO 2013 APP. 8/2012	INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2013	SCOSTAMENTO	CAUSE SCOSTAMENTO
93271083	SAN GIOVANNI LUPATOTO	B.2 - 46	* Rifacimento comparto disidratazione fanghi dell'impianto di depurazione	260.000		-	-	-	
93273081	SAN MARTINO BUON ALBERGO	A.1 - 09 A.1 - 124	Realizzazione acquedotto in località Pignatte	150.000		-	-	-	
93174100	SAN MAURO DI SALINE	B.1 - 40	Realizzazione collettore fognario a servizio di utenze non servite	100.000	100.000	-	-	-	
93375080	SAN PIETRO DI MORUBIO	A.1 - 77	Realizzazione rete acquedotto in zona non servita nella frazione di Bonavicina	30.000		-	-	-	
93372070	SANGUINETTO	B.4 - 14	* 1°INTERVENTO: Ristrutturazione della rete fognaria del Comune di Sanguinetto - Rifacimento del collettore consortile Boschetti. 2°INTERVENTO: Ristrutturazione rete fognaria - realizzazione di una vasca volano nel Comune di Sanguinetto al servizio del collettore fognario consortile dei comuni ex CO.GE.FO	1.800.000	930.000	-	30.458	30.458	adeguamento post consuntivo 2012
93178071	SANT'ANNA D'ALFAEDO	B.3 - 12	Realizzazione impianto di depurazione e relativa rete a servizio della frazione di Vaggimal	400.000		-	-	-	
93178090	SANT'ANNA D'ALFAEDO	B.1 - 44	Realizzazione rete fognaria nel comune di Sant'Anna d'Alfaedo e zone limitrofe (frazioni Fosse, Ronconi e Vaona)	627.000	627.000	-	-	-	
93178100	SANT'ANNA D'ALFAEDO	B.3 - 12	Realizzazione impianto di depurazione e relativa rete a servizio della frazione di Vaggimal - 2° Stralcio	180.000		-	15.166	15.166	adeguamento post consuntivo 2012
93178101	SANT'ANNA D'ALFAEDO	B.1 - 65	1° stralcio - collegamento frazione Ronconi	150.000	150.000	-	-	-	
93281080	SOAVE	B.1 - 73	Ristrutturazione urgente reti fognatura ed acquedotto di Borgo Covregno e Borgo San Lorenzo	550.000		-	-	-	
93281110	SOAVE	C.5 - 20	Rifacimento rete idrica nel quartiere "musicisti" del capoluogo	271.000		-	-	-	
93281070	SOAVE	B.1 - 77	* Rifacimento e completamento delle reti di fognatura e acquedotto di C.so Vittorio Emanuele, Via Cangrande e vicoli adiacenti (in concomitanza a intervento su rete gas)	909.728		-	-	-	
93282070	SOMMACAMPAGNA	B.2 - 23	* Lavori all'impianto di depurazione (completamento per lo scarico al suolo)	500.000		-	-	-	



CODICE ACVR	COMUNE	CODICE PdA 2011	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO	IMPORTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO	ANNO 2013 APP. 8/2012	INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2013	SCOSTAMENTO	CAUSE SCOSTAMENTO
93282072	SOMMACAMPAGNA	A.1 - 07	Ottimizzazione impianto rilancio acquedotto Sommacampagna e serbatoio Custoza	452.000		-	-	-	
32911300	VERONA	A.1 - 01	Adeguamento rete acquedottistica in via Volte Maso	80.000		80.000	49.265	- 30.735	ritardi di realizzazione
93291081	VERONA	B.2 - 07	* Depuratore "Città di Verona": interventi urgenti per adeguamento	600.000		-	168	168	adeguamento post consuntivo 2012
93291081	VERONA	B.2 - 08	Depuratore "Città di Verona": "copertura vasche ossidazione"	1.627.020		-	-	-	
93291090	VERONA	B.5 - 31	Adeguamento della rete fognaria di Montorio: 1a fase (intervento urgente per adeguamento sfioratore)	200.000		-	-	-	
93291091	VERONA	C.5 - 03	Intervento per risolvere il problema dei depositi di sabbia all'utenza nelle zone di Poiano e S. Michele. (Rete acquedotto Verona)	120.000		-	-	-	
93291101	VERONA	B.1 - 04	Estensione rete fognaria in Via Ponte San Pancrazio e in Via 28 Marzo	460.000		-	28.685	28.685	adeguamento post consuntivo 2012
93193070	VESTENANOVA	A.1 - 154	Completamento acquedotto ed adeguamento fognatura in località del capoluogo sprovviste di rete: fognatura Mainenti	108.857		-	-	-	
93394070	VIGASIO	D.2 - 35 D.2 - 42	* Adeguamento funzionale del depuratore comunale del capoluogo - 1° stralcio	215.000		-	-	-	
93394090	VIGASIO	D.2 - 30	* Rifacimento linea fognaria Via Villafranca	180.000		-	-	-	
93296070	VILLAFRANCA DI VERONA	B.1 - 237	* Riqualificazione via Quadrato - per fognatura - (considerare solo quota per lav. di fognatura)	579.916		-	3.972	3.972	adeguamento post consuntivo 2012
93296071	VILLAFRANCA DI VERONA	B.1 - 237	* Realizzazione rete fognaria in loc. Pozzomoretto	700.000		-	-	-	
93397070	ZEVIO	B.2 - 06	Interventi per l'adeguamento del depuratore in località Tre Corone	300.000		-	-	-	
93397090	ZEVIO	B.1 - 03	Ristrutturazione della rete di fognatura comunale - 1° stralcio	483.000		-	-	-	
93397091	ZEVIO	B.1 - 148	Ristrutturazione della rete di fognatura comunale - 4° stralcio	263.000		-	-	-	



CODICE ACVR	COMUNE	CODICE PdA 2011	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO	IMPORTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO	ANNO 2013 APP. 8/2012	INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2013	SCOSTAMENTO	CAUSE SCOSTAMENTO
93300070	PIU' COMUNI ³	C.4 - 04	Interventi per rifacimento rete idrica in Albaredo, Arcole, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S.A., Cologna V., Legnago, Minerbe, Pressana, Roveredo, Veronella, Zimella - 1° e 2° Stralcio	1.868.337	1.145.000	-	-	-	
93300071	PIU' COMUNI ⁴	A.1 - 152	Interventi per estensione rete idrica in Albaredo, Arcole, Bonavigo, Boschi S.A., Cologna V., Legnago, Minerbe, Pressana, Roveredo, Terrazzo, Veronella, Zimella - 1° Stralcio	1.201.663		-	-	-	
93300072	PIU' COMUNI ⁵	B.2 - 27	Completamento seconda fase schema fognario consortile (4° lotto)	700.000	700.000	-	-	-	
93353070	PIU' COMUNI: NOGARA+GAZZO	A.1 - 150	Lavori di ripristino della funzionalità degli acquedotti dei comuni di Nogara e Gazzo: 3° Stralcio (CISI)	1.150.000	575.000	-	-	-	
93353080	PIU' COMUNI: NOGARA+GAZZO	A.1 - 150	Lavori di ripristino della funzionalità degli acquedotti dei comuni di Nogara e Gazzo: 2° Stralcio (CISI)	850.000	425.000	-	-	-	
93302080	ALBAREDO D'ADIGE	B.1 - 57	Realizzazione rete idrica e fognaria in zone sprovviste all'interno del capoluogo: completamento fognatura e acquedotto	221.500		-	-	-	
93303100	ANGIARI	B.1 - 142	Realizzazione tratti fognatura in Via Santa Croce, Via Possessione, Via Cason	925.000		46.160	-	- 46.160	sospensione dell'investimento
93304110	ARCOLE	A.1-31	Interventi urgenti per adeguamento del sistema fognario e acquedottistico del Comune - stralcio funzionale	120.000	100.000	-	-	-	
33011400	ARCOLE	A.1-31	Interventi urgenti per adeguamento del sistema fognario e acquedottistico del Comune - completamento	105.000		-	-	-	
93105080	BADIA CALAVENA	B.1 - 78	Realizzazione condotte fognarie al servizio del capoluogo	1.851.000		-	7.752	7.752	adeguamento post consuntivo 2012
93207080	BELFIORE	A.1 - 53	Opere acquedottistiche a tutela qualitativa della falda	2.850.000	1.000.000	550.000	916.603	366.603	anticipi di realizzazione

³ ALBAREDO, ARCOLE, BEVILACQUA, BONAVIGO, BOSCHI S.A., COLOGNA V., LEGNAGO, MINERBE, PRESSANA, ROVEREDO, VERONELLA, ZIMELLA

⁴ ALBAREDO, ARCOLE, BONAVIGO, BOSCHI S.A., COLOGNA V., LEGNAGO, MINERBE, PRESSANA, ROVEREDO, TERRAZZO, VERONELLA, ZIMELLA

⁵ ARCOLE, BEVILACQUA, BONAVIGO, BOSCHI S.A., MINERBE, TERRAZZO



CODICE ACVR	COMUNE	CODICE PdA 2011	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO	IMPORTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO	ANNO 2013 APP. 8/2012	INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2013	SCOSTAMENTO	CAUSE SCOSTAMENTO
93207110	BELFIORE	B.1 - 161	Estensione rete fognaria a zone non servite e collettamento al depuratore di Belfiore - 2° stralcio Via Casoni	85.000		12.588	-	- 12.588	sospensione dell'investimento
93308100	BEVILACQUA	B.1 - 56	Adeguamento reti fognarie - stralcio funzionale	192.000	160.000	-	-	-	
93308100	BEVILACQUA	B.1 - 56	Adeguamento reti fognarie - completamento	128.000		-	-	-	
93111070	BOSCO CHIESANUOVA	B.1 - 34	Allacciamento contrada Grobbe al collettore della Lessinia	269.000		-	-	-	
93111080	BOSCO CHIESANUOVA	A.1 - 112	Allacciamento all'acquedotto delle contrade Brutti, Rolli, Merli, Tecle e Squaranton	303.000		70.000	-	- 70.000	sospensione dell'investimento
33121200	BOVOLONE	B.2 - 29	Adeguamento impianto di depurazione	3.000.000		-	-	-	
33121210	BOVOLONE	B.2 - 29	Depuratore di Bovolone, San Pierino: interventi di adeguamento funzionale dell'attuale impianto	463.000		392.692	-	- 392.692	sospensione dell'investimento
93312070	BOVOLONE	B.2 - 29	* Estensione e adeguamento rete fognaria nel Comune di Bovolone - stralcio funzionale	200.000	200.000	40.000	3.752	- 36.248	ritardi di realizzazione
93312070	BOVOLONE	B.2 - 29	* Estensione e adeguamento rete fognaria nel Comune di Bovolone - completamento	1.039.000		-	-	-	
93312081	BOVOLONE	A.1 - 68	Estensione rete acquedotto a zone non servite e collegamento con la rete di Oppeano - 1° stralcio	350.000		-	-	-	
93312100	BOVOLONE	A.1 - 68	Prolungamento della rete acquedotto in Via San Giovanni	200.000		-	-	-	
32151200	BUSSOLENGO	B.2 - 05	Adeguamento impianto di depurazione	1.200.000		-	-	-	
32151210	BUSSOLENGO	B.2 - 05	Depuratore di Bussolengo: Interventi di adeguamento funzionale dell'attuale impianto	302.000		257.708	-	- 257.708	sospensione dell'investimento
32151300	BUSSOLENGO	B.1 - 20	Adeguamento della rete fognaria in via Citella	60.000		60.000	-	- 60.000	sospensione dell'investimento
93215070	BUSSOLENGO	D.2 - 08	* Rifacimento fognatura in alcune vie del capoluogo	104.841		-	-	-	
93215100	BUSSOLENGO	B.1 - 06	Ampliamento fognature - stralcio funzionale	200.000	200.000	-	-	-	
93215100	BUSSOLENGO	B.1 - 06	Ampliamento fognature - completamento	125.000		-	-	-	
93216070	BUTTAPIETRA	D.2 - 44	* Ristrutturazione delle condotte principali della rete fognaria comunale di Buttapietra	1.500.000		-	-	-	
93216090	BUTTAPIETRA	B.1 - 191	* Estensione rete fognaria nel comune di Buttapietra - Via Isola della Scala e Via dell'Artigianato	540.437		-	388	388	adeguamento post consuntivo 2012



CODICE ACVR	COMUNE	CODICE PdA 2011	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO	IMPORTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO	ANNO 2013 APP. 8/2012	INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2013	SCOSTAMENTO	CAUSE SCOSTAMENTO
35171400	CALDIERO		Adeguamento ed estensione reti fognarie e acquedottistiche	495.470		-	-	-	
93319070	CASALEONE	B.1 - 175	* Estensione della rete fognaria	975.000		-	-	-	
32211300	CASTEL D'AZZANO	A.1-116 B.1-168	Adeguamento ed estensione della rete acquedottistica e fognaria	623.483		35.000	-	- 35.000	sospensione dell'investimento
32211301	CASTEL D'AZZANO	D.2-42	Depuratore di Castel d'Azzano: interventi di adeguamento funzionale dell'attuale impianto	540.000		30.000	-	- 30.000	sospensione dell'investimento
93325080	CEREA	D.2 - 46	Adeguamento collettore fognatura consortile della linea di Cerea	600.000		-	-	-	
93325081	CEREA	A.1 - 70	Estensione rete idrica e fognaria in zone attualmente prive della rete di distribuzione e per risolvere il problema dell'arsenico nell'acqua	360.000		-	-	-	
93327071	COLOGNA VENETA	B.1 - 64	Completamento delle reti di fognatura nella frazione di Spessa di Cologna Veneta e altre località dei Comuni limitrofi	2.000.000		-	-	-	
93327072	COLOGNA VENETA	B.1 - 194	Collettamenti fognari al depuratore per il disinquinamento dell'area Fratta-Gorzone	1.170.000		-	-	-	
93327080	COLOGNA VENETA	B.1 - 135	Estensione della rete fognaria afferente all'impianto di depurazione di Cologna Veneta	4.980.000	3.000.000	550.000	834.105	284.105	anticipi di realizzazione
93327081	COLOGNA VENETA	B.2 - 15	Potenziamento ed adeguamento del depuratore di Cologna Veneta: 1° stralcio	1.020.000		1.152	-	-1.152	adeguamento post consuntivo 2012
32281200	COLOGNOLA AI COLLI	B.1 - 88 C.5 - 30	Adeguamento di estensione della rete acquedottistica e fognaria	953.872		118.200	2.150	- 116.050	sospensione dell'investimento
93329000	CONCAMARISE					-	-	-	
93332100	ERBE'	B.1 - 197 D.2 - 22 D.1 - 13	Posa della condotta di fognatura nera in Via XXV Aprile, Via Giacomo Matteotti e dismissione impianto di depurazione di Erbe' per collettamento a Sorgà	587.000		-	-	-	
93332101	ERBE'	B.5 - 15	Rifacimento reti di fognatura in Via San Giuseppe, Via F.lli Cairoli, Viale Europa, Via XX Settembre	587.313		-	-	-	
93133070	ERBEZZO	B.1 - 147	Adeguamenti urgenti rete esistente e progetto di completamento della rete fognaria del Comune di Erbezzo	1.610.000		-	-	-	



CODICE ACVR	COMUNE	CODICE PdA 2011	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO	IMPORTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO	ANNO 2013 APP. 8/2012	INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2013	SCOSTAMENTO	CAUSE SCOSTAMENTO
93135100	FUMANE	B.1 - 36 A.1 - 126	Adeguamento ed estensione reti fognarie e acquedottistiche - stralcio funzionale	279.240	232.700	-	-	-	
93135100	FUMANE	B.1 - 36 A.1 - 126	Adeguamento ed estensione reti fognarie e acquedottistiche - completamento	186.160		-	-	-	
93337120	GAZZO VERONESE	A.1 - 104	Realizzazione della rete idrica a servizio della frazione Maccacari	318.000		-	-	-	
93337070b	GAZZO VERONESE	B.1 - 129 B.1 - 130 B.1 - 133	* Completamento rete fognaria comunale: - via Boschi (353.000€) - via Porto (300.000€) - via Buche Levà di sotto (400.000€)	1.053.000		-	-	-	
31381200	GREZZANA	A.1 - 92 C.1 - 105	Rifacimento serbatoio "La Costa"	1.661.000		-	-	-	
93138071	GREZZANA	B.1 - 16	* Fognatura Frazione di Azzago: 2° Stralcio	1.340.000		-	-	-	
93138073	GREZZANA	B.1 - 238	* Fognatura Frazione di Alcenago - loc. Coda, Vigo, Rupiano	2.500.000		-	-	-	
35391400	ILLASI		Adeguamento ed estensione reti fognarie e acquedottistiche	355.669		-	-	-	
93340081	ISOLA DELLA SCALA	B.2 - 30	Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a Isola della Scala e collettori di collegamento reti esistenti	4.300.000		91.240	-	-91.240	sospensione dell'investimento
32401400	ISOLA DELLA SCALA		Adeguamento urgente sistema fognario - depurativo	926.000		-	-	-	
93242100	LAVAGNO	B.1 - 07	Estensione rete fognaria a località San Briccio - 1° stralcio	400.000		-	-	-	
93242101	LAVAGNO	B.1 - 202	Estensione rete fognaria alla località San Giacomo e adeguamento rete di collettamento a San Martino Buon Albergo: completamento	425.000		100.000	14.297	-85.703	sospensione dell'investimento
33441300	LEGNAGO	B.2 - 19	Depuratore di Vangadizza: interventi di adeguamento funzionale dell'attuale impianto	500.000		30.000	-	- 30.000	sospensione dell'investimento
93344070	LEGNAGO	B.1 - 203	* Interventi di adeguamento e completamento della rete fognaria in destra Adige - Porto e località Casette	400.000		-	-	-	
93344071	LEGNAGO	A.1 - 149	Interventi per risolvere il problema arsenico nell'acqua potabile: completamento rete di distribuzione idrica nel comune di Legnago	4.450.000		100.000	-	-100.000	sospensione dell'investimento



CODICE ACVR	COMUNE	CODICE PdA 2011	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO	IMPORTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO	ANNO 2013 APP. 8/2012	INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2013	SCOSTAMENTO	CAUSE SCOSTAMENTO
93146070	MARANO DI VALPOLICELLA	B.5 - 16	Separazione rete fognatura capoluogo e allacciamenti acquedotto nella frazione di Purano	280.000		-	-	-	
93146100	MARANO DI VALPOLICELLA	A.1 - 14 B.1 - 50 B.5 - 06 D.2 - 14	Adeguamento di reti fognatura e acquedotto - stralcio funzionale	432.300	360.250	-	-	-	
93146100	MARANO DI VALPOLICELLA	A.1 - 14 B.1 - 50 B.5 - 06 D.2 - 14	Adeguamento di reti fognatura e acquedotto - completamento	288.200		-	-	-	
32491200	MONTECCHIA DI CROSARA	B.1 - 206	Estensione rete fognaria in Via Zaffaini	280.000		-	-	-	
93250100	MONTEFORTE D'ALPONE	B.1 - 09	Adeguamento e potenziamento sistema fognario	217.000	200.000	202.024	-	-202.024	ritardi di realizzazione
93250101	MONTEFORTE D'ALPONE	B.1 - 207	Estensione rete fognaria in via Molinetto e via Dian - stralcio funzionale	148.320	123.600	-	-	-	
93250101	MONTEFORTE D'ALPONE	B.1 - 207	Estensione rete fognaria in via Molinetto e via Dian - completamento	98.880		-	-	-	
93251070	MOZZECANE	B.2 - 44	* Adeguamento del depuratore comunale ai nuovi carichi provenienti dalla rete fognaria di Grezzano e zone limitrofe	850.000		15.461	-	-15.461	sospensione dell'investimento
93152080	NEGRAR	B.1 - 15	Realizzazione rete fognaria nelle frazioni di Fane e Mazzano e loro collettamento alla rete di Negrar	4.000.000		-	-	-	
93152081	NEGRAR	A.1 - 02	Estensione rete idrica S. Peretto - 2° e 3° Stralcio	472.000		-	-	-	
93152082	NEGRAR	B.1 - 209	Realizzazione rete fognaria nelle frazioni di Montecchio e Spigamonte e loro collettamento alla rete di Negrar	2.055.750		-	-	-	
93152101	NEGRAR	B.1 - 211	Realizzazione rete fognatura di Via Archimede (zona industriale), Via Roverina, Cà Paletta	250.000		-	-	-	
93152102	NEGRAR	B.1 - 51	Adeguamento e potenziamento sistema fognario - stralcio funzionale	1.020.000	850.000	-	5.720	5.720	adeguamento post consuntivo 2012
93152102	NEGRAR	B.1 - 51	Adeguamento e potenziamento sistema fognario - completamento	101.100		-	-	-	



CODICE ACVR	COMUNE	CODICE PdA 2011	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO	IMPORTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO	ANNO 2013 APP. 8/2012	INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2013	SCOSTAMENTO	CAUSE SCOSTAMENTO
33531200	NOGARA	B.2 - 31	Adeguamento impianto di depurazione	1.875.000		35.000	-	-35.000	sospensione dell'investimento
32531400	NOGARA		Adeguamento urgente sistema fognario - depurativo	800.000		-	-	-	
93254080	NOGAROLE ROCCA	B.2 - 38	* Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a Nogarole Rocca e collettori di collegamento reti esistenti: impianto di depurazione	2.468.000		457.076	564.056	106.980	adeguamento post consuntivo 2012
33551200	OPPEANO	B.2 - 02	Adeguamento impianto di depurazione di Casotton	600.000		25.000	9.556	-15.444	risparmi
35531300	OPPEANO	B.1 - 177	Estensione della rete fognaria in Via Villafontana	624.000		-	-	-	
93355070	OPPEANO	B.2 - 02	Potenziamento depuratore di Feniletto nel comune di Oppeano (Potenziamento del sistema di depurazione nelle zone Feniletto e limitrofe nel Comune di Oppeano)	3.608.000		-	-	-	
93355080c	OPPEANO	A.1 - 108	Realizzazione nuovi tratti rete acquedotto in zone attualmente sprovviste: realizzazione nuovi tratti di rete acquedotto nelle vie Boscoriondo, Spineta, Finiletto, Fornello e Franchine	720.000		400.000	-	-400.000	sospensione dell'investimento
93356100	PALU'	A.1 - 54	Adeguamento e potenziamento acquedotto - stralcio funzionale	1.076.400	897.000	-	-	-	
93356100	PALU'	A.1 - 54	Adeguamento e potenziamento acquedotto - completamento	323.600		-	-	-	
32581300	PESCANTINA	D.2 - 20	Depuratore di Pescantina, loc. Tremolè: interventi di adeguamento funzionale dell'attuale impianto	370.000		25.000	-	-25.000	sospensione dell'investimento
93258100	PESCANTINA	A.1 - 17	Realizzazione rete idrica e fognaria in Viale Verona - stralcio funzionale	462.000	385.000	-	1.081	1.081	adeguamento post consuntivo 2012
93258100	PESCANTINA	A.1 - 17	Realizzazione rete idrica e fognaria in Viale Verona - completamento	308.000		-	-	-	
32601200	POVEGLIANO	B.2 - 13 D.2 - 42	Potenziamento impianto di depurazione	3.750.000		40.000	-	-40.000	sospensione dell'investimento
32601210	POVEGLIANO	B.2 - 13	Depuratore di Povegliano: Interventi di adeguamento funzionale dell'attuale impianto	707.000		477.698	-	-477.698	sospensione dell'investimento
35360700	PRESSANA					-	-	-	



CODICE ACVR	COMUNE	CODICE PdA 2011	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO	IMPORTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO	ANNO 2013 APP. 8/2012	INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2013	SCOSTAMENTO	CAUSE SCOSTAMENTO
32631200	RONCA'	B.1 - 163	Adeguamento e sistemazione rete fognaria nel capoluogo	750.000		40.000	39.500	-500	ritardi di realizzazione
93364100	RONCO ALL'ADIGE	B.1 - 179	Estensione rete fognaria in Via della Pozza, Via Crosarona e Via Casetta nel capoluogo e in Via Cà del Sale in frazione Tombasozana - stralcio funzionale	720.000	600.000	-	0	0	
93364100	RONCO ALL'ADIGE	B.1 - 179	Estensione rete fognaria in Via della Pozza, Via Crosarona e Via Casetta nel capoluogo e in Via Cà del Sale in frazione Tombasozana - completamento	266.000		-	-	-	
33651200	ROVERCHIARA	B.1 - 08	Estensione rete fognaria in Via Bussè	300.000		-	-	-	
31671300	ROVERE' VERONESE	B.3 - 08	Completamento rete fognaria a servizio del capoluogo e nella frazione di San Rocco di Piegara e San Francesco: fognatura San Rocco (completamento)	334.000		-	-	-	
93167070	ROVERE' VERONESE	B.1 - 104	Completamento rete fognaria a servizio del capoluogo e nella frazione di San Rocco di Piegara e San Francesco: fognatura San Francesco	180.000		-	-	-	
35360700	ROVEREDO DI GUA'					-	-	-	
93368100	SALIZZOLE	B.1 - 137	Fognature in alcune vie del territorio comunale (nelle Località Bionde, Engazzà, Salizzole, Valmorsel)	1.283.080		13.018	15.507	2.489	adeguamento post consuntivo 2012
93368101	SALIZZOLE	A.1 - 22	Estensione reti acquedottistiche e fognarie in alcune vie del capoluogo - stralcio funzionale	120.000	100.000	-	-	-	
93368101	SALIZZOLE	A.1 - 22	Estensione reti acquedottistiche e fognarie in alcune vie del capoluogo - completamento	80.000		-	-	-	
93269070	SAN BONIFACIO	B.5 - 26	Collettore fognario zona est di alleggerimento della rete di San Bonifacio - 1° stralcio	2.820.000	1.824.313	705.000	908.954	203.954	anticipi di realizzazione
93269070	SAN BONIFACIO	B.5 - 26	Collettore fognario zona est di alleggerimento della rete di San Bonifacio - completamento 2° stralcio	2.030.000		-	-	-	
93269071	SAN BONIFACIO	B.5 - 24	* Collettore fognario zona sud di alleggerimento della rete di San Bonifacio, frazioni di Locare, Lobia e Prova	2.100.000		-	-	-	



CODICE ACVR	COMUNE	CODICE PdA 2011	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO	IMPORTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO	ANNO 2013 APP. 8/2012	INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2013	SCOSTAMENTO	CAUSE SCOSTAMENTO
93269072	SAN BONIFACIO	D.2 - 18	* Riqualficazione sistema fognario frazione di Prova	500.000		-	-	-	
93269090	SAN BONIFACIO	B.2 - 45	* Opere di affinamento e disinfezione scarico al depuratore di S. Bonifacio: pretrattamenti + trattamenti terziari	1.260.696		433.039	202.690	-230.349	adeguamento post consuntivo 2012
93269100	SAN BONIFACIO	B.1 - 48	Adeguamento fognature	185.000		-	1.765	1.765	adeguamento post consuntivo 2012
93269101	SAN BONIFACIO	C.2 - 08	Collegamento acquedottistico San Bonifacio - Almisano	2.500.000		-	-	-	
31701200	SAN GIOVANNI ILARIONE	B.1 - 166	Completamento ed adeguamento rete fognaria in via Verdi	90.000	33.000	70.000	1.250	-68.750	ritardi di realizzazione
93271082	SAN GIOVANNI LUPATOTO	B.2 - 46	Ottimizzazione ed ampliamento impianto di depurazione da 24.000 a 40.000 AE	3.958.000		60.000	-	-60.000	sospensione dell'investimento
37321300	SAN MARTINO BUON ALBERGO	D.2 - 41	Depuratore di San Martino B/Albergo, loc. Cà dell'Aglio: interventi di adeguamento funzionale dell'attuale impianto	280.000		-	-	-	
93273080	SAN MARTINO BUON ALBERGO	B.3 - 09	Realizzazione rete fognaria nella frazione di Mambrotta: 1°stralcio, condotte piazza (90.545€) 2°stralcio, condotte e impianto depurazione (898.455€)	989.000		-	-	-	
93273100	SAN MARTINO BUON ALBERGO	B.3 - 09	Realizzazione rete fognaria nella frazione di Mambrotta: opere di completamento	472.000		-	-	-	
32751400	SAN PIETRO DI MORUBIO		Adeguamento urgente sistema fognario - depurativo	265.000		-	-	-	
32761200	SAN PIETRO IN CARIANO	B.2 - 11	Adeguamento impianto di depurazione	4.525.000		40.000	-	-40.000	sospensione dell'investimento
32761210	SAN PIETRO IN CARIANO	B.2 - 11	Interventi di adeguamento funzionale dell'attuale impianto	475.000		419.357	16.798	-402.559	sospensione dell'investimento
93276090	SAN PIETRO IN CARIANO	B.5 - 11	Interventi di miglioramento della rete fognaria comunale: Area intervento Cadiloi	700.000		164.970	-	-164.970	sospensione dell'investimento
93276090	SAN PIETRO IN CARIANO	B.5 - 11	Interventi di miglioramento della rete fognaria comunale: Area intervento Cà dell'Ebreo	700.000		-	-	-	



CODICE ACVR	COMUNE	CODICE PdA 2011	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO	IMPORTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO	ANNO 2013 APP. 8/2012	INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2013	SCOSTAMENTO	CAUSE SCOSTAMENTO
93276090	SAN PIETRO IN CARIANO	B.5 - 11 B.1 - 184	Interventi di miglioramento della rete fognaria comunale: Area intervento Villaggio Stella	700.000		-	-	-	
93276091	SAN PIETRO IN CARIANO	C.5 - 53	Interventi di miglioramento della rete fognaria comunale: nuovo sfioratore in località Paladon	272.000		-	-	-	
93276100	SAN PIETRO IN CARIANO	B.5 - 14	Adeguamento ed estensione della rete idrica e fognaria nel capoluogo (sfioratore Valena) - stralcio funzionale	162.000	135.000	15.000	-	-15.000	ritardi di realizzazione
93276100	SAN PIETRO IN CARIANO	B.5 - 14	Adeguamento ed estensione della rete idrica e fognaria nel capoluogo (sfioratore Valena) - completamento	1.076.000		-	-	-	
31781200	SANT'ANNA D'ALFAEDO	B.3 - 13	Realizzazione reti fognatura e acquedotto in località Cona	220.000		-	-	-	
93178070	SANT'ANNA D'ALFAEDO	C.3 - 05	Rifacimento e potenziamento della condotta per l'alimentazione di acqua potabile al paese di S. Anna	975.000		-	-	-	
32821200	SOMMACAMPAGNA	B.2 - 23 D.2 - 42	Impianto di depurazione di Sommacampagna: adeguamento funzionale e ottimizzazione	3.500.000		50.000	-	-50.000	sospensione dell'investimento
93282071	SOMMACAMPAGNA	B.1 - 43	* Realizzazione by-pass del collettore fognario di Sona	620.800		-	-	-	
35830700	SONA					-	-	-	
93384080	SORGA'	B.2 - 39 B.1 - 172	* Realizzazione impianto di depurazione di Sorgà e reti di collettamento	3.414.940		50.000	-	-50.000	sospensione dell'investimento
93384081	SORGA'	B.2 - 39	* Realizzazione impianto di depurazione di Bonferraro e reti di collettamento	1.638.000		-	-	-	
35850700	TERRAZZO					-	-	-	
35870900	TREGNAGO					-	-	-	
93388070	TREVENZUOLO	D.2 - 45	Interventi per l'adeguamento del depuratore in località Fagnano	300.000		-	-	-	
93190100	VELO VERONESE	A.1 - 80	Estensione rete acquedotto contrada Scrivazzi, Garzon e Tezze	963.086		-	-	-	
93291070	VERONA	B.1 - 04	* Fognatura Via del Pestrino, fraz. Copella e tratti minori in Verona e Comuni limitrofi	1.100.000		173.000	4.866	-168.134	sospensione dell'investimento
93291080	VERONA	B.4 - 16	Interventi urgenti per l'adeguamento del sistema fognario di Veronetta (collettore 8M): 1° stralcio	1.900.000		-	7.440	7.440	adeguamento post consuntivo 2012



CODICE ACVR	COMUNE	CODICE PdA 2011	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO	IMPORTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO	ANNO 2013 APP. 8/2012	INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2013	SCOSTAMENTO	CAUSE SCOSTAMENTO
93291081	VERONA	B.2 - 47	Adeguamento depuratore - Interventi sulla linea acque	4.885.000		50.000	-	-50.000	sospensione dell'investimento
93291081	VERONA	B.2 - 43	Adeguamento depuratore Verona - Comparto per il trattamento dei rifiuti liquidi (35.000 AE)	3.057.000		-	-	-	
93291100	VERONA	B.1 - 04	Estensione rete fognaria in Via Lazzaretto	500.000		-	1.976	1.976	adeguamento post consuntivo 2012
93291102	VERONA	B.1 - 04 A.1 - 01	Estensione rete fognaria e potenziamento rete acquedottistica in Via Cà dei Recchi, Via Guerrieri e Via Brigata Casale	458.000		-	-	-	
93291103	VERONA	A.1 - 01	Potenziamento rete acquedotto località Trezzolano	249.000		206.560	-	-206.560	sospensione dell'investimento
93291110	VERONA	B.1 - 04	Risanamento collettore fognario di Via Faccio	2.600.000		-	-	-	
93291111	VERONA	C.5 - 21 C.1 - 05	Spostamento serbatoio "Terza torre Massimiliana"	867.000		30.000	-	- 30.000	sospensione dell'investimento
93392100	VERONELLA	B.1 - 236	Fognature nelle Vie Desmontà, Lavagnoli, Fornasa, Stradon, San Marcello, Giamone e nella frazione Miega	2.391.500		-	-	-	
31931300	VESTENANOVA	A.1 - 154	Rete fognaria e vasca Imhoff a servizio della Contrada Zovo nel Comune di Vestenanova	130.000		126.360	3.120	- 123.240	sospensione dell'investimento
93193070	VESTENANOVA	A.1 - 44	Completamento acquedotto ed adeguamento fognatura in località del capoluogo sprovviste di rete: acquedotto Barco	173.000		-	-	-	
33941200	VIGASIO	D.2 - 35	Interventi di adeguamento funzionale dell'attuale impianto (2° stralcio dell'intervento complessivo da 515.000€ "Piani stralcio")	300.000		233.116	-	- 233.116	sospensione dell'investimento
33941300	VIGASIO	D.2 - 30	Adeguamento rete fognaria via Dante Alighieri	128.000		10.000	1.040	-8.960	sospensione dell'investimento
93395070	VILLA BARTOLOMEA	B.1 - 181	* Completamento fognature nel capoluogo - 2° stralcio	385.000		-	-	-	
93395071	VILLA BARTOLOMEA	A.1 - 52	Collegamento idrico Legnago-Villa Bartolomea (capoluogo)	1.500.000	800.000	550.000	508.320	-41.680	ritardi di realizzazione
93296100	VILLAFRANCA DI VERONA	B.1 - 237	Fognature in varie vie sprovviste di rete - stralcio funzionale	1.750.000	950.000	200.000	6.986	-193.014	ritardi di realizzazione



CODICE ACVR	COMUNE	CODICE PdA 2011	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO	IMPORTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO	ANNO 2013 APP. 8/2012	INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2013	SCOSTAMENTO	CAUSE SCOSTAMENTO
93296100	VILLAFRANCA DI VERONA	B.1 - 237	Fognature in varie vie sprovviste di rete - completamento	889.000		-	-	-	
33971200	ZEVIO	B.2 - 06	Depuratore di Zevio, Tre Corone: interventi di adeguamento funzionale dell'attuale impianto	175.000		147.942	-	-147.942	sospensione dell'investimento
33971300	ZEVIO	B.1 - 148	Estensione rete fognaria a zone non servite	350.000		10.000	-	-10.000	sospensione dell'investimento
35980700	ZIMELLA					-	-	-	
30001300	PIU' COMUNI: ⁶	A.2 - 12	Intervento urgente per risoluzione fase di emergenza presenza PFAS nelle acque potabili prelevate ad Almisano	2.800.000	2.000.000	-	63.066	63.066	interventi straordinari
93100070	PIU' COMUNI: ⁷	B.5 - 19	* Rifacimento del collettore fognario Valpantena - 1° stralcio	4.280.000	4.030.000	350.000	-	- 350.000	mancate autorizzazioni / approvazioni
93100070	PIU' COMUNI: ⁷	B.5 - 19	* Rifacimento del collettore fognario Valpantena - completamento 2° stralcio	9.720.000		-	-	-	
93167100	PIU' COMUNI ⁸	B.3 - 08 D.2 - 02	Adeguamento fognario e depurativo dei due capoluoghi	250.000	250.000	-	22.224	22.224	adeguamento post consuntivo 2012
33991200	PIU' COMUNI ⁹	A.1 - 132	Estensione rete acquedotto nei Comuni di Nogara e Gazzo Veronese - 1° stralcio - Nogara	1.144.000		50.000	30.998	-19.002	sospensione dell'investimento
33991201	PIU' COMUNI ⁹	A.1 - 132 A.2 - 47	Estensione rete acquedotto nei Comuni di Nogara e Gazzo Veronese - 2° stralcio - Potenziamento adduzione	4.480.000		-	-	-	
93337110	PIU' COMUNI ⁹	A.1 - 104	Estensione rete acquedotto nei Comuni di Nogara e Gazzo Veronese - 3° stralcio - Gazzo Veronese	2.876.000		-	-	-	
92400111	PIU' COMUNI	A.1	Interventi di pianificazione territoriale: estensioni e potenziamenti acquedotto concomitanti a interventi per nuove lottizzazioni e/o in concomitanza ad interventi di altri enti	882.988		125.000	96.826	-28.174	sospensione dell'investimento

⁶ ALBAREDO, ARCOLE, BEVILACQUA, BONAVIGO, BOSCHI S.A., COLOGNA V., LEGNAGO, MINERBE, PRESSANA, ROVEREDO, TERRAZZO, VERONELLA, ZIMELLA

⁷ BOSCO CHIESANUOVA, CERRO VERONESE, ERBEZZO, GREZZANA, SANT'ANNA D'ALFAEDO

⁸ ROVERE' VERONESE, VELO VERONESE

⁹ ISOLA DELLA SCALA, NOGARA, GAZZO VERONESE



CODICE ACVR	COMUNE	CODICE PdA 2011	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO	IMPORTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO	ANNO 2013 APP. 8/2012	INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2013	SCOSTAMENTO	CAUSE SCOSTAMENTO
92400111	PIU' COMUNI	B.1	Interventi di pianificazione territoriale: estensioni e potenziamenti fognatura concomitanti a interventi per nuove lottizzazioni e/o in concomitanza ad interventi di altri enti	505.431		75.000	89.386	14.386	adeguamento post consuntivo 2012
92400112	PIU' COMUNI	C.5 - 02	Situazioni di potenziale pericolo per la salute pubblica e danno all'ambiente: interventi acquedotto	1.287.006		100.000	63.692	-36.308	sospensione dell'investimento
92400112	PIU' COMUNI	D.2 - 40	Situazioni di potenziale pericolo per la salute pubblica e danno all'ambiente: interventi fognatura/depurazione	2.757.056		250.000	74.850	- 175.150	sospensione dell'investimento
92400090	PIU' COMUNI	C.5 - 02	Adeguamenti a livello di esercizio minimo e ottimizzazione reti e impianti acquedotto	4.421.434		533.000	527.615	-5.385	sospensione dell'investimento
92400090	PIU' COMUNI	D.2 - 40	Adeguamenti a livello di esercizio minimo e ottimizzazione reti e impianti fognatura/depurazione	8.130.648		1.067.000	722.976	-344.024	sospensione dell'investimento
92400091	PIU' COMUNI	C.5 - 02	Messa a norma inerenti la sicurezza degli impianti acquedotto	1.876.491		300.000	30.500	- 269.500	sospensione dell'investimento
92400091	PIU' COMUNI	D.2 - 40	Messa a norma inerenti la sicurezza degli impianti fognatura/depurazione	3.303.524		300.000	51.911	-248.089	sospensione dell'investimento
92400093	PIU' COMUNI	E.2 - 03 F.2 - 02	Sistemi di telecontrollo su impianti acquedotto - fognatura - depurazione	1.131.695		100.000	27.602	- 72.398	sospensione dell'investimento
91400071	PIU' COMUNI	C.4 - 03	Attività Monitoraggio, controllo, ricerca perdite reti ed impianti acquedotto	260.170		25.000	16.441	- 8.559	sospensione dell'investimento
91400071	PIU' COMUNI	F.4 - 02	Attività Monitoraggio, controllo, ricerca infiltrazioni reti ed impianti fognatura/depurazione	302.289		25.000	-	-25.000	sospensione dell'investimento
91500080	PIU' COMUNI	E.2 - 03 F.2 - 02	Sistemi di automazione e telecontrollo - nucleo operativo di controllo	1.324.928		100.000	-	-100.000	sospensione dell'investimento
91400070	PIU' COMUNI	F.1 - 02	Rilevamento in campo e costruzione SIT infrastrutture fognarie	1.535.721		25.000	-	- 25.000	sospensione dell'investimento
91400092	PIU' COMUNI	S.1	Studi dei sistemi acquedottistici e fognari connessi all'ottimizzazione degli investimenti, all'ottimizzazione della gestione del servizio, ed ai rischi igienico-sanitari e ambientali	240.465		10.000	-	-10.000	sospensione dell'investimento
91500081	PIU' COMUNI	S.1	Implementazione e sostituzione strumentazione laboratorio analisi per controllo qualità del prodotto	569.288		60.000	5.697	-54.303	sospensione dell'investimento



CODICE ACVR	COMUNE	CODICE PdA 2011	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO	IMPORTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO	ANNO 2013 APP. 8/2012	INVESTIMENTI REALIZZATI AL 31.12.2013	SCOSTAMENTO	CAUSE SCOSTAMENTO
91500073	PIU' COMUNI	S.1	Sistemi informativi e gestionali sede centrale e sedi periferiche	1.794.932		200.000	97.595	- 102.405	sospensione dell'investimento
91400090	PIU' COMUNI	S.1	Qualità Ambiente e Sicurezza	415.517		150.000	21.362	- 128.638	sospensione dell'investimento
91500070	PIU' COMUNI	S.1	Investimenti immateriali	1.750.301		200.000	81.400	- 118.600	sospensione dell'investimento
91500090	PIU' COMUNI	S.1	Adeguamento strutture, arredi e strumentazioni sede centrale e periferiche	921.965		10.000	15.989	5.989	adeguamento post consuntivo 2012
92400092	PIU' COMUNI	S.1	Apparecchiature e strumentazione per sedi periferiche	154.173		-	-	-	
SOMMANO				241.678.309	25.814.281	12.252.303	6.429.053	- 5.823.250	

**ALLEGATO 2: SINTESI DEGLI INTERVENTI CONCLUSI NELL'ANNO 2013**

CODICE POT	COMUNE	CODICE PDA	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO PROGETTO [€]	IMPORTO CHIUSURA [€]
93303100	ANGIARI	B.1 - 142	Realizzazione tratti fognatura in Via Santa Croce, Via Possessione, Via Cason: stralcio funzionale via Possessione	37.000,00	26.726,93
93207110	BELFIORE	B.1 - 161	Estensione rete fognaria a zone non servite e collettamento al depuratore di Belfiore - 2° stralcio Via Casoni	85.000,00	72.151,86
93111100	BOSCO CHIESANUOVA	D.1 - 10	Allacciamento al collettore di fondovalle dalle frazioni "Arzarè-Regno" Corbiolo (stralcio)	250.000,00	249.456,02
93325081	CEREA	A.1 - 70	Estensione rete idrica e fognaria in zone attualmente prive della rete di distribuzione e per risolvere il problema dell'arsenico nell'acqua: 1° stralcio funzionale	100.000,00	97.031,27
93126100	CERRO VERONESE	B.1 - 155	Estensione rete fognaria del capoluogo (stralcio)	100.000,00	99.987,22
93133100	ERBEZZO	B.3 - 05	Impianti di depurazione e reti di raccolta ad Erbezzo	200.000,00	216.764,54
93138072	GREZZANA	B.1 - 39	* Fognatura Frazione di Orsara	200.000,00	187.047,47
93242101	LAVAGNO	B.1 - 202	Estensione rete fognaria alla località San Giacomo e adeguamento rete di collettamento a San Martino Buon Albergo: stralcio funzionale fognatura Via Monticelli	122.000,00	119.740,28
93250101	MONTEFORTE D'ALPONE	B.1 - 207	Estensione rete fognaria in via Molinetto e via Dian: stralcio funzionale via Molinetto	53.000,00	41.893,23
93251100	MOZZECANE	B.1 - 208	Fognatura e acquedotto in Via Regina Margherita e acquedotto in altre vie del Comune	790.000,00	681.703,30
93152100	NEGRAR	B.1 - 210	Realizzazione rete fognatura di Via Quintarelli in località San Vito e rete idrica in Via Crosara	88.600,00	71.221,07
93364100	RONCO ALL'ADIGE	B.1 - 179	Estensione rete fognaria in Via della Pozza, Via Crosarana e Via Casetta nel capoluogo e in Via Cà del Sale in frazione Tombasozana: stralcio funzionale via Cà del Sale	199.000,00	175.721,38
93368100	SALIZZOLE	B.1 - 137	Fognature in alcune vie del territorio comunale (nelle Località Bionde, Engazzà, Salizzole, Valmorsel): stralcio funzionale via Mezzaville (Engazzà)	120.000,00	91.855,71
93269090	SAN BONIFACIO	B.2 - 45	* Opere di affinamento e disinfezione scarico al depuratore di S. Bonifacio: stralcio funzionale pretrattamenti + trattamenti terziari	450.450,00	450.219,02
93174100	SAN MAURO DI SALINE	B.1 - 40	Realizzazione collettore fognario a servizio di utenze non servite	100.000,00	99.590,55
93178101	SANT'ANNA D'ALFAEDO	B.1 - 65	1° stralcio - collegamento frazione Ronconi	150.000,00	142.612,45
93281080	SOAVE	B.1 - 73	Ristrutturazione urgente reti fognatura ed acquedotto di Borgo Covreggino e Borgo San Lorenzo	550.000,00	548.680,75
93281110	SOAVE	C.5 - 20	Rifacimento rete idrica nel quartiere "musicisti" del capoluogo	271.000,00	248.427,91
93291081	VERONA	B.2 - 08	Depuratore "Città di Verona": "copertura vasche ossidazione"	1.627.020,00	1.450.484,23

COMUNE DI ANGIARI

(interventi conclusi: 1)

REALIZZAZIONE TRATTI DFOGNATURA IN VIA SANTA CROCE, VIA POSSESSIONE, VIA CASON – 1° STRALCIO VIA POSSESSIONE

Descrizione intervento: realizzazione di una nuova rete fognaria a gravità in Via Possezione.

Direzione Lavori: geom. Pierangelo Menegazzi

Progetto: a firma dell'ing. Luca Comitti

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.).

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 42.726,93 (IVA esclusa) e precisamente di €26.726,93. per opere di fognatura a carico di Acque Veronesi e € 16.000,00 a carico del Comune di Angiari per il ripristino del piano viabile.

Contributi: non sono previsti contributi.

Approvazioni: con determinazione n. 435 del 13.06.2013 il Direttore Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e la relazione sul conto economico finale dei lavori in oggetto.

Tempistica: i lavori relativi sono iniziati il 27.09.2011 e sono stati ultimati il 02.10.2012.

Collaudo: Essendo l'intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal geom. Pierangelo Menegazzi in data 12.02.2013.

Codice POT: 93303100

Codice PdA 2011: B.1 - 142



COMUNE DI BELFIORE

(interventi conclusi: 1)

ESTENSIONE RETE FOGNARIA A ZONE NON SERVITE E COLLETTAMENTO AL DEPURATORE DI BELFIORE - 2° STRALCIO VIA CASONI

Descrizione intervento: Realizzazione di un tratto di rete di fognatura nera, lunghezza complessiva circa 800m lungo le vie Casoni, Buggia, Strà attualmente prive del servizio di pubblico collettamento. L'intervento consente l'allacciamento di circa 120 abitanti.

Direzione Lavori: ing. Roberto Penazzi

Progetto: ing. Roberto Penazzi

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.).

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 72.151,86(IVA esclusa) che risulta inferiore di € 12.848,14 (IVA esclusa) rispetto l'importo complessivo di €85.000,00 previsti nel Piano Operativo Triennale di Acque Veronesi.

Contributi: non sono previsti contributi.

Approvazioni: con determinazione n. 37 del 09.01.2013 il Direttore Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e la relazione del R.U.P. sul conto finale dei lavori.

Tempistica: i lavori sono iniziati il 20.03.2012 e sono stati ultimati il 01.08.2012.

Collaudo: Essendo l'intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dall'ing. Roberto Penazzi in data 27.12.2012.

Codice POT: 93207110

Codice PdA 2011: B.1 - 161

COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA

(interventi conclusi:1)

ALLACCIAMENTO AL COLLETTORE DI FONDOVALLE DELLE FRAZIONI "ARZARÈ-REGNO" CORBIOLO

Descrizione intervento: posa di un tratto di nuova fognatura nera al fine di rendere funzionale il trasferimento dei reflui provenienti dalle frazioni di Lughezzano e Arzarè al depuratore di Verona. E' stato inoltre esteso il servizio di pubblica fognatura a nuove utenze.

Direzione Lavori: ing. Paolo Marcon.

Progetto: a firma dell'ing. Paolo Marcon dello studio C.M.R. Consulting.

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.).

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 249.456,02 (IVA esclusa) che risulta inferiore di € 543,98 (IVA esclusa) rispetto l'importo complessivo di €250.000,00 previsti nel Piano Operativo Triennale di Acque Veronesi.

Contributi: l'intervento è stato finanziato interamente con i fondi 2008 di cui all'art.12 comma 2ter della L.R. 5/98 (Piano della Montagna).

Approvazioni: con determinazione n. 546 del 09.08.2013 il Direttore Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e la relazione del R.U.P. sul conto finale dei lavori in oggetto.

Tempistica: i lavori sono iniziati il 30.12.2011 e sono stati ultimati il 22.03.2013.

Collaudo: Essendo l'intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dall'ing. Paolo Marcon in data 08.07.2013.

Codice POT: 93111100

Codice PdA 2011: D.1 - 10



COMUNE DI CEREÀ

(interventi conclusi:1)

ESTENSIONE RETE IDRICA E FOGNARIA IN ZONE ATTUALMENTE PRIVE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE E PER RISOLVERE IL PROBLEMA DELL'ARSENICO NELL'ACQUA – 1° STRALCIO FUNZIONALE

Descrizione intervento: realizzazione di alcuni tratti di acquedotto lungo le vie Pozza, Santi Martiri e Dosso la cui esecuzione si è resa necessaria per garantire l'approvvigionamento idrico dalla rete pubblica scongiurando il problema rappresentato dalla presenza di arsenico nell'acqua prelevata direttamente dalla falda attraverso i pozzi limitrofi alle proprietà.

Direzione Lavori: ing. Francesco Leone.

Progetto: a firma dell'ing. Francesco Leone dello studio IA.ING Srl.

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.).

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 97.031,27 (IVA esclusa) che risulta inferiore di € 2.968,73 (IVA esclusa) rispetto l'importo complessivo di €100.000,00 previsti nel Progetto Esecutivo.

Contributi: non sono previsti contributi.

Approvazioni: con determinazione n. 823 del 04.12.2013 il Direttore Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e la relazione del R.U.P. sul conto finale dei lavori in oggetto.

Tempistica: i lavori sono iniziati il 24.11.2011 e sono stati ultimati il 28.06.2013.

Collaudo: Essendo l'intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dall'ing. Francesco Leone in data 19.09.2013.

Codice POT: 93325081

Codice PdA 2011: A.1 – 70



COMUNE DI CERRO VERONESE

(interventi conclusi: 1)

ESTENSIONE RETE FOGNARIA DEL CAPOLUOGO

Descrizione intervento: Realizzazione della rete di fognatura nera a gravità in alcune vie del comune attualmente sprovviste di servizio di fognatura, allo scopo di collettare complessivamente circa 72 abitanti equivalenti.

Direzione Lavori: ing. Massimo Merzari

Progetto: ing. Massimo Merzaridello studio INTECH – ingegneri associati.

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.).

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 99.987,22 (IVA esclusa) che risulta inferiore di € 12,78 (IVA esclusa) rispetto l'importo complessivo di €100.000,00 previsti nel Piano Operativo Triennale di Acque Veronesi.

Contributi: L'intervento è finanziato dal Consiglio di Bacino Veronese (Delib. 15/2009 c.d. "Piano della Montagna" vedi SEZIONE 2).

Approvazioni: con determinazione n. 89 del 25.01.2013 il Direttore Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e la relazione del R.U.P. sul conto economico finale dei lavori.

Tempistica: i lavori sono iniziati il 21.11.2011 e sono stati ultimati il 13.11.2012.

Collaudo: Essendo l'intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dall'ing. Massimo Merzari in data 07.01.2013.

Codice POT: 93126100

Codice PdA 2011: B.1 – 155



COMUNE DI ERBEZZO

(interventi conclusi: 1)

IMPIANTI DI DEPURAZIONE E RETI DI RACCOLTA

Descrizione intervento: Rifacimento di alcuni tratti di rete fognaria comunale esistente fortemente deteriorata e realizzazione di alcune tratte di rete di fognatura nera in alcune vie del capoluogo attualmente non servite. Le nuove condotte (in parte a gravità ed in parte a pressione) collegheranno i reflui di circa 300 abitanti equivalenti all'impianto di depurazione presente nel comune di Erbezzo.

Direzione Lavori: ing. Paolo Marcon

Progetto: ing. Paolo Marcon dello studio C.M.R. Consulting.

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.).

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 216.764,54 (IVA esclusa) che risulta superiore di € 16.764,54 (IVA esclusa) rispetto l'importo complessivo di €200.000,00 previsti nel Piano Operativo Triennale di Acque Veronesi.

Contributi: L'intervento è finanziato dal Consiglio di Bacino Veronese (Delib. 15/2009 c.d. "Piano della Montagna" vedi SEZIONE 2).

Approvazioni: con determinazione n. 106 del 04.02.2013 il Direttore Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e la relazione del R.U.P. sul conto economico finale dei lavori.

Tempistica: i lavori sono iniziati il 15.09.2011 e sono stati ultimati il 23.06.2012.

Collaudo: Essendo l'intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dall'ing. Paolo Marcon in data 06.11.2012.

Codice POT: 93133100

Codice PdA 2011: B.3 – 05



COMUNE DI GREZZANA

(interventi conclusi: 1)

FOGNATURA FRAZIONE DI ORSARA

Descrizione intervento: realizzazione della nuova rete fognaria nella frazione di Orsara e di una nuova vasca imhoff per il trattamento dei relativi reflui.

Direzione Lavori: ing. Antonio Tucci

Progetto: a firma dell'ing. Antonio Tucci del Centro Studi Progetti S.p.A.

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.).

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 187.047,47 (IVA esclusa) che risulta inferiore di € 12.952,53 (IVA esclusa) rispetto l'importo complessivo di € 200.000,00 previsti nel Piano Operativo Triennale di Acque Veronesi.

Contributi: non sono previsti contributi.


Approvazioni: con determinazione n. 267 del 08.04.2013 il Direttore Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e la relazione acclarante dei lavori in oggetto.

Tempistica: i lavori relativi sono iniziati il 10.05.2012 e sono stati ultimati il 21.09.2012.

Collaudo: Essendo l'intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dall'ing. Antonio Tucci in data 21.12.2012.

Codice POT: 93138072

Codice PdA 2011: B.1 - 39

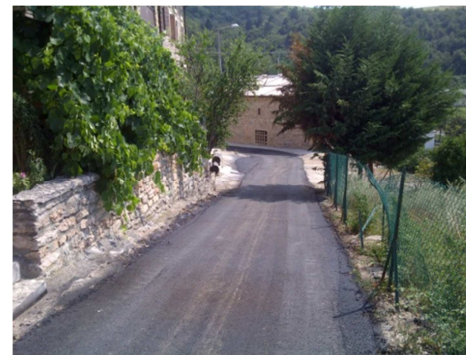

COMUNE DI LAVAGNO

(interventi conclusi:1)

ESTENSIONE RETE FOGNARIA A LOCALITÀ SAN GIACOMO E ADEGUAMENTO RETE DI COLLETTAMENTO A S. MARTINO BUON ALBERGO: 1° STRALCIO - FOGNATURA VIA MONTICELLI

Descrizione intervento: Realizzazione della rete fognarie a gravità in via Monticelli priva del servizio, al fine di collettare i reflui di 15 utenze al depuratore di Caldiero.

Direzione Lavori: ing. Antonio Pivetta

Progetto: ing. Antonio Pivetta.

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.).

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 119.740,28 (IVA esclusa) che risulta inferiore di € 2.259,72 (IVA esclusa) rispetto l'importo complessivo di €122.000,00 previsti nel Piano Operativo Triennale di Acque Veronesi.

Contributi: non sono previsti contributi.

Approvazioni: con determinazione n. 128 del 13.02.2013 il Direttore Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e la relazione del R.U.P. sul conto economico finale dei lavori.

Tempistica: i lavori sono iniziati il 14.07.2011 e sono stati ultimati il 03.08.2012.

Collaudo: Essendo l'intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dall'ing. ing. Antonio Pivetta in data 10.01.2013.

Codice POT: 93242101

Codice PdA 2011: B.1 – 202



COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE

(interventi conclusi:1)

ESTENSIONE RETE FOGNARIA IN VIA MOLINETTO E VIA DIAN – 1°STRALCIO (VIA MOLINETTO)

Descrizione intervento: l'intervento complessivo prevede la realizzazione di nuove tratte di fognatura a servizio della frazione Costalunga; il primo stralcio consiste nella realizzazione di una nuova condotta in via Monticelli, al fine di collettare 60 nuovi Abitanti Equivalenti al depuratore di San Bonifacio.

Direzione Lavori: ing. Silvano Rossato (Studio PSV s.r.l.)

Progetto: a firma dell'ing. Silvano Rossato

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.).

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 41.893,23 (IVA esclusa) che risulta inferiore di € 11.106,77 (IVA esclusa) rispetto l'importo complessivo di € 53.000,00 previsti per questo stralcio nel Piano Operativo Triennale di Acque Veronesi.

Contributi: con DGR 3483 del 30.12.2010 la Regione Veneto ha stanziato un contributo pari a 123.600€, confermato dai successivi decreti n. 152/2012 (a parziale copertura dell'intervento complessivo da 247.200€).

Approvazioni: con determinazione n. 629 del 24.09.2013 il Direttore Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e la relazione del R.U.P. sul conto economico finale dei lavori.

Tempistica: i lavori sono iniziati il 10.12.2012 e sono stati ultimati il 24.04.2013.

Collaudo: Essendo l'intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dall'ing. Silvano Rossato in data 19.06.2013.

Codice POT: 93250101

Codice PdA 2011: B.1 - 207



COMUNE DI MOZZECANE

(interventi conclusi: 1)

RIFACIMENTO FOGNATURA E SOSTITUZIONE RETE IDRICA IN VIA REGINA MARGHERITA

Descrizione intervento: realizzazione di una nuova condotta di fognatura nera in via Regina Margherita, in concomitanza alla sostituzione della rete idrica di adduzione e distribuzione.

Direzione Lavori: ing. Roberto Penazzi

Progetto: a firma dell'ing. Roberto Andriolo Stagno

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.)

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 681.703,30 (IVA esclusa) che risulta inferiore di € 108.296,70 rispetto l'importo complessivo di €790.000,00 (IVA esclusa) previsti nel Piano Operativo Triennale di Acque Veronesi.

Contributi: non sono previsti contributi.

Approvazioni: con determinazione n. 873 del 23.12.2013 il Direttore Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di collaudo e la relazione del R.U.P. sul conto economico finale dei lavori.

Tempistica: i lavori sono iniziati il 15.09.2011 e sono stati ultimati il 04.09.2012.

Collaudo: Il certificato di collaudo è stato rilasciato dall'ing. Giorgio Marchi in data 29.11.2013.

Codice POT: 93251100

Codice PdA 2011: B.1 - 208



COMUNE DI NEGRAR

(interventi conclusi: 1)

REALIZZAZIONE RETE FOGNATURA DI VIA QUINTARELLI IN LOCALITÀ SAN VITO E RETE IDRICA IN VIA CROSARA

Descrizione intervento: realizzazione di 160m di nuova rete di fognatura nera a gravità in via Quintarelli, a servizio di circa 40 abitanti equivalenti.

Direzione Lavori: geom. Giuseppe Sambugaro (Acque Veronesi s.c. a r.l.)

Progetto: ing. Davide Donatoni

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.).

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 71.221,07 (IVA esclusa) che risulta inferiore di € 17.378,93 (IVA esclusa) rispetto l'importo complessivo di €88.600,00 previsti nel Piano Operativo Triennale di Acque Veronesi.

Contributi: non sono previsti contributi.

Approvazioni: con determinazione n. 317 del 06.05.2013 il Direttore Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e la relazione del R.U.P. sul conto finale dei lavori.

Tempistica: i lavori sono iniziati il 24.10.2011 e sono stati ultimati il 30.05.2012.

Collaudo: Essendo l'intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal geom. Giuseppe Sambugaro in data 05.11.2012.

Codice POT: 93152100

Codice PdA 2011: B.1 - 210



COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE

(interventi conclusi: 1)

ESTENSIONE RETE FOGNARIA IN VIA DELLA POZZA, VIA CROSARONA E VIA CASETTA NEL CAPOLUOGO E IN VIA CÀ DEL SALE IN FRAZIONE TOMBASOZANA: STRALCIO FUNZIONALE VIA CÀ DEL SALE

Descrizione intervento: realizzazione di tratti di rete di fognatura nera in via Cà del Sale, attualmente sprovvista del servizio, e concomitante posa di un breve tratto di condotta acquedottistica.

Direzione Lavori: ing. Paolo Muzzolon

Progetto: ing. Paolo Muzzolon

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.).

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 175.721,38 (IVA esclusa) che risulta inferiore di € 23.278,62 (IVA esclusa) rispetto l'importo complessivo di €199.000,00 previsti nel Piano Operativo Triennale di Acque Veronesi.

Contributi: non sono previsti contributi.

Approvazioni: con determinazione n. 134 del 14.02.2013 il Direttore Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e la relazione del R.U.P. sul conto economico finale dei lavori.

Tempistica: i lavori sono iniziati il 14.05.2012 e sono stati ultimati il 11.09.2012.

Collaudo: Essendo l'intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dall'ing. Paolo Muzzolon in data 25.01.2013

Codice POT: 93364100

Codice PdA 2011: B.1 – 137



COMUNE DI SALIZZOLE

(interventi conclusi:1)

ESTENSIONE RETE FOGNARIA IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE (NELLE LOCALITA' BIONDE E ENGAZZA') NEL COMUNE DI SALIZZOLE – 1° STRALCIO

Descrizione intervento: realizzazione di una nuova rete fognaria a depressione nella località di Engazzà in Via Mezzavilla.

Direzione Lavori: geom. Pierangelo Menegazzi

Progetto: a firma dell'ing. Riccardo Sinicato

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.).

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 91.855,71 (IVA esclusa) che risulta inferiore di € 28.144,29 (IVA esclusa) rispetto l'importo complessivo di €120.000,00 previsti nel Piano Operativo Triennale di Acque Veronesi.

Contributi: non sono previsti contributi.

Approvazioni: con determinazione n. 449 del 20.06.2013 il Direttore Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e la relazione sul conto economico finale dei lavori in oggetto.

Tempistica: i lavori relativi sono iniziati il 17.09.2012 e sono stati ultimati il 04.03.2013.

Collaudo: Essendo l'intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal geom. Pierangelo Menegazzi in data 04.05.2013.

Codice POT: 93368100

Codice PdA 2011: B.1 - 137



COMUNE DI SAN BONIFACIO

(interventi conclusi:1)

OPERE DI AFFINAMENTO E DISINFEZIONE SCARICO AL DEPURATORE DI S. BONIFACIO - 1° STRALCIO: PRETRATTAMENTI + TRATTAMENTI TERZIARI

Descrizione intervento: Interventi di potenziamento dell'impianto di depurazione di S.Bonifacio atti a migliorare la qualità del refluo scaricato; in particolare, le opere di primo stralcio hanno riguardato la realizzazione di:

- nuova sezione di grigliatura grossolana a cavallo del collettore fognario in ingresso all'impianto;
- nuova grigliatura fine sul manufatto di sfioro esistente;
- copertura con grigliato chiuso dell'ex manufatto di grigliatura;
- realizzazione delle sole opere civili dei comparti di filtrazione e disinfezione;
- demolizione dell'ex comparto di clorazione;
- spostamento del misuratore di portata e campionatore.

Direzione Lavori: geom. Carla Corradini (Consorzio Le Valli)

Progetto: Studio AltirtiSpA.

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.).

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 450.219,02 (IVA esclusa) che risulta inferiore di € 230,98 (IVA esclusa) rispetto l'importo complessivo di €450.450,00 previsti nel Piano Operativo Triennale di Acque Veronesi.

Contributi: le opere sono comprese nell'allegato B (ex allegato B, ID14) alla deliberazione dell'AATO Veronese n. 7 del 17 febbraio 2011 (rideterminazione dei sostegni economici alla realizzazione degli interventi urgenti di fognatura e depurazione).

Approvazioni: con determinazione n. 572 del 23.08.2013 il Direttore Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e la relazione del R.U.P. sul conto economico finale dei lavori.

Tempistica: i lavori sono iniziati il 16.06.2011 e sono stati ultimati il 15.11.2012.

Collaudo: Essendo l'intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal geom. Carla Corradini(Consorzio Le Valli) in data 06.06.2013.

Codice POT: 93269090

Codice PdA 2011: B.2 - 45



COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE

(interventi conclusi: 1)

REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO A SERVIZIO DI UTENZE NON SERVITE

Descrizione intervento: realizzazione di 350m di rete di fognatura nera in località Corte, parte a gravità e parte in pressione, allo scopo di collettare circa 85 abitanti equivalenti all'esistente fossa imhoff.

Direzione Lavori: ing. Alessandro Ferrara

Progetto: ing. Alessandro Ferrara (Studio Pragma Engineering srl).

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.).

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 99.590,55 (IVA esclusa) che risulta inferiore di € 409,45 (IVA esclusa) rispetto l'importo complessivo di €100.000,00 previsti nel Piano Operativo Triennale di Acque Veronesi.

Contributi: non sono previsti contributi.

Approvazioni: con determinazione n. 38 del 09.01.2013 il Direttore Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e la relazione del R.U.P. sul conto economico finale dei lavori.

Tempistica: i lavori sono iniziati il 27.02.2012 e sono stati ultimati il 03.09.2012.

Collaudo: Essendo l'intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dall'ing. Alessandro Ferrara in data 19.11.2012.

Codice POT: 93174100

Codice PdA 2011: B.1 - 40



COMUNE DI SANT'ANNA D'ALFAEDO

(interventi conclusi: 1)

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA FOGNATURA NERA – 1°STRALCIO: COLLEGAMENTO FRAZIONE RONCONI

Descrizione intervento: realizzazione di tre tratte di rete di fognatura a gravità per complessivi 460m a servizio di circa 7 abitazioni ed un futuro centro sportivo polivalente per complessivi 35 abitanti equivalenti.

Direzione Lavori: ing. Antonio Tucci

Progetto: ing. Antonio Tucci (studio CSP Engineering).

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.).

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 142.612,45 (IVA esclusa) che risulta inferiore di € 7.387,55 (IVA esclusa) rispetto l'importo complessivo di €150.000,00 previsti nel Piano Operativo Triennale di Acque Veronesi.

Contributi: L'intervento è finanziato dal Consiglio di Bacino Veronese (Delib. 15/2009 c.d. "Piano della Montagna" vedi SEZIONE 2).


Approvazioni: con determinazione n. 190 del 06.03.2013 il Direttore Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e la relazione del R.U.P. sul conto finale dei lavori.

Tempistica: i lavori sono iniziati il 20.10.2011 e sono stati ultimati il 11.06.2012.

Collaudo: Essendo l'intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dall'ing. Antonio Tucci in data 21.09.2012.

Codice POT: 93178101

Codice PdA 2011: B.1 - 65

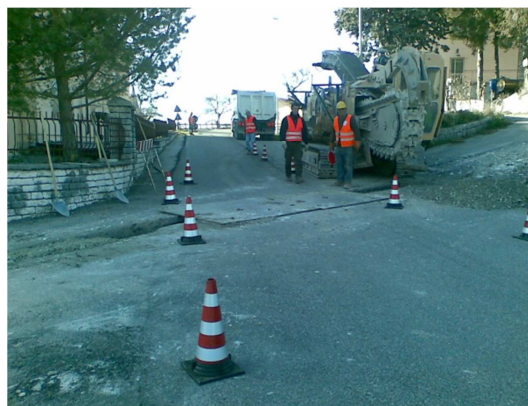

COMUNE DI SOAVE

(interventi conclusi: 2)

RIFACIMENTO RETE IDRICA NEL QUARTIERE "MUSICISTI" DEL CAPOLUOGO

Descrizione intervento: rifacimento di alcune tratte obsolete di rete di adduzione dell'acquedotto nel quartiere "Musicisti" per complessivi 1.275m.

Direzione Lavori: ing. Mario Medici

Progetto: ing. Filippo Toso (studio INVER srl).

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.).

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 348.427,91 (IVA esclusa) che risulta inferiore di € 22.572,09 (IVA esclusa) rispetto l'importo complessivo di € 271.000,00 previsti nel Piano Operativo Triennale di Acque Veronesi.

Contributi: non sono previsti contributi.


Approvazioni: con determinazione n. 90 del 25.01.2013 il Direttore Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e la relazione del R.U.P. sul conto finale dei lavori.

Tempistica: i lavori sono iniziati il 30.03.2012 e sono stati ultimati il 26.09.2012.

Collaudo: Essendo l'intervento inferiore a € 500.000,00, il certificato di collaudo è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dall'ing. Mario Medici in data 14.12.2012.

Codice POT: 93281110

Codice PdA 2011: C.2 – 20

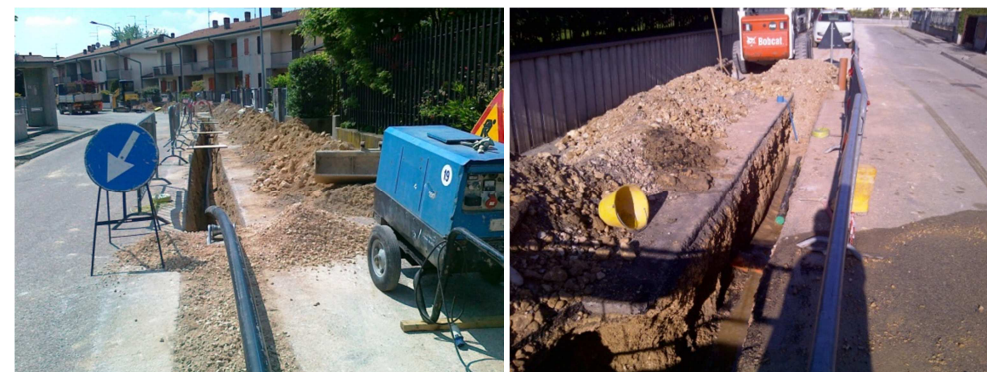

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE URGENTE RETI DI FOGNATURA ED ACQUEDOTTO DI BORGO COVERGNINO E BORGO S. LORENZO E OPERE DI COMPLETAMENTO

Descrizione intervento: Realizzazione di nuove tratte di fognatura nera in alcune vie della zona orientale del capoluogo di Soave, in sostituzione del collettore misto in stato deteriorato. L'intervento prevede la sostituzione concomitante delle condotte idriche vetuste. A seguito delle economie riscontrate, si è reso opportuno e conveniente impiegare tali somme per completare l'estensione della rete acquedottistica ad ulteriori nuove utenze prive del servizio (via Spinarella).

Direzione Lavori: ing. Paolo Marcon

Progetto: a firma dell'ing. Paolo Marcon dello studio C.M.R. Consulting.

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.).

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 548.680,75 (IVA esclusa) che risulta inferiore di € 1.319,25 (IVA esclusa) rispetto l'importo complessivo di €550.000,00€ previsti nel Piano Operativo Triennale di Acque Veronesi.

Contributi: non sono previsti contributi.

Approvazioni: con determinazione n. 627 del 23.09.2013 il Direttore Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di collaudo e la relazione del R.U.P. sul conto finale dei lavori.

Tempistica: i lavori sono iniziati il 14.09.2009 e sono stati ultimati il 20.10.2010; in data 01.09.2011 è avvenuta la consegna dei lavori di completamento, conclusi in data 26.10.2012.

Collaudo: I certificati di collaudo sono stati rilasciati:

- per le opere principali, dall'ing. Giancarlo Padovani in data 06.09.2011
- per le opere di completamento, dall'ing. Paolo Marcon in data 07.03.2013.

Codice POT: 93281080

Codice PdA 2011: B.1 – 73



COMUNE DI VERONA

(interventi conclusi: 1)

REALIZZAZIONE COPERTURA VASCHE DI OSSIDAZIONE DEL DEPURATORE DI VERONA

Descrizione intervento: realizzazione di un sistema di coperture a raso delle vasche di ossidazione dell'impianto di depurazione di Verona e di un sistema di trattamento dell'aria.

Direzione Lavori: geom. Pierangelo Menegazzi (Acque Veronesi s.c. a r.l.)

Progetto: ing. Emanuele Albrigi e arch. Cinzia Frapporti (studio dell'Acqua&associati).

RUP: ing. Giovanni Sala (Acque Veronesi s.c. a r.l.).

Aspetti economici: La spesa complessivamente sostenuta è pari a € 1.450.484,23 (IVA esclusa) che risulta inferiore di € 176.535,77 (IVA esclusa) rispetto l'importo complessivo di € 1.627.020,00 previsti nel Piano Operativo Triennale di Acque Veronesi.

Contributi: non sono previsti contributi.

Approvazioni: con determinazione n. 457 del 25.06.2013 il Direttore Generale di Acque Veronesi ha approvato lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione e la relazione del R.U.P. sul conto finale dei lavori.

Tempistica: i lavori sono iniziati il 16.11.2011 e sono stati ultimati il 05.07.2012.

Collaudo: Il certificato di collaudo è stato rilasciato dall'arch. Luciano Marchesini in data 07.01.2013

Codice POT: 93291081

Codice PdA 2011: B.2 - 08





SEDE: LUNGADIGE GALTAROSSA, 8 - 37137 VERONA
