

An
Muhri Heimo
Gewerbestraße 1
A-8572 Bärnbach

Krottendorf, 11.04.2022

ATTEST

Betr.: **Nachtclub**
Dr.Niederdorferstraße 26
8572 Bärnbach
Elektroinstallation Nachtclub Erdgeschoss

Wir bestätigen, dass **die überprüfte Elektroinstallation** für den heute gültigen Vorschriften nach ÖVE E- 8101 und TAEV entspricht.

Als Schutzmaßnahme gegen indirektem Berühren dient die Nullung und als Zusatzschutz die Fehlerstromschutzschaltung.

Der gemessene Erdübergangswiderstand beträgt 1,6 Ohm.

Mit freundlichen Grüßen

Meisterbetrieb
EH-Tech
Elektro-Gas-Wasser-Heizung
Installations GmbH • A-8564 Krottendorf • Krottendorf 14b
Tel. +43 (0)3143 20 617, Fax: DW-7



Prüfprotokoll Blitzschutzanlage nach ÖVE/ÖNORM:

E 49/1988 E 8049-1 EN 62305-3

Adresse: 8572 Bärnbach Dr. Niederdorferstraße 26 - Lora Dora Bar

Bauteil: laut Plan

Prüfer: PG

Prüfdatum: 27.04.2022

Baujahr: 22

Art der Nutzung: gewerblich

Prüfintervall: 3 Jahre

Nächste Prüfung: 2025

Bauart: Holz Mauerwerk Ortbeton Betonfertigteile Metallskelett

Dachdeckung: Blech/ Metall (Attika) Folie / Pappe Schiefer / Ziegel / Glas / Faserzement
 Holz / Schilf bewehrter Beton Sonstiges:

Dachform: Flachdach Giebeldach Spitzdach (Turm)

Angaben bei ÖVE 8049-1 & EN62305-3:

Schutzklasse: 1 2 3

Blitzkugelverfahren Maschenverfahren Schutzwinkelverfahren

Fangleitungen Material: Alu Stahl Kupfer Blechdach (Attika)

Ableitungen Material: Alu Stahl Kupfer Metallfassade Regenrohre (vernietet, verlötet)
 Stahlkonstruktion Verlegung: Unterputz Aufputz

Messergebnis Erdungswerte: spez. Bodenwiderstand : 187 Ω m Gesamtausbreitungswiderstand: 5,6 Ω

Trennstelle	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RA (Ohm)	18,5	25,5	39,8	31,3	25	33,4	22,7	18,8						
Erderart	A	A	A	A	A	A	A	A						
Trennstelle	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
RA (Ohm)														
Erderart														
Trennstelle	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
RA (Ohm)														
Erderart														

Erderbezeichnungen: A = Einzelerder / Tiefenerder

B = Fundamenterdung / Ringerdung

Plan beiliegend vorhanden

Prüfergebnis:

Fangleitungen:

in Ordnung nicht in Ordnung

Ableitungen:

in Ordnung nicht in Ordnung

Erdung:

in Ordnung nicht in Ordnung

Meisterbetrieb
EH-Tech

Elektro-Gas-Wasser-Heizung

Installations GmbH • A-8564 Krotendorf • Krotendorf 14b
 Tel. +43 (0)3143 20 617, Fax: DW-7

28.04.22


Errichtungsprotokoll Prüfung einer bestehenden Anlage Erdung bauseits errichtet Ableiter bauseits errichtet

Bei bauseits errichteter Erdungsanlage bzw. Ableitern kann die ordnungsgemäße Errichtung bzw. Verlegung nicht beurteilt werden
 Dieses Protokoll bezieht sich auf die Prüfung der äußeren Blitzschutzanlage, innere Blitzschutzmaßnahmen sind nicht Gegenstand
 dieser Prüfung. (Potentialausgleich, Überspannungsmaßnahmen etc.)



Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.

-  Fangleitung
-  Regenfallrohr
-  Fangstange an Kamin und Röhren (bei Nichtmetallen)
-  Tiefenerder
-  Trennstelle
-  Trennstellenbezeichnung

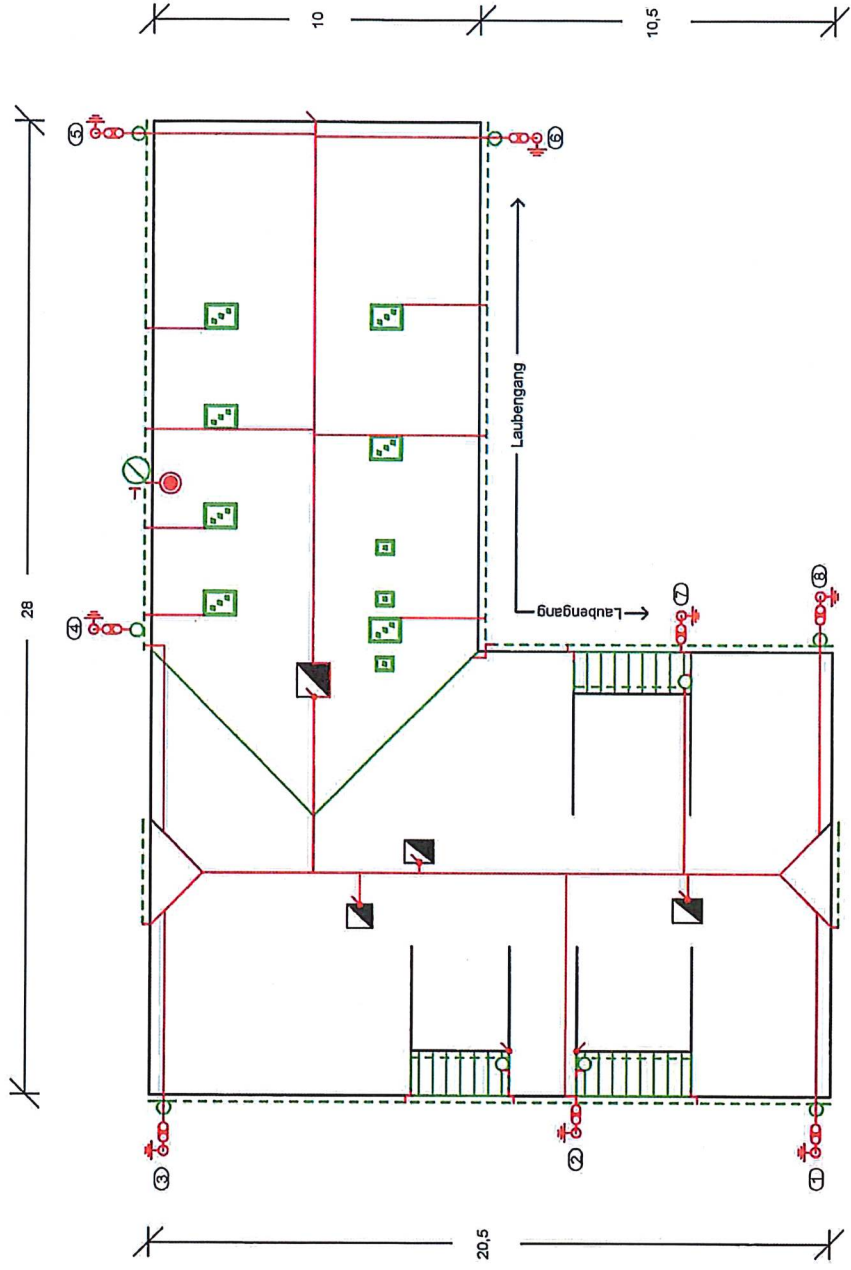

Datum	2022	Blitzschutz Dr. Niederdorferstraße 26 8572 Bärnbach	Projekt: Dr. Niederdorferstr. 26 Zeichn.Nr.: 1 Maßstab 1:200
Bearb.	—		
Gepr.	—		
Norm	ÖVE EN62305 SK3	Urspr.: —	Ers. durch: —

28.04.22

Blatt: 1
1 Blätter







Von meinem iPhone gesendet

